

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2561		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617
- รายปี	17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.3	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)
- ระยะยาว	37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067
รวมทั้งสิ้น	★107,775.563	★ 32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684

★ หมายเหตุ


- มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,324.936 ล้านบาท
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2561 ทำให้มีวงเงินงบประมาณ 106,197.563 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่าย 32,445.565 ล้านบาท (สศช. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- มติ ครม. วันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 107,775.563 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2
		วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	3,650.679	3,119.567	85.5	(531.112)
- รายปี	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	1,785.272	1,637.551	91.7	(147.721)
- ระยะยาว	993.057	895.536	90.2	(97.521)	1,865.407	1,482.016	79.4	(383.391)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	3,275.670	3,806.782	116.2	531.112
รวมทั้งสิ้น	4,947.712	4,947.712	100.0	-	6,926.349	6,926.349	100.0	-

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2560-2561

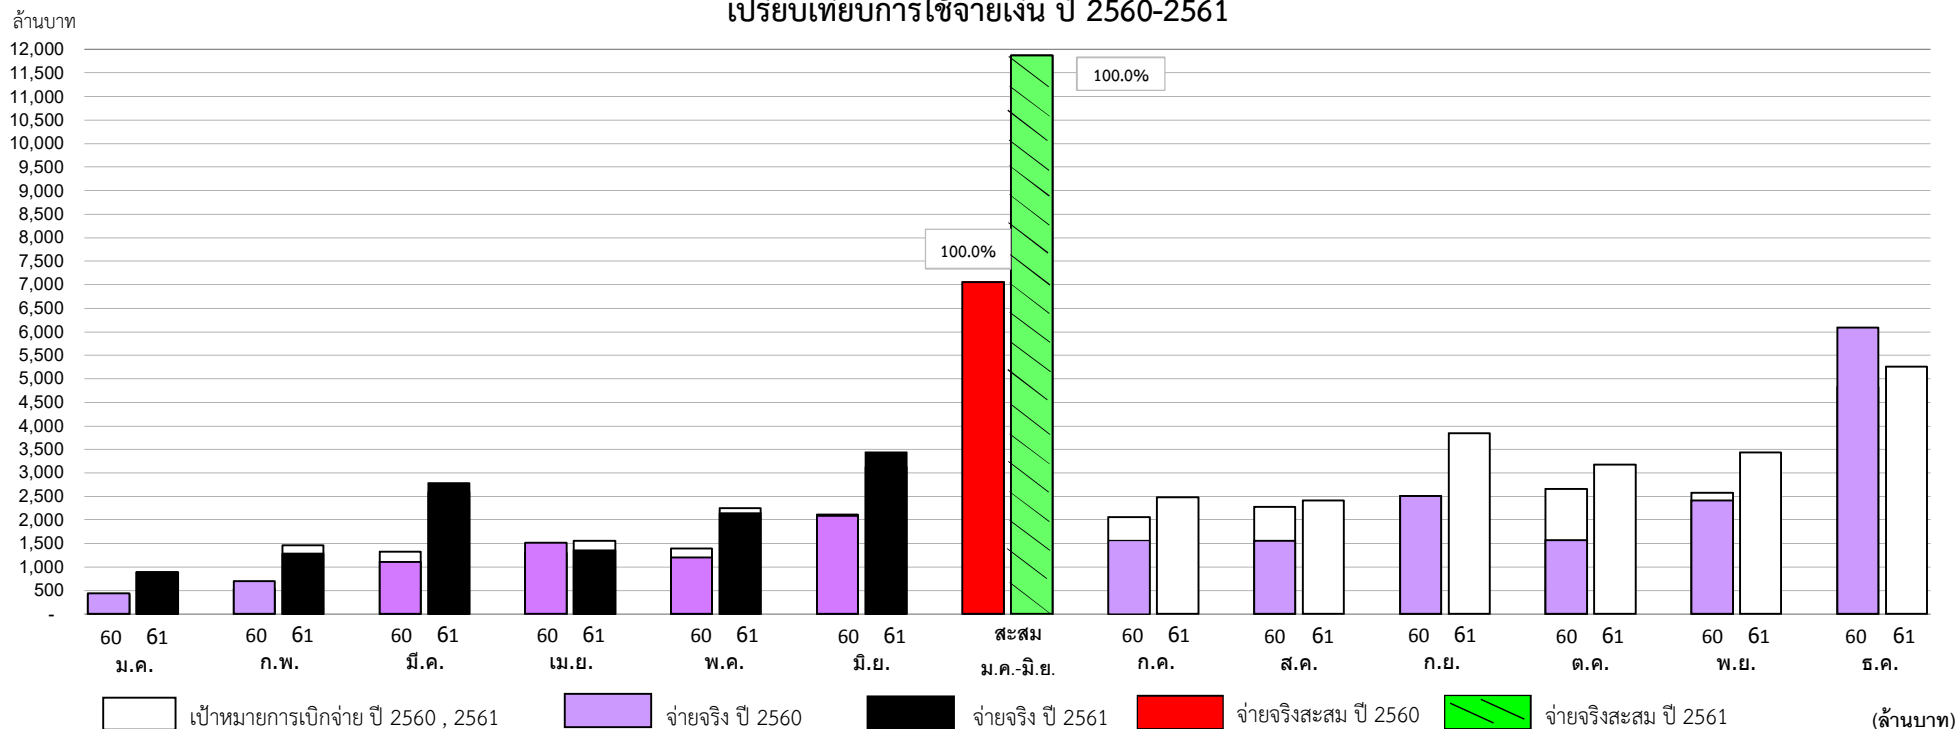

ปี	รายการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
		ปี 2560	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	404	534	1,321	1,298	1,389	2,115	7,061	2,054	2,279	2,512	2,653	2,573
	- จ่ายจริง	446	703	1,110	1,513	1,200	2,088	7,060	1,563	1,553	2,506	1,569	2,413	6,084	22,748
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	101.0	99.4	84.0	116.6	86.4	98.7	100.0	76.1	68.1	99.8	59.1	93.8	126.2	95.0
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	11,874	2,480	2,420	3,839	3,177	3,432	5,224	32,446
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	11,874							11,874
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	2	(187)	185	(204)	(108)	312	-	(2,480)	(2,420)	(3,839)	(3,177)	(3,432)	(5,224)	(20,572)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	100.0	-	-	-	-	-	-	36.6
	- เป้าหมายสะสม	887	2,351	4,948	6,504	8,749	11,874								
	- จ่ายจริงสะสม	889	2,166	4,948	6,300	8,437	11,874								
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	100.2	92.1	100.0	96.9	96.4	100.0								
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	2.7	6.7	15.2	19.4	26.0	36.6								

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561				
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				วงเงิน	%				วงเงิน	%		
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ												
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.3	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)	
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358	
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	98.179	16.986	7.620	6.812	89.4	(0.808)	40.1	4.020	4.461	111.0	0.441	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	44.122	9.597	9.597	5.738	59.8	(3.859)	59.8	-	0.832	-	0.832	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	1.392	-	1.392	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	407.374	155.000	148.340	224.716	151.5	76.376	145.0	13.340	15.170	113.7	1.830	
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	918.164	360.000	209.413	205.246	98.0	(4.167)	57.0	61.500	44.566	72.5	(16.934)	
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	284.511	155.000	8.650	54.201	626.6	45.551	35.0	1.220	1.399	114.7	0.179	
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	287.270	39.664	25.727	20.885	81.2	(4.842)	52.7	0.035	0.420	1,200.0	0.385	
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	32.377	8.000	1.000	1.865	186.5	0.865	23.3	1.000	1.865	186.5	0.865	
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	221.291	15.200	0.050	-	-	(0.050)	-	0.025	-	-	(0.025)	
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	142.046	60.000	20.187	26.505	131.3	6.318	44.2	6.250	14.557	232.9	8.307	
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	116.012	79.757	43.372	43.403	100.1	0.031	54.4	38.659	2.153	5.6	(36.506)	
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	2,079.897	885.000	365.201	786.991	215.5	421.790	88.9	79.002	84.602	107.1	5.600	
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1,661.498	230.000	77.000	123.823	160.8	46.823	53.8	1.000	11.123	1,112.3	10.123	
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	4,028.665	1,600.000	461.090	999.150	216.7	538.060	62.4	106.979	147.368	137.8	40.389	
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	960.164	340.000	170.913	209.182	122.4	38.269	61.5	28.940	60.601	209.4	31.661	
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	5,335.088	1,150.000	430.000	513.393	119.4	83.393	44.6	76.723	85.241	111.1	8.518	
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	30.121	0.900	0.050	1.765	3,530.0	1.715	196.1	0.050	1.765	3,530.0	1.715	
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	0.460	0.427	92.8	(0.033)	
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	357.460	102.000	55.944	64.292	114.9	8.348	63.0	24.410	17.635	72.2	(6.775)	
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	3,716.861	792.787	373.022	165.111	44.3	(207.911)	20.8	10.409	73.985	710.8	63.576	
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	1,058.109	265.949	134.826	17.952	13.3	(116.874)	6.8	116.565	1.971	1.7	(114.594)	
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	276.923	117.738	60.053	53.436	89.0	(6.617)	45.4	21.639	13.147	60.8	(8.492)	
23. พัฒนาระบบจำหน่ายขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประจวบฯ และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	807.895	6.411	5.495	0.026	0.5	(5.469)	0.4	5.495	-	-	(5.495)	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	739.700	452.000	212.221	176.836	83.3	(35.385)	39.1	32.549	42.030	129.1	9.481	
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,628.834	250.000	47.614	131.742	276.7	84.128	52.7	0.750	10.531	1,404.1	9.781	
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	19,181.874	8,000.000	2,900.000	2,821.475	97.3	(78.525)	35.3	600.000	909.151	151.5	309.151	
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	259.530	98.681	4.455	0.056	1.3	(4.399)	0.1	-	-	-	-	
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	5,005.741	728.000	277.927	94.727	34.1	(183.200)	13.0	88.427	56.255	63.6	(32.172)	
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	954.858	180.000	2.500	2.810	112.4	0.310	1.6	1.050	0.917	87.3	(0.133)	
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,578.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067	
รวมทั้งสิ้น	107,775.563	32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684	

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ												
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี												
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง												
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ผรฟ. กรฟ. , ผจท.	1,400.970	616.759	125.109	253.589	202.7	128.480	41.1	97.253	113.138	116.3	15.885
1.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่าย ได้แนวสายส่ง เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าลานโก ลำลูกกา 2	ผบ.ก.2 กจค.1(บ.ก.2)	13.631	6.251	4.000	3.490	87.3	(0.510)	55.8	2.000	0.551	27.6	(1.449)
1.3 งานเสริมประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ผบ.ป. กบป. /ผจท.	37.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบ จำหน่ายแรงต่ำ	ผบ.ก.1 กจค.1(บ.ก.1)	538.592	190.000	90.600	203.786	224.9	113.186	107.3	20.200	26.095	129.2	5.895
1.5 งานก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการตรวจซ่อม จำนวน 11 แห่ง	ผคฟ. กอค.	2.019	2.019	2.019	2.019	100.0	-	100.0	-	2.019	-	2.019
1.6 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจฟ.2	ผคฟ. ศสฟ.	10.680	10.680	10.680	10.680	100.0	-	100.0	-	10.680	-	10.680
1.7 งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการและกระแสไฟฟ้าตัดข้อ 24 แห่ง	รผ.ก(บ) ศสฟ. (รท.สฟ.) 12 เขตดำเนินการ	82.256	74.877	28.660	8.945	31.2	(19.715)	11.9	13.680	2.372	17.3	(11.308)
1.8 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้ไลน์สายส่ง สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยทะเล จ. นครราชสีมา	ผวบ.(ธ3)	120.869	27.621	5.186	33.504	646.0	28.318	121.3	2.000	7.974	398.7	5.974
1.9 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ไปงิ้วร้อน 2, สถานีไฟฟ้าชั่วคราว คอนเจดีย์ 2 และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวอะฮ่า 3	ผวบ.(ก.2), ผวบ.(ก.3) , ผวบ.(ค.1) กจฟ.	24.081	20.509	20.509	2.685	13.1	(17.824)	13.1	19.382	0.004	0.0	(19.378)
1.10 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย แบบ Knockdown	ผวธ.(ก3) ดำเนินการที่ กฟข. (กฟน.1-3, กฟฉ.1-2, กฟก.2, กฟค.1,3)	12.185	12.185	12.185	10.628	87.2	(1.557)	87.2	-	10.628	-	10.628
1.11 งานจัดหาวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้งานในสภาวะวิกฤต	ผสค. กอบ.	31.031	8.502	4.251	4.251	100.0	-	50.0	-	3.401	-	3.401
1.12 งานก่อสร้าง Loop Line สายส่ง 115 เควี และเพิ่มเบย์ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าอลง 2 เพื่อรองรับการจ่ายไฟของสนามบินนานาชาติภูเก็ต	ผคฟ. กจค.2(คฟ.)	111.914	106.583	44.640	42.849	96.0	(1.791)	40.2	-	13.258	-	13.258
1.13 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	กคก.	281.595	194.375	100.890	120.473	119.4	19.583	62.0	23.104	22.064	95.5	(1.040)
1.14 งานก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟน.1	ผบ.บ. กรส.น.1)	93.700	9.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา2	ผบ.บ.(ก.1), ผวบ.(ก.3)	145.217	106.747	31.891	19.096	59.9	(12.795)	17.9	7.683	19.096	248.5	11.413
1.16 งานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เกาะฮัง จ.กระบี่	ผวบ.(ค.2)	25.540	14.566	5.633	0.734	13.0	(4.899)	5.0	2.209	0.734	33.2	(1.475)
1.17 งานก่อสร้างย้ายแนวสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจร ภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 (กฟผ.)	ผกร. กฟฟ.2	141.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขนอม (Switching 115 kV GIS) จ.นครศรีธรรมราช	ผคฟ. กจค.1 (คฟ.)	269.370	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ผบ.ก.2 ผจท. กวผ.	1,299.983	429.431	3.983	48.409	1,215.4	44.426	11.3	1.000	48.409	4,840.9	47.409
1.20 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประเภท Optical fiber Overhead Ground Wire (OPGW) สำหรับใช้งานตรวจซ่อม	ผสค. กบข.	8.534	0.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน กฟภ. (Solar PV Rooftop)	ผสอ. กสฟ.	18.100	18.100	14.480	-	-	(14.480)	-	-	-	-	-
1.22 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.	ผวบ.(ค.2)	62.010	24.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%		วงเงิน		%		
1.23 งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต กฟท.1	22.267	4.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพนแจ้, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7	ฝบป.(ถ.3), ฝวบ.(ก.3)	42.650	21.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25 งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1(กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห่างฉัตร)- สถานีไฟฟ้าลำปาง 3	ฝกร. กฟท.1	165.072	3.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ได้ไล่นสายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรีฯ - สฟ.ถกลาง2 จ.ภูเก็ต	ฝวบ.(ต.2)	61.774	40.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	ฝวบ.(น.1)	23.212	3.955	0.267	-	-	(0.267)	-	0.267	-	-	(0.267)
1.28 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยก เขื่อนแม่ปาย - สี่แยก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	ฝวบ.(น.1)	44.694	4.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29 งานเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ฝวบ.(น.1)	67.615	45.968	0.561	-	-	(0.561)	-	0.561	-	-	(0.561)
1.30 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าย่อย แบบ Knockdown (ระยะที่ 2)	ฝวธ.(ก3)	32.946	15.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31 งานจัดหารีโมเดลเซอร์เพื่อติดตั้งในไลน์แยกแทนฟิวส์พื้นที่ กฟท.2	ฝวธ.(ก4) กบว.(ก4)	57.451	49.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร สำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขต	ฝสอ. กสท.	143.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง		5,393.088	2,083.739	505.544	765.138	151.3	259.594	36.7	189.339	280.423	148.1	91.084
2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์												
2.1 งานจัดหามอเตอร์ วีที ซีที และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝจท.	2,662.540	1,487.732	394.452	325.121	82.4	(69.331)	21.9	224.224	76.028	33.9	(148.196)
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝจท. กมต.	229.903	212.699	117.206	67.437	57.5	(49.769)	31.7	-	36.658	-	36.658
2.3 งานจัดซื้อรถยนต์ให้ กฟท. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา	รผก.(วศ)	60.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้ งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป./ฝจท.	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งาน สูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป./ฝจท.	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 งานจัดหามอเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ	ฝบป. กพร. /ฝจท.	244.840	240.483	80.898	77.918	96.3	(2.980)	32.4	8.510	8.965	105.3	0.455
2.7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	กมต. / ฝจท.	238.316	99.020	49.539	33.289	67.2	(16.250)	33.6	14.354	11.274	78.5	(3.080)
2.8 งานจัดซื้อโมเด็มสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในโครงการ AMR ระยะที่ 1	ฝบป. กพร.	137.625	137.625	137.625	117.500	85.4	(20.125)	85.4	137.625	117.500	85.4	(20.125)
2.9 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง เสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป. / ฝจท.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์	ฝบผ. กคบ.	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ฝบป. กบป. /ฝจท.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 งานจัดหามอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน มอเตอร์แบบจานหมุน ในพื้นที่ กฟอ.สายบุรี, กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ฝบป. กมต.	65.522	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควีที่สถานีไฟฟ้า บ้านดุง2 จ.อุดรธานี	ฝกส. กกส.	32.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14 งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการจ่ายไฟจากเครื่องชนิดดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ภายในบริเวณพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เบตง ผ่านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA)	ฝวธ.(ก4) กบว.(ก4)	10.410	10.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15 งานจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง ระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้า	ฝบป. กมต.	104.271	10.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		4,269.822	2,504.396	779.720	621.265	79.7	(158.455)	24.8	384.713	250.425	65.1	(134.288)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%		วงเงิน		%		
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก												
3.1 งานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่	ผสอ. กสพ.	52.057	52.057	18.219	7.808	42.9	(10.411)	14.999	-	-	-	-
3.2 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA	ศสพ.	37.340	37.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 งานดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation	ศสพ.	369.166	369.166	332.249	-	-	(332.249)	-	-	-	-	-
3.4 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบงาน AMR	ผมป. กพร.	43.096	43.096	21.548	38.088	176.8	16.540	88.379	-	38.088	-	38.088
3.5 งานจัดซื้อเครื่อง Oil Regeneration	ผมป. กมป.	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกันและการวิเคราะห์ฟอลต์	ผบร. กอร.	26.010	26.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 งานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.	ผสอ. กสพ.	11.845	9.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผสค. กบอ.	111.726	11.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักงานใหญ่ และ กคพ.3	ผสค. กบอ.	117.121	19.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 งานรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่	ผคพ. ศสพ.	22.172	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		817.533	569.959	372.016	45.896	12.3	(326.120)	8.053	-	38.088	-	38.088
4. หมวดวิจัยและพัฒนา												
4.1 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ	ผวพ. กวจ.	3.603	3.388	3.388	-	-	(3.388)	-	-	-	-	-
4.2 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	ผวพ. กวน.	72.361	15.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดวิจัยและพัฒนา		75.964	18.589	3.388	-	-	(3.388)	-	-	-	-	-
5. หมวดลงทุนอื่นๆ												
5.1 งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)	ผคพ.	2.941	0.975	-	1.823	-	1.823	186.974	-	0.975	-	0.975
5.2 เพิ่มทุนให้บริษัท ทีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	รพภ.(วท) (คุณเขมรัตน์)	2,765.000	650.000	560.000	659.000	117.7	99.000	101.385	200.000	210.000	105.0	10.000
รวมหมวดลงทุนอื่นๆ		2,767.941	650.975	560.000	660.823	118.0	100.823	101.513	200.000	210.975	105.5	10.975
6. หมวดสำรองราคา	ผงป. กปง.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	ผงป. กปง.	4,502.901	1,530.000	740.731	648.925	87.6	(91.806)	42.413	250.000	186.400	74.6	(63.600)
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.268	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)
งบลงทุนที่ว่าเป็นแผนระยะยาว												
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2												
8.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รพภ.(วท) ผยธ.	32.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รพภ.(วท) ผยธ.	184.035	34.239	21.747	56.113	258.0	34.366	163.9	10.089	13.091	129.8	3.002
8.3 งานจัดหายานพาหนะ	รพภ.(วท) ผจท.	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รพภ.(วท) ผงท. กฟข.	209.815	6.596	6.596	59.919	908.4	53.323	908.4	-	12.546	-	12.546
8.5 สำรองค่าปรับราคา		61.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2		512.043	40.835	28.343	116.032	409.4	87.689	284.1	10.089	25.637	254.1	15.548

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561					
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง			สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
					วงเงิน	%				วงเงิน	%		
9. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3													
9.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รพท.(วศ) ผยธ.	77.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รพท.(วศ) ผยธ.	568.161	152.399	92.981	178.106	191.6	85.125	116.9	33.356	35.112	105.3	1.756	
9.3 งานจัดหายานพาหนะ	รพท.(วศ) ผจท.	1,761.226	76.049	16.449	16.449	100.0	-	21.6	16.449	16.449	100.0	-	
9.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รพท.(วศ) กฟข.	393.496	-	-	26.662	-	26.662	-	-	11.028	-	11.028	
9.5 สำรองค่าปรับราคา		157.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		2,957.305	228.448	109.430	221.217	202.2	111.787	96.8	49.805	62.589	125.7	12.784	
10. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	ผสท. ผวส. ผพท.	8,489.537	319.377	43.302	36.406	84.1	(6.896)	11.4	3.347	20.513	612.9	17.166	
11. งานก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำสำหรับเมืองใหญ่	ผศพ. กจค.2(คท)	163.813	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. งานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2	ผพท. ศสพ.	123.567	36.242	18.562	13.312	71.7	(5.250)	36.7	3.094	12.848	415.3	9.754	
13. แผนงานจัดหามอเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ	ผจท. กจน. กมค.	108.475	57.855	39.567	-	-	(39.567)	-	27.500	-	-	(27.500)	
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ	ผสอ. กสท.	17.648	11.355	11.355	5.441	47.9	(5.914)	47.9	11.355	2.845	25.1	(8.510)	
15. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	177.720	140.471	69.692	20.800	29.8	(48.892)	14.8	33.555	5.254	15.7	(28.301)	
16. แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ผบร. กบร.	466.262	170.060	3.300	22.664	686.8	19.364	13.3	3.300	10.110	306.4	6.810	
17. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ผวร. กมร.	1,477.365	302.537	269.027	265.915	98.8	(3.112)	87.9	-	265.915	-	265.915	
18. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟท.	ผบร. กอร.	309.387	148.236	110.969	55.418	49.9	(55.551)	37.4	9.807	36.709	374.3	26.902	
19. แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC 61850	ผบร. กอร.	242.112	187.494	153.150	63.908	41.7	(89.242)	34.1	104.177	8.397	8.1	(95.780)	
20. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบสายส่ง 115 kV	ผบร. กบร.	6.530	1.530	1.530	-	-	(1.530)	-	-	-	-	-	
21. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2	ผสค. กอบ.	16.661	4.860	4.860	4.860	100.0	-	100.0	-	1.375	-	1.375	
22. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟท.1)	ผสค. กอบ.	162.605	98.342	65.132	-	-	(65.132)	-	0.030	-	-	(0.030)	
23. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2558-2563	รพท.(อ) / กนท.	475.909	127.020	64.410	99.382	154.3	34.972	78.2	10.735	16.201	150.9	5.466	
24. แผนงานจัดซื้อมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2	ผบป. กพร.	84.154	69.649	7.826	7.826	100.0	-	11.2	-	-	-	-	
25. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล	ผบผ. กคบ.	163.732	141.697	4.260	1.780	41.8	(2.480)	1.3	0.300	0.683	227.7	0.383	
26. แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System	ผบป. กบป.	200.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนมิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานนาน	ผบป. กมค.	4.449	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ	ผสค. กบข.	48.674	14.341	5.603	2.802	50.0	(2.801)	19.5	1.400	1.235	88.2	(0.165)	
29. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยังไม่มีระบบสื่อสาร	ผสค. กอบ.	136.974	79.642	12.886	6.545	50.8	(6.341)	8.2	0.050	-	-	(0.050)	
30. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณความถี่สูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจพ.1 (กฟท.1, กฟท.2, กฟท.3)	ผสค. กอบ.	82.620	79.235	0.250	45.247	18,098.8	44.997	57.1	0.050	38.943	77,886.0	38.893	
31. แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference	ผสค. กอบ.	55.261	45.268	0.500	0.497	99.4	(0.003)	1.1	0.100	0.497	497.0	0.397	
32. แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสเตรนเซอร์	ผวส. กบท. 12 เขตดำเนินการ	32.882	28.473	3.683	0.813	22.1	(2.870)	2.9	3.417	0.813	23.8	(2.604)	
33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสาร (เซลล์การโมเต็ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPF)	ผคพ. กอค.	3.482	3.482	2.892	2.344	81.1	(0.548)	67.3	-	0.007	-	0.007	

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง			สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
34. แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1	ศคฟ. กอศ.	71.716	69.716	20.345	0.018	0.1	(20.327)	0.0	13.412	-	-	(13.412)
35. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2	ศคฟ. กอศ.	225.305	22.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564	รผก.(อ) กนภ.	420.190	50.248	23.204	26.199	112.9	2.995	52.1	3.923	4.599	117.2	0.676
37. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทียน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ ของ กฟภ.	ฝบม. กคบ.	32.239	31.144	18.954	15.656	82.6	(3.298)	50.3	0.660	15.656	2,372.1	14.996
38. แผนการจัดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลักของ กฟภ. ระยะที่ 1	ฝพท. กสส.	1,597.318	589.349	316.805	316.805	100.0	-	53.8	53.568	53.568	100.0	-
39. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3	ศคฟ. กอศ.	323.584	32.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2	ศคฟ. กอศ.	25.500	25.500	5.500	5.500	100.0	-	21.6	-	-	-	-
41. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	ศคฟ. ศสพ.	1,065.162	104.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2	ฝสค. กอบ.	42.381	35.440	17.670	17.637	99.8	(0.033)	49.8	0.050	-	-	(0.050)
43. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	ฝสท. กอศ.	388.200	122.490	58.419	-	-	(58.419)	-	-	-	-	-
44. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝบร. กบส.	225.290	94.359	5.929	2.679	45.2	(3.250)	2.8	-	-	-	-
45. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝบร. กบส.	145.117	77.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เฒะ ของ กฟภ.	ฝบม. กคบ.	49.484	31.781	3.240	1.058	32.7	(2.182)	3.3	0.600	-	-	(0.600)
47. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	ฝบร. กบร.	888.527	300.000	30.000	12.091	40.3	(17.909)	4.0	17.910	-	-	(17.910)
48. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565	รผก.(อ) กนภ.	611.764	50.266	21.535	29.278	136.0	7.743	58.2	5.640	4.545	80.6	(1.095)
49. แผนงานจัดหามีเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2	ฝบม. กมต.	977.412	537.417	155.633	192.948	124.0	37.315	35.9	64.390	32.046	49.8	(32.344)
50.แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4												
50.1 งานที่ดิน	รผก.(วค) รผก.(ภ1-ภ4) ฝยธ.	241.630	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.2 งานสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วค) รผก.(ภ1-ภ4) ฝยธ. ฝกร.	1,962.591	428.285	76.508	43.184	56.4	(33.324)	10.1	55.455	13.115	23.6	(42.340)
50.3 งานยานพาหนะ	รผก.(วค) ฝจท.	2,543.403	303.650	39.478	39.478	100.0	-	13.0	-	25.025	-	25.025
50.4 งานเครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วค) ฝจท. เขต	617.225	232.140	-	53.947	-	53.947	23.2	-	15.875	-	15.875
50.5 สรรองค่าปรับราคา		73.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		5,438.018	1,014.075	115.986	136.609	117.8	20.623	13.5	55.455	54.015	97.4	(1.440)
51. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ (ปี 2560-2562)	ฝยธ. กจก.	240.364	169.830	59.670	35.513	59.5	(24.157)	20.9	11.475	8.763	76.4	(2.712)
52. แผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ฝสค. กอบ.	992.859	607.928	429.685	163.522	38.1	(266.163)	26.9	82.378	48.190	58.5	(34.188)
53. แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ	ฝพท. 12 เขตดำเนินการ	351.233	257.235	153.016	14.637	9.6	(138.379)	5.7	40.257	3.754	9.3	(36.503)
54.แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	ศคฟ.	323.733	176.130	36.616	23.668	64.6	(12.948)	13.4	9.850	2.329	23.6	(7.521)
55. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ฝบร. กบร.	2,916.916	1,129.826	233.826	346.942	148.4	113.116	30.7	113.000	110.163	97.5	(2.837)
56. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	รผก.(ป) ศสพ. (รท.สพ.) 12 เขตดำเนินการ	627.578	549.296	120.731	37.500	31.1	(83.231)	6.8	35.996	13.304	37.0	(22.692)
57. แผนงานเข้าเครื่องยนต์ดีเซลก้านเคเบิลไฟฟ้าบนพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	ฝบม. กคบ. กบข.(ค.2)	74.743	12.584	-	5.639	-	5.639	44.8	-	5.639	-	5.639

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง			สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
58. แผนงานเข้างานพาทนะ ปี 2561 - 2566	รผก.(อ) กนก.	598.122	29.458	1.171	0.444	37.9	(0.727)	1.5	0.198	0.089	44.9	(0.109)
59. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ฝพบ. ศฝพ.	620.000	63.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	ฝบร. กบส. 12 เขตดำเนินการ	316.340	126.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV	ฝคฟ. กอค.	115.964	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ฝสค. กอบ.	254.800	127.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. แผนงานปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ ส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3)	ฝสค. กอบ.	509.660	50.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. แผนงานขยายโครงข่าย IP Network	ฝสค. กอบ.	108.000	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม	ฝสค. กบอ.	288.000	115.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต	ฝบร. กอร.	109.604	9.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานระยะยาว		37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง			สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	98.179	16.986	7.620	6.812	89.4	(0.808)	40.1	4.020	4.461	111.0	0.441
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	44.122	9.597	9.597	5.738	59.8	(3.859)	59.8	-	0.832	-	0.832
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	1.392	-	1.392
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	อ.ฝ.บก. 2	407.374	155.000	148.340	224.716	151.5	76.376	145.0	13.340	15.170	113.7	1.830
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	อ.ฝ.บก. 2	918.164	360.000	209.413	205.246	98.0	(4.167)	57.0	61.500	44.566	72.5	(16.934)
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	อ.ฝ.บก. 1	284.511	155.000	8.650	54.201	626.6	45.551	35.0	1.220	1.399	114.7	0.179
7. ทดสอบระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	ผชก.(ป)	287.270	39.664	25.727	20.885	81.2	(4.842)	52.7	0.035	0.420	1,200.0	0.385
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	32.377	8.000	1.000	1.865	186.5	0.865	23.3	1.000	1.865	186.5	0.865
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถั้ว)ไปยังเกาะสมุย	ผชก.(กบ)	221.291	15.200	0.050	-	-	(0.050)	-	0.025	-	-	(0.025)
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	อ.ฝ.บก. 2	142.046	60.000	20.187	26.505	131.3	6.318	44.2	6.250	14.557	232.9	8.307
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	ผชก.(กบ)	116.012	79.757	43.372	43.403	100.1	0.031	54.4	38.659	2.153	5.6	(36.506)
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	2,079.897	885.000	365.201	786.991	215.5	421.790	88.9	79.002	84.602	107.1	5.600
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	1,661.498	230.000	77.000	123.823	160.8	46.823	53.8	1.000	11.123	1,112.3	10.123
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ผชก.(กบ)	4,028.665	1,600.000	461.090	999.150	216.7	538.060	62.4	106.979	147.368	137.8	40.389
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	อ.ฝ.คท.	960.164	340.000	170.913	209.182	122.4	38.269	61.5	28.940	60.601	209.4	31.661
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	ผชก.(กบ)	5,335.088	1,150.000	430.000	513.393	119.4	83.393	44.6	76.723	85.241	111.1	8.518
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	ผชก.(กบ)	30.121	0.900	0.050	1.765	3,530.0	1.715	196.1	0.050	1.765	3,530.0	1.715
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	ผชก.(กบ)	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	0.460	0.427	92.8	(0.033)
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	ร.มก.(ว) กคก.	357.460	102.000	55.944	64.292	114.9	8.348	63.0	24.410	17.635	72.2	(6.775)
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ - ร.มก.(ป) - ร.มก.(ทส)	ร.มก.(ป) ฝคท. ฝสท., ฝสค., กอส., กอบ.,	2,830.777 886.084	434.631 358.156	66.648 306.374	1.226 163.885	1.8 53.5	(65.422) (142.489)	0.3 45.8	2.116 8.293	0.243 73.742	11.5 889.2	(1.873) 65.449
รวม		3,716.861	792.787	373.022	165.111	44.3	(207.911)	20.8	10.409	73.985	710.8	63.576
21. พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	ร.มก.(ว) กผอ.	1,058.109	265.949	134.826	17.952	13.3	(116.874)	6.8	116.565	1.971	1.7	(114.594)
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	ร.มก.(ว) กคก.	276.923	117.738	60.053	53.436	89.0	(6.617)	45.4	21.639	13.147	60.8	(8.492)
23. พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	อ.ฝ.คท.	807.895	6.411	5.495	0.026	0.5	(5.469)	0.4	5.495	-	-	(5.495)
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	ร.มก.(ว) กคก.	739.700	452.000	212.221	176.836	83.3	(35.385)	39.1	32.549	42.030	129.1	9.481
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)	อ.ฝ.บก. 1	1,628.834	250.000	47.614	131.742	276.7	84.128	52.7	0.750	10.531	1,404.1	9.781
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพท.1)	ร.มก.(กบ)	19,181.874	8,000.000	2,900.000	2,821.475	97.3	(78.525)	35.3	600.000	909.151	151.5	309.151
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพท.1)	ร.มก.(ว) กผอ.	259.530	98.681	4.455	0.056	1.3	(4.399)	0.1	-	-	-	-
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพท.1)	ผชก.(กบ)	5,005.741	728.000	277.927	94.727	34.1	(183.200)	13.0	88.427	56.255	63.6	(32.172)
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)	อ.ฝ.บก.1	954.858	180.000	2.500	2.810	112.4	0.310	1.6	1.050	0.917	87.3	(0.133)
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพท.2)	กคก.	1,578.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานโครงการ		52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067
รวมทั้งสิ้น		107,775.563	32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684
