

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2561		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617
- รายปี	17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.3	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)
- ระยะยาว	37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067
รวมทั้งสิ้น	★107,775.563	★ 32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684

★ หมายเหตุ


- มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,324.936 ล้านบาท
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2561 ทำให้มีวงเงินงบประมาณ 106,197.563 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่าย 32,445.565 ล้านบาท (สศช. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- มติ ครม. วันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 107,775.563 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2
		วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	3,650.679	3,119.567	85.5	(531.112)
- รายปี	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	1,785.272	1,637.551	91.7	(147.721)
- ระยะยาว	993.057	895.536	90.2	(97.521)	1,865.407	1,482.016	79.4	(383.391)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	3,275.670	3,806.782	116.2	531.112
รวมทั้งสิ้น	4,947.712	4,947.712	100.0	-	6,926.349	6,926.349	100.0	-

## เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2560-2561

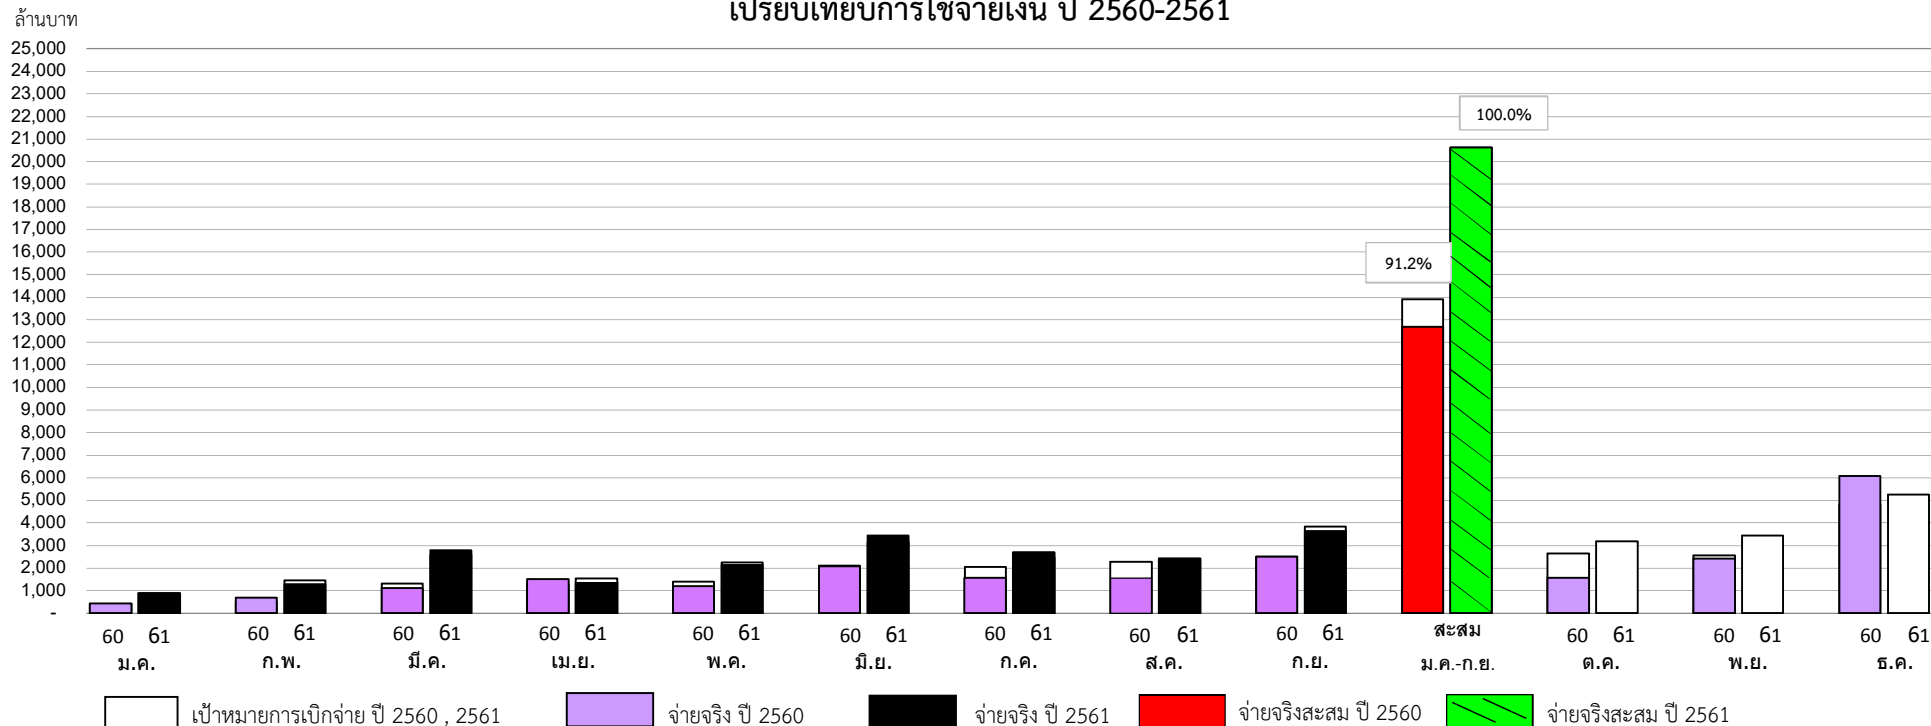

ปี 2560		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
		- เป้าหมายการเบิกจ่าย	404	534	1,321	1,298	1,389	2,115	2,054	2,279	2,512	13,906	2,653	2,573	4,822
- จ่ายจริง		446	703	1,110	1,513	1,200	2,088	1,563	1,553	2,506	12,682	1,569	2,413	6,084	22,748
% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน		101.0	99.4	84.0	116.6	86.4	98.7	76.1	68.1	99.8	91.2	59.1	93.8	126.2	95.0
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	2,480	2,420	3,839	20,613	3,177	3,432	5,224	32,446
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	2,688	2,427	3,624	20,613				20,613
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	2	(187)	185	(204)	(108)	312	208	7	(215)	-	(3,177)	(3,432)	(5,224)	(11,833)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	108.4	100.3	94.4	100.0	-	-	-	63.5
	- เป้าหมายสะสม	887	2,351	4,948	6,504	8,749	11,874	14,354	16,774	20,613					
	- จ่ายจริงสะสม	889	2,166	4,948	6,300	8,437	11,874	14,562	16,989	20,613					
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	100.2	92.1	100.0	96.9	96.4	100.0	101.4	101.3	100.0					
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	2.7	6.7	15.2	19.4	26.0	36.6	44.9	52.4	63.5					

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ 30 กันยายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561				
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				วงเงิน	%				วงเงิน	%		
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>												
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,927.249	7,357.658	4,433.460	4,035.392	91.0	(398.068)	54.8	581.728	563.003	96.8	(18.725)	
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	37,494.790	8,987.306	5,625.277	4,205.311	74.8	(1,419.966)	46.8	1,699.214	790.813	46.5	(908.401)	
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>55,422.039</b>	<b>16,344.964</b>	<b>10,058.737</b>	<b>8,240.703</b>	<b>81.9</b>	<b>(1,818.034)</b>	<b>50.4</b>	<b>2,280.942</b>	<b>1,353.816</b>	<b>59.4</b>	<b>(927.126)</b>	
<b>งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	98.179	16.986	12.680	10.101	79.7	(2.579)	59.5	0.020	0.203	1,015.0	0.183	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	44.122	9.597	9.597	5.746	59.9	(3.851)	59.9	-	-	-	-	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	-	-	-	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	407.374	155.000	155.000	338.355	218.3	183.355	218.3	-	105.304	-	105.304	
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	918.164	360.000	271.785	337.838	124.3	66.053	93.8	0.500	79.954	15,990.8	79.454	
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	284.511	155.000	48.790	131.066	268.6	82.276	84.6	15.060	44.689	296.7	29.629	
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	287.270	39.664	38.064	28.617	75.2	(9.447)	72.1	3.093	7.399	239.2	4.306	
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	32.377	8.000	3.000	6.668	222.3	3.668	83.4	2.000	3.934	196.7	1.934	
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	221.291	15.200	0.125	-	-	(0.125)	-	0.025	-	-	(0.025)	
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	142.046	60.000	45.000	40.446	89.9	(4.554)	67.4	6.175	-	-	(6.175)	
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	116.012	79.757	71.251	77.816	109.2	6.565	97.6	27.679	15.433	55.8	(12.246)	
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	2,079.897	885.000	552.545	1,229.000	222.4	676.455	138.9	85.102	198.962	233.8	113.860	
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1,661.498	230.000	159.982	248.605	155.4	88.623	108.1	13.888	35.635	256.6	21.747	
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	4,028.665	1,600.000	732.626	1,862.377	254.2	1,129.751	116.4	109.870	77.191	70.3	(32.679)	
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	960.164	340.000	213.530	250.782	117.4	37.252	73.8	4.477	11.518	257.3	7.041	
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	5,335.088	1,150.000	750.000	989.768	132.0	239.768	86.1	147.698	149.168	101.0	1.470	
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	30.121	0.900	0.100	3.414	3,414.0	3.314	379.3	-	0.134	-	0.134	
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	-	-	-	-	
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	357.460	102.000	83.394	92.920	111.4	9.526	91.1	7.271	15.725	216.3	8.454	
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	3,716.861	792.787	597.666	269.937	45.2	(327.729)	34.0	12.854	57.169	444.8	44.315	
21. พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	1,058.109	265.949	245.070	84.830	34.6	(160.240)	31.9	98.783	66.832	67.7	(31.951)	
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	276.923	117.738	96.632	92.141	95.4	(4.491)	78.3	9.253	18.437	199.3	9.184	
23. พัฒนาระบบจำหน่ายขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	807.895	6.411	5.495	4.887	88.9	(0.608)	76.2	-	-	-	-	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	739.700	452.000	329.057	299.046	90.9	(30.011)	66.2	29.362	60.400	205.7	31.038	
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,628.834	250.000	166.700	233.712	140.2	67.012	93.5	45.750	3.088	6.7	(42.662)	
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	19,181.874	8,000.000	5,400.000	5,466.025	101.2	66.025	68.3	850.000	1,250.685	147.1	400.685	
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	259.530	98.681	57.450	7.733	13.5	(49.717)	7.8	29.641	4.206	14.2	(25.435)	
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	5,005.741	728.000	400.753	212.708	53.1	(188.045)	29.2	29.860	46.921	157.1	17.061	
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	954.858	180.000	106.024	35.036	33.0	(70.988)	19.5	29.650	7.232	24.4	(22.418)	
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,578.000	-	-	10.383	-	10.383	-	-	10.312	-	10.312	
<b>รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>	<b>52,353.524</b>	<b>16,100.601</b>	<b>10,554.247</b>	<b>12,372.281</b>	<b>117.2</b>	<b>1,818.034</b>	<b>76.8</b>	<b>1,558.011</b>	<b>2,270.531</b>	<b>145.7</b>	<b>712.520</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107,775.563</b>	<b>32,445.565</b>	<b>20,612.984</b>	<b>20,612.984</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>63.5</b>	<b>3,838.953</b>	<b>3,624.347</b>	<b>94.4</b>	<b>(214.606)</b>	

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 กันยายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบ กับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>												
<b>งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>												
<b>1. หมวดติดตั้งก่อสร้าง</b>												
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ฝรพ. กรพ. , ผจท.	1,400.970	616.759	350.691	515.409	147.0	164.718	83.6	68.113	93.109	136.7	24.996
1.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่าย ได้แนวสายส่ง เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าลานโก ลำลูกกา 2	ผบ.ก.2 กจค.1(บ.ก.2) กฟภ.1	13.631	6.251	6.000	5.664	94.4	(0.336)	90.6	2.000	1.100	55.0	(0.900)
1.3 งานเสริมประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ผบ.ป. กบป. /ผจท.	37.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบ จำหน่ายแรงต่ำ	ผบ.ก.1 กจค.1(บ.ก1)	538.592	190.000	162.001	235.573	145.4	73.572	124.0	10.764	5.165	48.0	(5.599)
1.5 งานก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการตรวจซ่อม จำนวน 11 แห่ง	ผคพ. กอค.	2.019	2.019	2.019	2.019	100.0	-	100.0	-	-	-	-
1.6 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจพ.2	ผคพ. ศสพ.	10.680	10.680	10.680	10.832	101.4	0.152	101.4	-	0.045	-	0.045
1.7 งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง	รผก.(ป) ศสพ. (รค.สพ.) 12 เขตดำเนินการ	82.256	74.877	38.967	13.388	34.4	(25.579)	17.9	-	0.012	-	0.012
1.8 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้ไลน์สายส่ง สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยเหล จ. นครราชสีมา	ผวบ.(ธ3)	120.869	27.621	15.186	46.493	306.2	31.307	168.3	4.000	7.302	182.6	3.302
1.9 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ไปงน้ำร้อน 2, สถานีไฟฟ้าชั่วคราว คอนเจดีย์ 2 และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวชะอำ 3	ผวบ.(ก.2), ผวบ.(ก.3) , ผวบ.(ต.1) กจพ.	24.081	20.509	20.509	3.039	14.8	(17.470)	14.8	-	0.019	-	0.019
1.10 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย แบบ Knockdown	ผวอ.(ธ3) ดำเนินการที่ กฟข. ( กฟน.1-3, กฟฉ.1-2, กฟภ.2, กฟต.1,3 )	12.185	12.185	12.185	12.507	102.6	0.322	102.6	-	0.732	-	0.732
1.11 งานจัดหาวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้งานในสภาวะวิกฤต	ผสค. กอบ.	31.031	8.502	4.251	4.251	100.0	-	50.0	-	-	-	-
1.12 งานก่อสร้าง Loop Line สายส่ง 115 เควี และเพิ่มเบย์ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าลาดยาง 2 เพื่อรองรับการจ่ายไฟของสนามบินนานาชาติภูเก็ต	ผคพ. กจค.2(คพ.)	111.914	106.583	80.423	61.806	76.9	(18.617)	58.0	15.303	15.947	104.2	0.644
1.13 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	กคก.	281.595	194.375	148.123	186.177	125.7	38.054	95.8	13.954	12.061	86.4	(1.893)
1.14 งานก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟน.1	ผบ.ป. กรส.(น.1)	93.700	9.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา2	ผบ.ป.(ก.1), ผวบ.(ก.3)	145.217	106.747	34.616	33.692	97.3	(0.924)	31.6	1.237	3.896	315.0	2.659
1.16 งานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เกาะฮัง จ.กระบี่	ผวบ.(ค.2)	25.540	14.566	7.622	0.939	12.3	(6.683)	6.4	0.671	0.092	13.7	(0.579)
1.17 งานก่อสร้างย้ายแนวสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจร ภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 (กฟผ.)	ผกร. กคพ.2	141.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขอนแก่น (Switching 115 kV GIS) จ.นครราชสีมา	ผคพ. กจค.1 (คพ.)	269.370	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ผบ.ก.2 ผจท. กวผ.	1,299.983	429.431	89.142	101.072	113.4	11.930	23.5	83.159	20.664	24.8	(62.495)
1.20 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประเภท Optical fiber Overhead Ground Wire (OPGW) สำหรับใช้งานตรวจซ่อม	ผสค. กบข.	8.534	0.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน กฟภ. (Solar PV Rooftop)	ผสอ. กสพ.	18.100	18.100	18.100	1.196	6.6	(16.904)	6.6	-	-	-	-
1.22 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.	ผวบ.(ค.2)	62.010	24.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับ 12 เดือน	กันยายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
1.23 งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต กฟท.1	22.267	4.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพรซีเจอร์, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7	ฝบ.บ.(อ.3), ฝวบ.(ก.3)	42.650	21.889	1.820	0.898	49.3	(0.922)	4.1	0.310	0.363	117.1	0.053
1.25 งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1(กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้วยฉัตร)- สถานีไฟฟ้าลำปาง 3	ฝกร. กฟท.1	165.072	3.613	1.806	0.219	12.1	(1.587)	6.1	0.602	0.219	36.4	(0.383)
1.26 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ได้ไลน์สายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรีฯ - สฟ.กลาง2 จ.ภูเก็ต	ฝวบ.(ต.2)	61.774	40.153	12.355	0.961	7.8	(11.394)	2.4	9.266	0.865	9.3	(8.401)
1.27 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	ฝวบ.(น.1)	23.212	3.955	1.811	0.457	25.2	(1.354)	11.6	0.505	0.457	90.5	(0.048)
1.28 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยก เขื่อนแม่ปาย - สี่แยก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	ฝวบ.(น.1)	44.694	4.098	2.049	2.248	109.7	0.199	54.9	0.683	1.260	184.5	0.577
1.29 งานเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ฝวบ.(น.1)	67.615	45.968	26.092	3.196	12.2	(22.896)	7.0	8.468	2.501	29.5	(5.967)
1.30 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าย่อย แบบ Knockdown (ระยะที่ 2)	ฝวธ.(ก3)	32.946	15.814	7.578	0.923	12.2	(6.655)	5.8	7.578	0.923	12.2	(6.655)
1.31 งานจัดหารีโมเดลเซอร์เพื่อติดตั้งในไลน์แยกแทนฟิวส์พื้นที่ กฟต.2	ฝวธ.(ก4) กบว.(ก4)	57.451	49.623	-	0.037	-	0.037	0.1	-	0.016	-	0.016
1.32 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร สำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขต	ฝสอ. กสท.	143.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>5,393.088</b>	<b>2,083.739</b>	<b>1,054.026</b>	<b>1,242.996</b>	<b>117.9</b>	<b>188.970</b>	<b>59.7</b>	<b>226.613</b>	<b>166.748</b>	<b>73.6</b>	<b>(59.865)</b>
<b>2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</b>												
2.1 งานจัดหามอเตอร์ วีที ซีที และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝจท.	2,662.540	1,487.732	845.599	545.168	64.5	(300.431)	36.6	156.531	114.047	72.9	(42.484)
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝจท. กมต.	229.903	212.699	200.761	105.992	52.8	(94.769)	49.8	61.330	18.943	30.9	(42.387)
2.3 งานจัดซื้อรถยนต์ให้ กฟท. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา	รผก.(วค)	60.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งาน สูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป./ฝจท.	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งาน สูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป./ฝจท.	96.000	96.000	-	70.700	-	70.700	73.6	-	70.700	-	70.700
2.6 งานจัดหามอเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ	ฝบป. กรท. /ฝจท.	244.840	240.483	115.804	89.530	77.3	(26.274)	37.2	34.906	4.332	12.4	(30.574)
2.7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์	กมต. / ฝจท.	238.316	99.020	76.434	64.706	84.7	(11.728)	65.3	7.610	9.312	122.4	1.702
2.8 งานจัดซื้อโมเดลสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในโครงการ AMR ระยะที่ 1	ฝบป. กพร.	137.625	137.625	137.625	117.500	85.4	(20.125)	85.4	-	-	-	-
2.9 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง เสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝบป. กบป. / ฝจท.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์	ฝบผ. กคบ.	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ฝบป. กบป. / ฝจท.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 งานจัดหามอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน มอเตอร์แบบจานหมุน ในพื้นที่ กฟอ.สายบุรี, กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ฝบป. กมต.	65.522	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควีที่สถานีไฟฟ้า บ้านดง2 จ.อุตรธานี	ฝกส. กกส.	32.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14 งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการจ่ายไฟจากเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ภายในบริเวณพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เบตง ผ่านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA)	ฝวธ.(ก4) กบว.(ก4)	10.410	10.410	-	0.105	-	0.105	1.0	-	-	-	-
2.15 งานจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง ระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้า	ฝบป. กมต.	104.271	10.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</b>		<b>4,269.822</b>	<b>2,504.396</b>	<b>1,376.223</b>	<b>993.701</b>	<b>72.2</b>	<b>(382.522)</b>	<b>39.7</b>	<b>260.377</b>	<b>217.334</b>	<b>83.5</b>	<b>(43.043)</b>

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
					วงเงิน	%				วงเงิน	%		
<b>3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก</b>													
3.1 งานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่	ผสอ. กสพ.	52.057	52.057	46.850	7.808	16.7	(39.042)	15.0	-	-	-	-	-
3.2 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA	คสพ.	37.340	37.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 งานดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation	คสพ.	369.166	369.166	332.249	6.554	2.0	(325.695)	1.8	-	0.114	-	-	0.114
3.4 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบงาน AMR	ผมป. กพร.	43.096	43.096	43.096	42.320	98.2	(0.776)	98.2	-	-	-	-	-
3.5 งานจัดซื้อเครื่อง Oil Regeneration	ผมป. กมป.	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบเบรคป้องกันและการวิเคราะห์ฟอลต์	ผบร. กอร.	26.010	26.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 งานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.	ผสอ. กสพ.	11.845	9.475	5.922	-	-	(5.922)	-	4.738	-	-	-	(4.738)
3.8 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผสค. กบอ.	111.726	11.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักงานใหญ่ และ กศพ.3	ผสค. กบอ.	117.121	19.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 งานรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่	ผคพ. คสพ.	22.172	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก</b>		<b>817.533</b>	<b>569.959</b>	<b>428.117</b>	<b>56.682</b>	<b>13.2</b>	<b>(371.435)</b>	<b>9.9</b>	<b>4.738</b>	<b>0.114</b>	<b>122.4</b>	<b>-</b>	<b>(4.624)</b>
<b>4. หมวดวิจัยและพัฒนา</b>													
4.1 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ	ผวพ. กวจ.	3.603	3.388	3.388	-	-	(3.388)	-	-	-	-	-	-
4.2 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	ผวพ. กวน.	72.361	15.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดวิจัยและพัฒนา</b>		<b>75.964</b>	<b>18.589</b>	<b>3.388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.388)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. หมวดลงทุนอื่นๆ</b>													
5.1 งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)	ผคพ.	2.941	0.975	0.975	1.823	187.0	0.848	187.0	-	-	-	-	-
5.2 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รผก.(วค) (คุณเขมรัตน์)	2,765.000	650.000	560.000	659.000	117.7	99.000	101.4	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดลงทุนอื่นๆ</b>		<b>2,767.941</b>	<b>650.975</b>	<b>560.975</b>	<b>660.823</b>	<b>117.8</b>	<b>99.848</b>	<b>101.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. หมวดสำรองราคา</b>	ผงป. กปง.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน</b>	ผงป. กปง.	4,502.901	1,530.000	1,010.731	1,081.190	107.0	70.459	70.7	90.000	178.807	198.7	-	88.807
<b>รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>		<b>17,927.249</b>	<b>7,357.658</b>	<b>4,433.460</b>	<b>4,035.392</b>	<b>91.0</b>	<b>(398.068)</b>	<b>54.8</b>	<b>581.728</b>	<b>563.003</b>	<b>96.8</b>	<b>-</b>	<b>(18.725)</b>
<b>งบลงทุนที่ว่าเป็นแผนระยะยาว</b>													
<b>8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2</b>													
8.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รผก.(วค) ผยธ.	32.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รผก.(วค) ผยธ.	184.035	34.239	29.350	73.574	250.7	44.224	214.9	7.603	7.495	98.6	-	(0.108)
8.3 งานจัดหายานพาหนะ	รผก.(วค) ผจท.	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 งานจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	รผก.(วค) ผจท. กพข.	209.815	6.596	6.596	86.612	1,313.1	80.016	1,313.1	-	17.038	-	-	17.038
8.5 สำรองค่าปรับราคา		61.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2</b>		<b>512.043</b>	<b>40.835</b>	<b>35.946</b>	<b>160.186</b>	<b>445.6</b>	<b>124.240</b>	<b>392.3</b>	<b>7.603</b>	<b>24.533</b>	<b>322.7</b>	<b>-</b>	<b>16.930</b>

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
					วงเงิน	%				วงเงิน	%		
9. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3													
9.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รพท.(วท) ผยธ.	77.142	-	-	5.874	-	5.874	-	-	5.874	-	5.874	-
9.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รพท.(วท) ผยธ.	568.161	152.399	123.927	313.970	253.4	190.043	206.0	30.946	48.285	156.0	17.339	-
9.3 งานจัดหายานพาหนะ	รพท.(วท) ผจท.	1,761.226	76.049	76.049	16.449	21.6	(59.600)	21.6	59.600	-	-	(59.600)	-
9.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รพท.(วท) กฟช.	393.496	-	-	27.920	-	27.920	-	-	-	-	-	-
9.5 สำรองค่าปรับราคา		157.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		2,957.305	228.448	199.976	364.213	182.1	164.237	159.4	90.546	54.159	59.8	(36.387)	-
10. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	ผสท. ผวส. ผพท.	8,489.537	319.377	253.592	58.629	23.1	(194.963)	18.4	179.741	0.160	0.1	(179.581)	-
11. งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่	ผคท. กคค.2(คท)	163.813	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. งานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2	ผพท. ศผท.	123.567	36.242	21.992	14.164	64.4	(7.828)	39.1	-	-	-	-	-
13. แผนงานจัดหาไมเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ	ผจท. กจน. กมต.	108.475	57.855	57.855	-	-	(57.855)	-	-	-	-	-	-
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ	ผสอ. กสท.	17.648	11.355	11.355	6.776	59.7	(4.579)	59.7	-	0.935	-	0.935	-
15. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	177.720	140.471	99.671	26.059	26.1	(73.612)	18.6	29.979	5.259	17.5	(24.720)	-
16. แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ผบร. กบร.	466.262	170.060	170.060	28.682	16.9	(141.378)	16.9	166.760	1.431	0.9	(165.329)	-
17. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ผวร. กพร.	1,477.365	302.537	302.537	262.046	86.6	(40.491)	86.6	33.510	-	-	(33.510)	-
18. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟท.	ผบร. กอร.	309.387	148.236	141.285	143.454	101.5	2.169	96.8	-	76.760	-	76.760	-
19. แผนงานปรับปรุงเครื่องป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC 61850	ผบร. กอร.	242.112	187.494	187.494	137.132	73.1	(50.362)	73.1	-	47.859	-	47.859	-
20. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบสายส่ง 115 kV	ผบร. กบร.	6.530	1.530	1.530	-	-	(1.530)	-	-	-	-	-	-
21. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2	ผสค. กอบ.	16.661	4.860	4.860	4.870	100.2	0.010	100.2	-	-	-	-	-
22. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟท.1)	ผสค. กอบ.	162.605	98.342	65.212	-	-	(65.212)	-	0.040	-	-	(0.040)	-
23. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2558-2563	รพท.(อ) / กนท.	475.909	127.020	95.715	147.363	154.0	51.648	116.0	10.435	16.021	153.5	5.586	-
24. แผนงานจัดซื้อไมเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2	ผบป. กพร.	84.154	69.649	7.826	7.826	100.0	-	11.2	-	-	-	-	-
25. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล	ผบผ. กคท.	163.732	141.697	120.015	2.657	2.2	(117.358)	1.9	13.055	0.011	0.1	(13.044)	-
26. แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System	ผบป. กมป.	200.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนไมเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน	ผบป. กมต.	4.449	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ	ผสค. กบช.	48.674	14.341	8.013	5.903	73.7	(2.110)	41.2	0.500	2.170	434.0	1.670	-
29. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยังไม่มีระบบสื่อสาร	ผสค. กอบ.	136.974	79.642	79.642	16.615	20.9	(63.027)	20.9	-	4.197	-	4.197	-
30. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คทท.1 (กฟท.1, กฟท.2, กฟท.3)	ผสค. กอบ.	82.620	79.235	0.400	45.390	11,347.5	44.990	57.3	0.050	0.089	178.0	0.039	-
31. แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference	ผสค. กอบ.	55.261	45.268	45.268	45.236	99.9	(0.032)	99.9	-	-	-	-	-
32. แผนงานจัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอร์	ผวส. กบท. 12 เขตดำเนินการ	32.882	28.473	12.416	1.249	10.1	(11.167)	4.4	2.410	-	-	(2.410)	-
33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสาร (เซลลูลาร์โมเด็ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)	ผคท. กคค.	3.482	3.482	3.482	2.393	68.7	(1.089)	68.7	0.295	0.014	4.7	(0.281)	-



แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
34. แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1	ฝคฟ. กอศ.	71.716	69.716	46.619	4.919	10.6	(41.700)	7.1	8.369	0.293	3.5	(8.076)
35. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย คอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2	ฝคฟ. กอศ.	225.305	22.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564	รผก.(อ) กนก.	420.190	50.248	35.111	39.816	113.4	4.705	79.2	3.992	4.633	116.1	0.641
37. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กแม่เทียน และโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กแม่ยะ ของ กฟภ.	ฝผผ. กคบ.	32.239	31.144	25.187	15.726	62.4	(9.461)	50.5	1.373	0.028	2.0	(1.345)
38. แผนการจัดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ของ กฟภ. ระยะที่ 1	ฝพท. กสส.	1,597.318	589.349	479.383	479.383	100.0	-	81.3	54.507	54.507	100.0	-
39. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3	ฝคฟ. กอศ.	323.584	32.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2	ฝคฟ. กอศ.	25.500	25.500	5.500	5.500	100.0	-	21.6	-	-	-	-
41. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	ฝคฟ. ศสฟ.	1,065.162	104.800	104.800	-	-	(104.800)	-	104.800	-	-	(104.800)
42. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2	ฝสค. กอบ.	42.381	35.440	17.820	35.263	197.9	17.443	99.5	0.050	0.009	18.0	(0.041)
43. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	ฝสท. กอศ.	388.200	122.490	90.454	-	-	(90.454)	-	32.035	-	-	(32.035)
44. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝบร. กบส.	225.290	94.359	78.679	5.929	7.5	(72.750)	6.3	72.750	-	-	(72.750)
45. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝบร. กบส.	145.117	77.117	32.507	-	-	(32.507)	-	32.507	-	-	(32.507)
46. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้า พลังงานขนาดเล็กแม่เฒะ ของ กฟภ.	ฝผผ. กคบ.	49.484	31.781	14.600	1.058	7.2	(13.542)	3.3	6.040	-	-	(6.040)
47. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สิน ระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	ฝบร. กบร.	888.527	300.000	75.000	12.091	16.1	(62.909)	4.0	45.000	-	-	(45.000)
48. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565	รผก.(อ) กนก.	611.764	50.266	38.650	53.794	139.2	15.144	107.0	5.738	5.625	98.0	(0.113)
49. แผนงานจัดหามอเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2	ฝมป. กมต.	977.412	537.417	335.053	325.292	97.1	(9.761)	60.5	73.201	58.691	80.2	(14.510)
50. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4												
50.1 งานที่ดิน	รผก.(วค) รผก.(ภ1-ภ4) ฝยธ.	241.630	50.000	-	31.889	-	31.889	63.8	-	31.889	-	31.889
50.2 งานสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วค) รผก.(ภ1-ภ4) ฝยธ.	1,962.591	428.285	173.722	67.757	39.0	(105.965)	15.8	97.214	13.314	13.7	(83.900)
	ฝกร.											
50.3 งานยานพาหนะ	รผก.(วค) ฝจท.	2,543.403	303.650	39.478	74.932	189.8	35.454	24.7	-	35.454	-	35.454
50.4 งานเครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วค) ฝจท. เขต	617.225	232.140	-	83.620	-	83.620	36.0	-	15.427	-	15.427
50.5 สำรองค่าปรับราคา		73.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		5,438.018	1,014.075	213.200	258.198	121.1	44.998	25.5	97.214	96.084	98.8	(1.130)
51. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโถงค้ำพวย ทาวเวอร์ (ปี 2560-2562)	ฝยธ. กจก.	240.364	169.830	114.750	62.881	54.8	(51.869)	37.0	18.360	6.694	36.5	(11.666)
52. แผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network ( MPLS Router) ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ฝสค. กอบ.	992.859	607.928	466.232	361.576	77.6	(104.656)	59.5	35.147	65.933	187.6	30.786
53. แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ	ฝพท. 12 เขตดำเนินการ	351.233	257.235	208.271	82.515	39.6	(125.756)	32.1	17.980	43.750	243.3	25.770
54. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	ฝคฟ.	323.733	176.130	87.066	71.113	81.7	(15.953)	40.4	33.090	9.205	27.8	(23.885)
55. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและ สายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ฝบร. กบร.	2,916.916	1,129.826	653.826	779.728	119.3	125.902	69.0	240.000	145.721	60.7	(94.279)
56. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	รผก.(ป) ศสฟ. (รท.สฟ.) 12 เขตดำเนินการ	627.578	549.296	347.708	64.365	18.5	(283.343)	11.7	120.911	13.814	11.4	(107.097)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
57. แผนงานเข้าเครื่องชนิดดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	ผบ. กคบ. กบข.(ค.2)	74.743	12.584	5.261	10.967	208.5	5.706	87.2	2.441	1.729	70.8	(0.712)
58. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	รผก.(อ) กนท.	598.122	29.458	16.612	8.354	50.3	(8.258)	28.4	6.219	4.499	72.3	(1.720)
59. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ผทบ. ศฝฟ.	620.000	63.732	-	46.000	-	46.000	72.2	-	46.000	-	46.000
60. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	ผปร. กบส. 12 เขตดำเนินการ	316.340	126.380	101.600	-	-	(101.600)	-	101.600	-	-	(101.600)
61. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV	ผคฟ. กอด.	115.964	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ผสค. กอบ.	254.800	127.400	25.480	-	-	(25.480)	-	-	-	-	-
63. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3)	ผสค. กอบ.	509.660	50.966	50.966	-	-	(50.966)	-	50.966	-	-	(50.966)
64. แผนงานขยายโครงข่าย IP Network	ผสค. กอบ.	108.000	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม	ผสค. กอบ.	288.000	115.200	28.800	-	-	(28.800)	-	-	-	-	-
66. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต	ผปร. กอร.	109.604	9.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานระยะยาว		37,494.790	8,987.306	5,625.277	4,205.311	74.8	(1,419.966)	46.8	1,699.214	790.813	46.5	(908.401)
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		55,422.039	16,344.964	10,058.737	8,240.703	81.9	(1,818.034)	50.4	2,280.942	1,353.816	59.4	(927.126)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ว่าเป็นโครงการ</b>												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	อฝ.บก. 1	98.179	16.986	12.680	10.101	79.7	(2.579)	59.5	0.020	0.203	1,015.0	0.183
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	อฝ.บก. 2	44.122	9.597	9.597	5.746	59.9	(3.851)	59.9	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	อฝ.บก. 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	-	-	-
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	อฝ.บก. 2	407.374	155.000	155.000	338.355	218.3	183.355	218.3	-	105.304	-	105.304
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	อฝ.บก. 2	918.164	360.000	271.785	337.838	124.3	66.053	93.8	0.500	79.954	15,990.8	79.454
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	อฝ.บก. 1	284.511	155.000	48.790	131.066	268.6	82.276	84.6	15.060	44.689	296.7	29.629
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	ผชก.(ป)	287.270	39.664	38.064	28.617	75.2	(9.447)	72.1	3.093	7.399	239.2	4.306
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	อฝ.บก. 2	32.377	8.000	3.000	6.668	222.3	3.668	83.4	2.000	3.934	196.7	1.934
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	ผชก.(กบ)	221.291	15.200	0.125	-	-	(0.125)	-	0.025	-	-	(0.025)
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	อฝ.บก. 2	142.046	60.000	45.000	40.446	89.9	(4.554)	67.4	6.175	-	-	(6.175)
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	ผชก.(กบ)	116.012	79.757	71.251	77.816	109.2	6.565	97.6	27.679	15.433	55.8	(12.246)
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	อฝ.บก. 1	2,079.897	885.000	552.545	1,229.000	222.4	676.455	138.9	85.102	198.962	233.8	113.860
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	อฝ.บก. 2	1,661.498	230.000	159.982	248.605	155.4	88.623	108.1	13.888	35.635	256.6	21.747
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ผชก.(กบ)	4,028.665	1,600.000	732.626	1,862.377	254.2	1,129.751	116.4	109.870	77.191	70.3	(32.679)
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	อฝ.บก. 1	960.164	340.000	213.530	250.782	117.4	37.252	73.8	4.477	11.518	257.3	7.041
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	ผชก.(กบ)	5,335.088	1,150.000	750.000	989.768	132.0	239.768	86.1	147.698	149.168	101.0	1.470
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	ผชก.(กบ)	30.121	0.900	0.100	3.414	3,414.0	3.314	379.3	-	0.134	-	0.134
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	ผชก.(กบ)	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	-	-	-	-
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	รผก.(ว) กคก.	357.460	102.000	83.394	92.920	111.4	9.526	91.1	7.271	15.725	216.3	8.454
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ - รผก.(ป) - รผก.(ทส)	รผก.(ป) ผคฟ. ฝสท., ฝสค., กอส., กอบ., กบข.	2,830.777 886.084	434.631 358.156	242.626 355.040	4.466 265.471	1.8 74.8	(238.160) (89.569)	1.0 74.1	12.116 0.738	0.245 56.924	2.0 7,713.3	(11.871) 56.186
<b>รวม</b>		<b>3,716.861</b>	<b>792.787</b>	<b>597.666</b>	<b>269.937</b>	<b>45.2</b>	<b>(327.729)</b>	<b>34.0</b>	<b>12.854</b>	<b>57.169</b>	<b>444.8</b>	<b>44.315</b>
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	รผก.(ว) กผอ.	1,058.109	265.949	245.070	84.830	34.6	(160.240)	31.9	98.783	66.832	67.7	(31.951)
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟผ.	รผก.(ว) กคก.	276.923	117.738	96.632	92.141	95.4	(4.491)	78.3	9.253	18.437	199.3	9.184
23. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	อฝ.คพ.	807.895	6.411	5.495	4.887	88.9	(0.608)	76.2	-	-	-	-
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	รผก.(ว) กคก.	739.700	452.000	329.057	299.046	90.9	(30.011)	66.2	29.362	60.400	205.7	31.038
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)	อฝ.บก. 1	1,628.834	250.000	166.700	233.712	140.2	67.012	93.5	45.750	3.088	6.7	(42.662)
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	รผก.(กบ)	19,181.874	8,000.000	5,400.000	5,466.025	101.2	66.025	68.3	850.000	1,250.685	147.1	400.685
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	รผก.(ว) กผอ.	259.530	98.681	57.450	7.733	13.5	(49.717)	7.8	29.641	4.206	14.2	(25.435)
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ผชก.(กบ)	5,005.741	728.000	400.753	212.708	53.1	(188.045)	29.2	29.860	46.921	157.1	17.061
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)	อฝ.บก.1	954.858	180.000	106.024	35.036	33.0	(70.988)	19.5	29.650	7.232	24.4	(22.418)
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	กคก.	1,578.000	-	-	10.383	-	10.383	-	-	10.312	-	10.312
<b>รวมงานโครงการ</b>		<b>52,353.524</b>	<b>16,100.601</b>	<b>10,554.247</b>	<b>12,372.281</b>	<b>117.2</b>	<b>1,818.034</b>	<b>76.8</b>	<b>1,558.011</b>	<b>2,270.531</b>	<b>145.7</b>	<b>712.520</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>107,775.563</b>	<b>32,445.565</b>	<b>20,612.984</b>	<b>20,612.984</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>63.5</b>	<b>3,838.953</b>	<b>3,624.347</b>	<b>94.4</b>	<b>(214.606)</b>
