



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	<u>15.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>39,018.870</u></u>	ลบ.

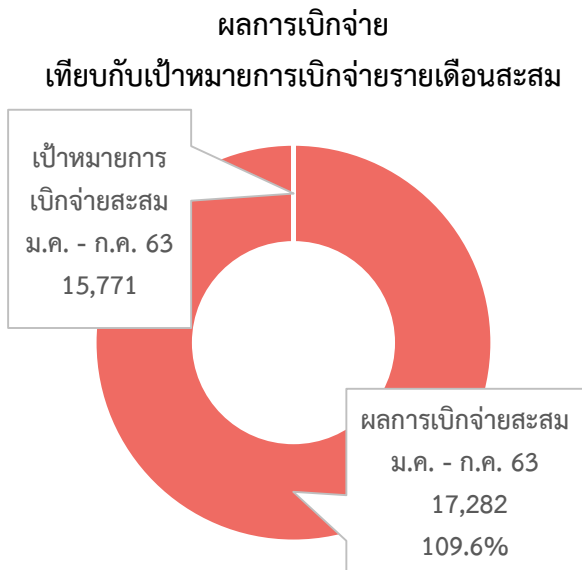


- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ค. 63
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ค. 63

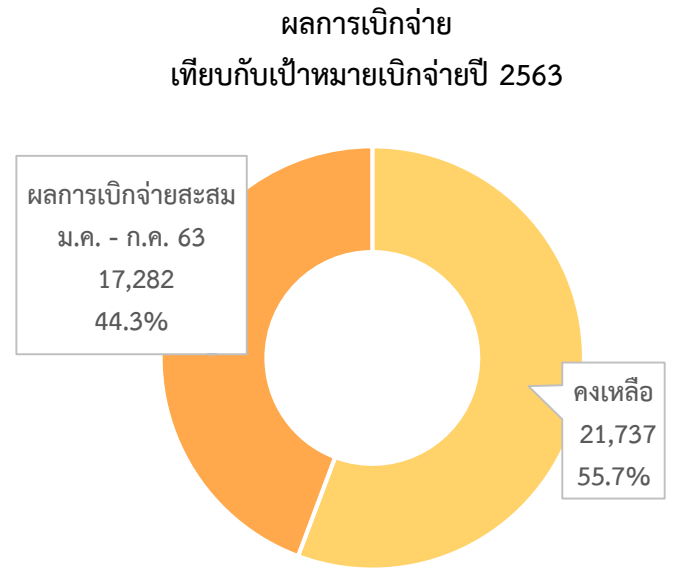

- คงเหลือ
- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ค. 63

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563

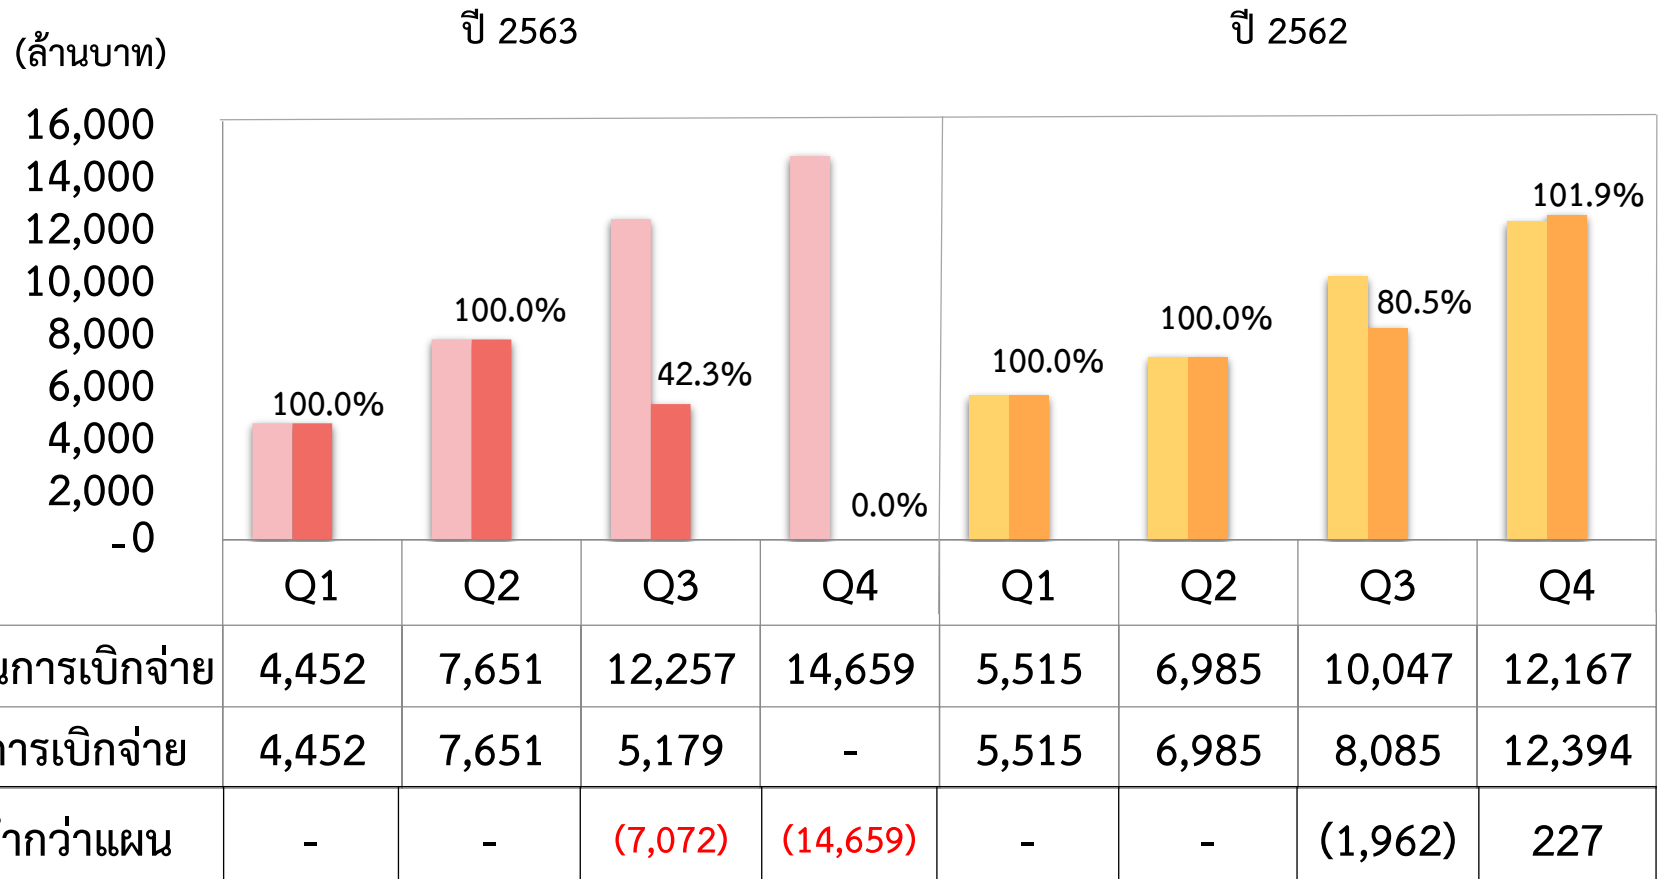

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กรกฎาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	8,217.078	8,280.847	100.8	39.9
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	7,553.659	9,001.027	119.2	49.2
- รายปี	7,772.755	2,818.803	3,756.050	133.2	48.3
- ระยะยาว	10,505.623	4,734.856	5,244.977	110.8	49.9
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	15,770.737	17,281.874	109.6	44.3

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กรกฎาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	27.700	103.681	374.3	69.1
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	96.474	85.710	101.721	118.7	105.4
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	8.238	77.3	77.3
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	54.739	87.940	160.7	42.9
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	82.276	179.263	217.9	44.8
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	277.707	407.906	146.9	37.8
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	127.693	98.064	76.8	26.6
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	617.086	226.849	36.8	17.7
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	3.854	140.1	140.1
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	42.649	179.737	421.4	26.1
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	350.719	19.306	5.5	3.5
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	4.525	4.525	17.379	384.1	384.1
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	15.670	2.670	2.740	102.6	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	161.200	247.980	153.8	80.0
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	170.000	105.905	131.253	123.9	77.2

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กรกฎาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (ต่อ)</b>					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	4,967.000	4,825.293	97.1	38.1
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	39.125	52.3	52.3
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	594.130	757.633	127.5	69.5
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	97.593	237.809	243.7	95.1
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	352.524	583.017	165.4	53.0
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	205.551	177.000	20.994	11.9	10.2
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	-	-	-	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	-	0.167	-	0.8
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	-	0.898	-	6.0
<b>รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>	<b>20,740.492</b>	<b>8,217.078</b>	<b>8,280.847</b>	<b>100.8</b>	<b>39.9</b>
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	2,818.803	3,756.050	133.2	48.3
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	10,505.623	4,734.856	5,244.977	110.8	49.9
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>18,278.378</b>	<b>7,553.659</b>	<b>9,001.027</b>	<b>119.2</b>	<b>49.2</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,018.870</b>	<b>15,770.737</b>	<b>17,281.874</b>	<b>109.6</b>	<b>44.3</b>

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563
