
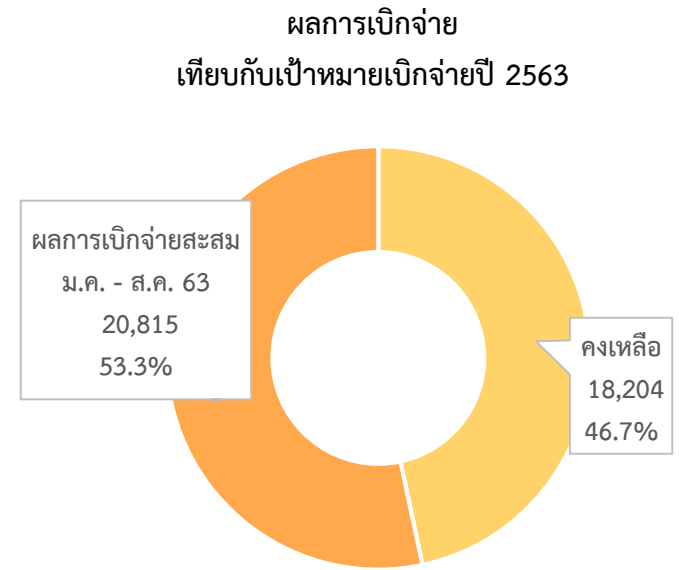



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	<u>15.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>39,018.870</u></u>	ลบ.

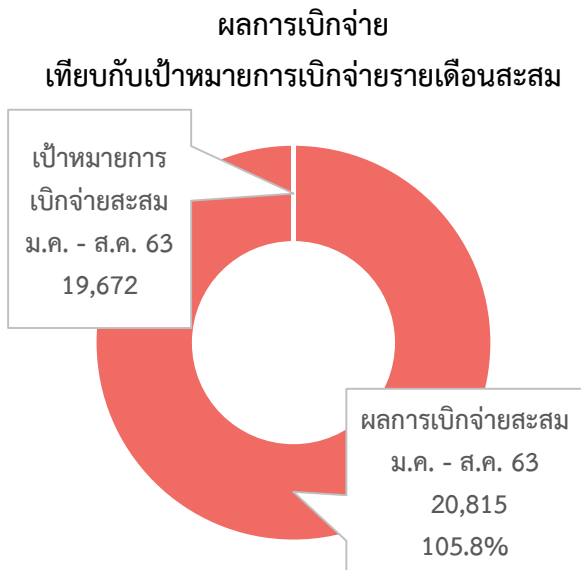

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ส.ค. 63
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ส.ค. 63

- คงเหลือ
- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ส.ค. 63

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

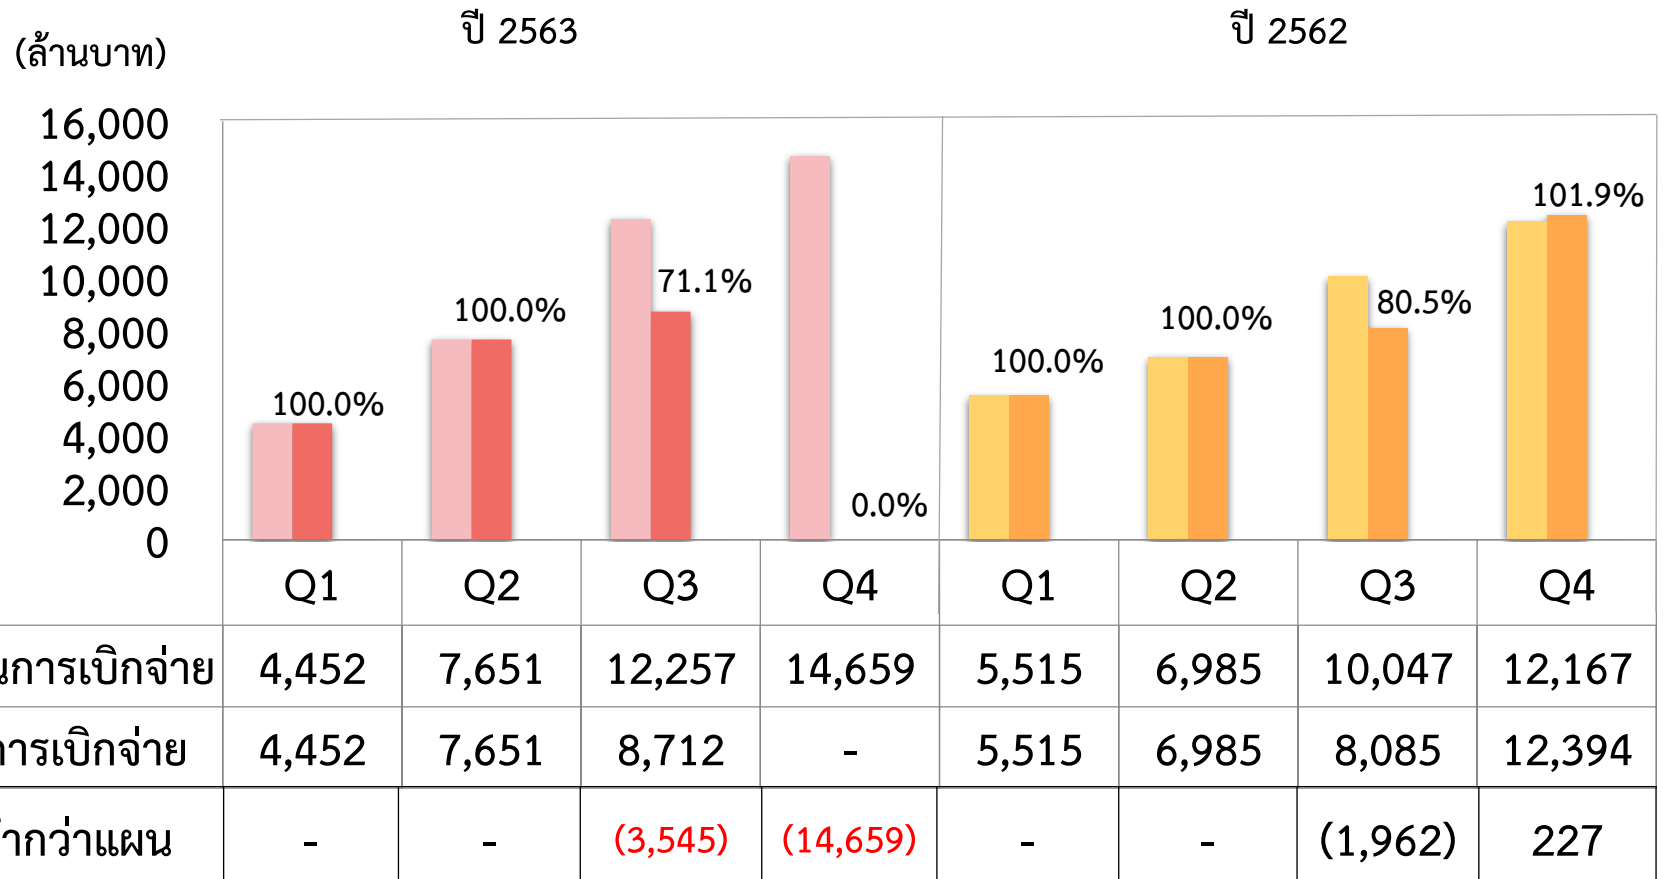

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - สิงหาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	20,740.492	10,605.208	10,110.770	95.3	48.7
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	9,066.494	10,704.212	118.1	58.6
- รายปี	7,772.755	3,497.855	4,700.862	134.4	60.5
- ระยะยาว	10,505.623	5,568.639	6,003.350	107.8	57.1
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	19,671.702	20,814.982	105.8	53.3

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - สิงหาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	27.900	104.343	374.0	69.6
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	96.474	85.710	101.797	118.8	105.5
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	9.616	90.2	90.2
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	70.904	96.777	136.5	47.2
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	97.328	215.532	221.4	53.9
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	430.983	491.223	114.0	45.5
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	131.693	114.652	87.1	31.1
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	737.424	286.176	38.8	22.3
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	4.397	159.8	159.8
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	269.444	216.928	80.5	31.5
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	414.976	50.385	12.1	9.1
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	4.525	4.525	19.683	435.0	435.0
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	15.670	2.670	2.740	102.6	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	192.200	304.150	158.2	98.1
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	170.000	125.358	145.511	116.1	85.6

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - สิงหาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (ต่อ)</b>					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	6,408.000	5,886.311	91.9	46.4
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	39.998	53.4	53.4
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	700.567	872.703	124.6	80.1
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	108.743	311.810	286.7	124.7
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	520.603	799.423	153.6	72.7
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	205.551	187.928	21.035	11.2	10.2
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	-	4.250	-	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	-	0.235	-	1.1
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	-	11.095	-	74.0
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>	<b>20,740.492</b>	<b>10,605.208</b>	<b>10,110.770</b>	<b>95.3</b>	<b>48.7</b>
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	3,497.855	4,700.862	134.4	60.5
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,505.623	5,568.639	6,003.350	107.8	57.1
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>18,278.378</b>	<b>9,066.494</b>	<b>10,704.212</b>	<b>118.1</b>	<b>58.6</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,018.870</b>	<b>19,671.702</b>	<b>20,814.982</b>	<b>105.8</b>	<b>53.3</b>

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563
