



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	<u>15.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>39,018.870</u></u>	ลบ.

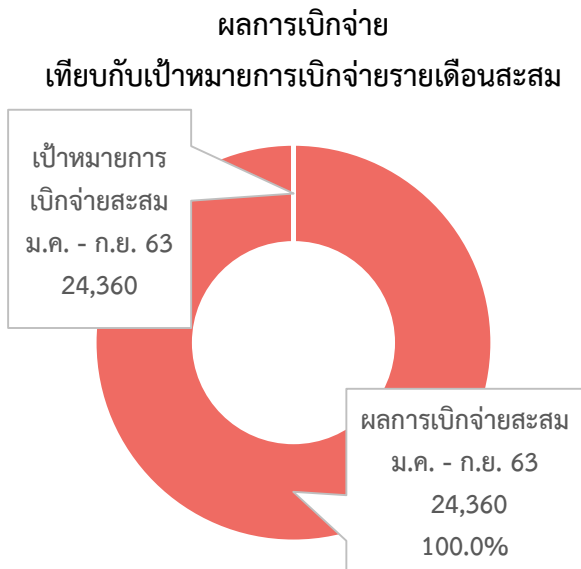

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63

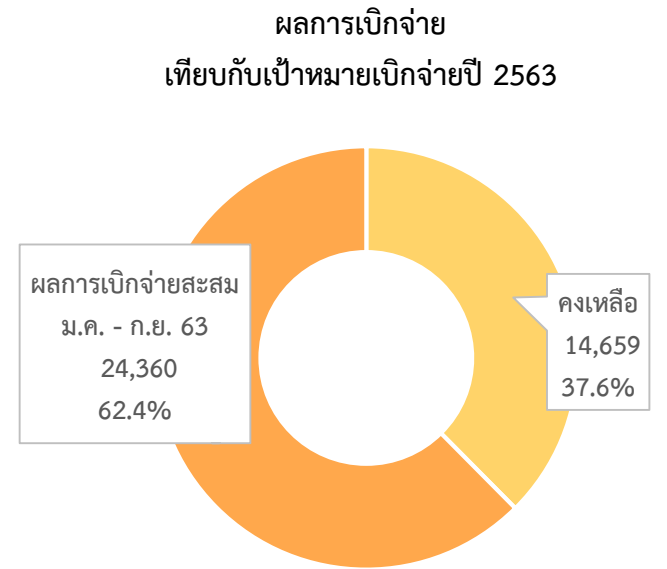

- คงเหลือ
- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63

หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กันยายน 2563			%จ่ายจริง เทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	12,842.992	12,200.265	95.0	58.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	11,516.923	12,159.930	105.6	66.5
- รายปี	7,772.755	4,835.633	5,434.797	112.4	69.9
- ระยะยาว	10,505.623	6,681.290	6,725.133	100.7	64.0
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	24,359.915	24,360.195	100.0	62.4

หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กันยายน 2563		%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน	
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน		%
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	56.800	131.846	232.1	87.9
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	96.474	85.710	101.846	118.8	105.6
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	9.616	90.2	90.2
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	117.079	130.750	111.7	63.8
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	148.000	216.614	146.4	54.2
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	491.458	623.548	126.9	57.7
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	162.693	147.471	90.6	40.0
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	868.980	366.600	42.2	28.6
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	4.397	159.8	159.8
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	319.507	242.751	76.0	35.3
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	466.808	51.881	11.1	9.3
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	4.525	4.525	20.756	458.7	458.7
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	15.670	2.670	2.740	102.6	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	220.100	378.319	171.9	122.0
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)	170.000	148.583	180.275	121.3	106.0

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - กันยายน 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (ต่อ)					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	7,783.000	7,158.339	92.0	56.5
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	40.127	53.6	53.6
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	807.358	1,051.333	130.2	96.5
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	175.033	357.796	204.4	143.1
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	707.308	919.040	129.9	83.5
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	205.551	187.928	21.061	11.2	10.2
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	-	4.250	-	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะป็นทียี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	-	0.272	-	1.3
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	1.200	38.637	3,219.8	257.6
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสท.)	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	20,740.492	12,842.992	12,200.265	95.0	58.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	4,835.633	5,434.797	112.4	-
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	10,505.623	6,681.290	6,725.133	100.7	64.0
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	11,516.923	12,159.930	105.6	66.5
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	24,359.915	24,360.195	100.0	62.4

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
