


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	<u>15.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>39,018.870</u></u>	ลบ.

ผลการเบิกจ่าย  
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2563

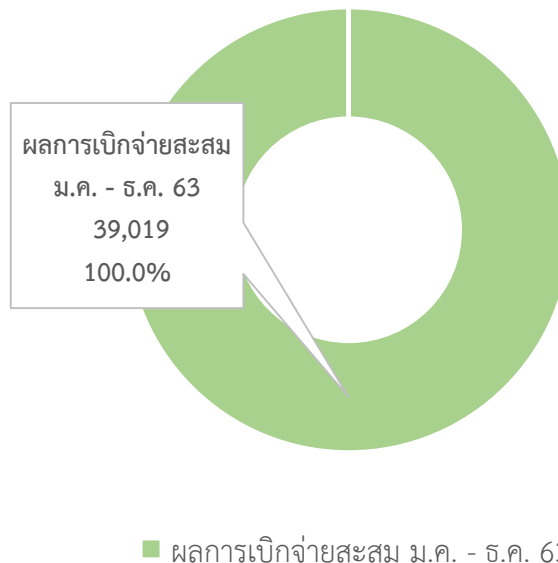


หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

16,000  
14,000  
12,000  
10,000  
8,000  
6,000  
4,000  
2,000  
0

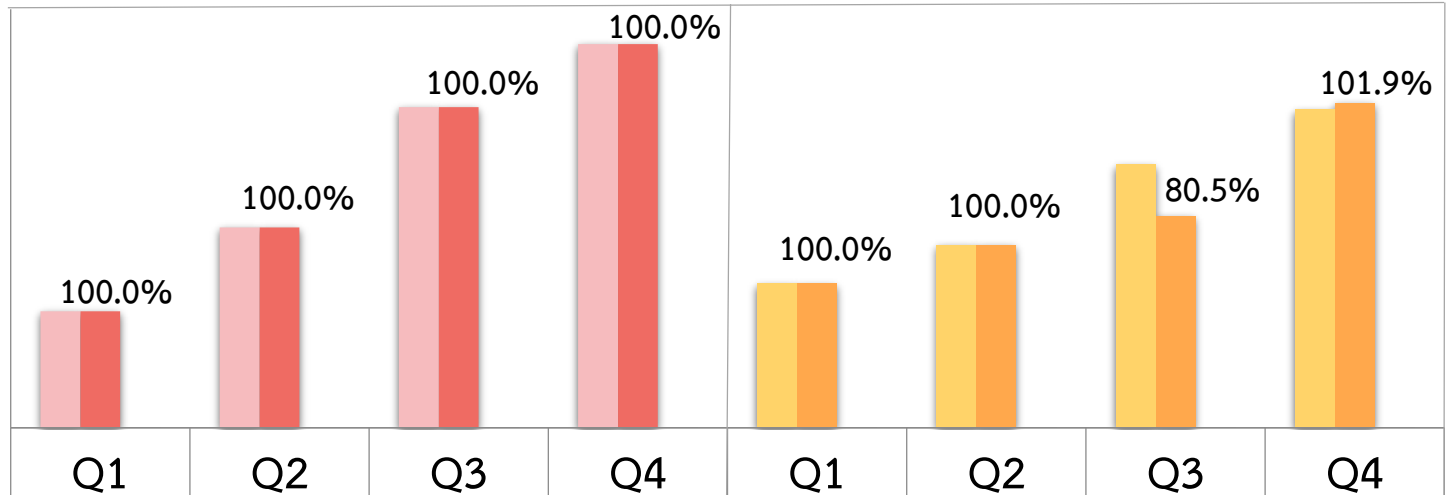

■ แผนการเบิกจ่าย	4,452	7,651	12,257	14,659	5,515	6,985	10,047	12,167
■ ผลการเบิกจ่าย	4,452	7,651	12,257	14,659	5,515	6,985	8,085	12,394
สูง/ต่ำกว่าแผน	-	-	-	-	-	-	(1,962)	227

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ธันวาคม 2563			%จ่ายจริง เทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	20,740.492	19,671.787	94.8	94.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	18,278.378	19,347.083	105.8	105.8
- รายปี	7,772.755	7,772.755	8,332.279	107.2	107.2
- ระยะยาว	10,505.623	10,505.623	11,014.804	104.8	104.8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,018.870</b>	<b>39,018.870</b>	<b>39,018.870</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ธันวาคม 2563			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	150.000	156.813	104.5	104.5
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	96.474	96.474	110.031	114.1	114.1
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	9.616	90.2	90.2
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	205.000	288.772	140.9	140.9
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	400.000	387.168	96.8	96.8
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	1,080.000	1,077.518	99.8	99.8
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	368.708	259.717	70.4	70.4
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	1,281.238	601.489	46.9	46.9
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	4.397	159.8	159.8
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	479.537	490.238	102.2	71.2
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	555.737	323.793	58.3	58.3
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟผ.	4.525	4.525	20.756	458.7	458.7
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	15.670	15.670	2.740	17.5	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	310.000	496.395	160.1	160.1
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	170.000	170.000	208.373	122.6	122.6

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ธันวาคม 2563			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (ต่อ)</b>					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	12,672.770	11,938.959	94.2	94.2
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	64.519	86.2	86.2
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	1,089.630	1,369.565	125.7	125.7
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	250.000	475.059	190.0	190.0
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	1,100.000	1,180.584	107.3	107.3
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	205.551	205.551	23.827	11.6	11.6
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	181.000	4.250	2.3	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	21.400	0.381	1.8	1.8
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	15.000	176.827	1,178.8	1,178.8
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>	<b>20,740.492</b>	<b>20,740.492</b>	<b>19,671.787</b>	<b>94.8</b>	<b>94.8</b>
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	7,772.755	8,332.279	107.2	107.2
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,505.623	10,505.623	11,014.804	104.8	104.8
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>18,278.378</b>	<b>18,278.378</b>	<b>19,347.083</b>	<b>105.8</b>	<b>105.8</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,018.870</b>	<b>39,018.870</b>	<b>39,018.870</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
