

# สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567

---

กองประเมินผลงบประมาณ

# งบลงทุนประจำปี 2567




ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 37,952.619 ลบ. \*

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม  
ม.ค.-มี.ค.

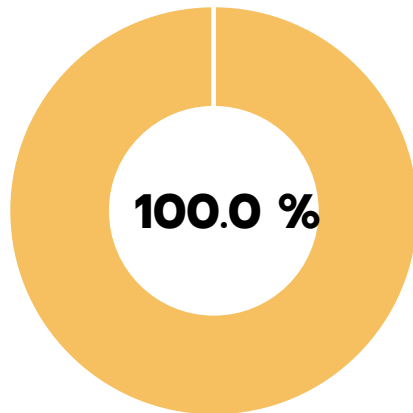

เป้า	4,532	ล้านบาท
จ่าย	4,532	ล้านบาท
คิดเป็น	100.0	%

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567




เป้า	37,953	ล้านบาท
จ่าย	4,532	ล้านบาท
คิดเป็น	11.9	%
คงเหลือ	33,421	ล้านบาท
หรือเท่ากับ	88.1	%

หมายเหตุ

\* มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ

# แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 และ 2565 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

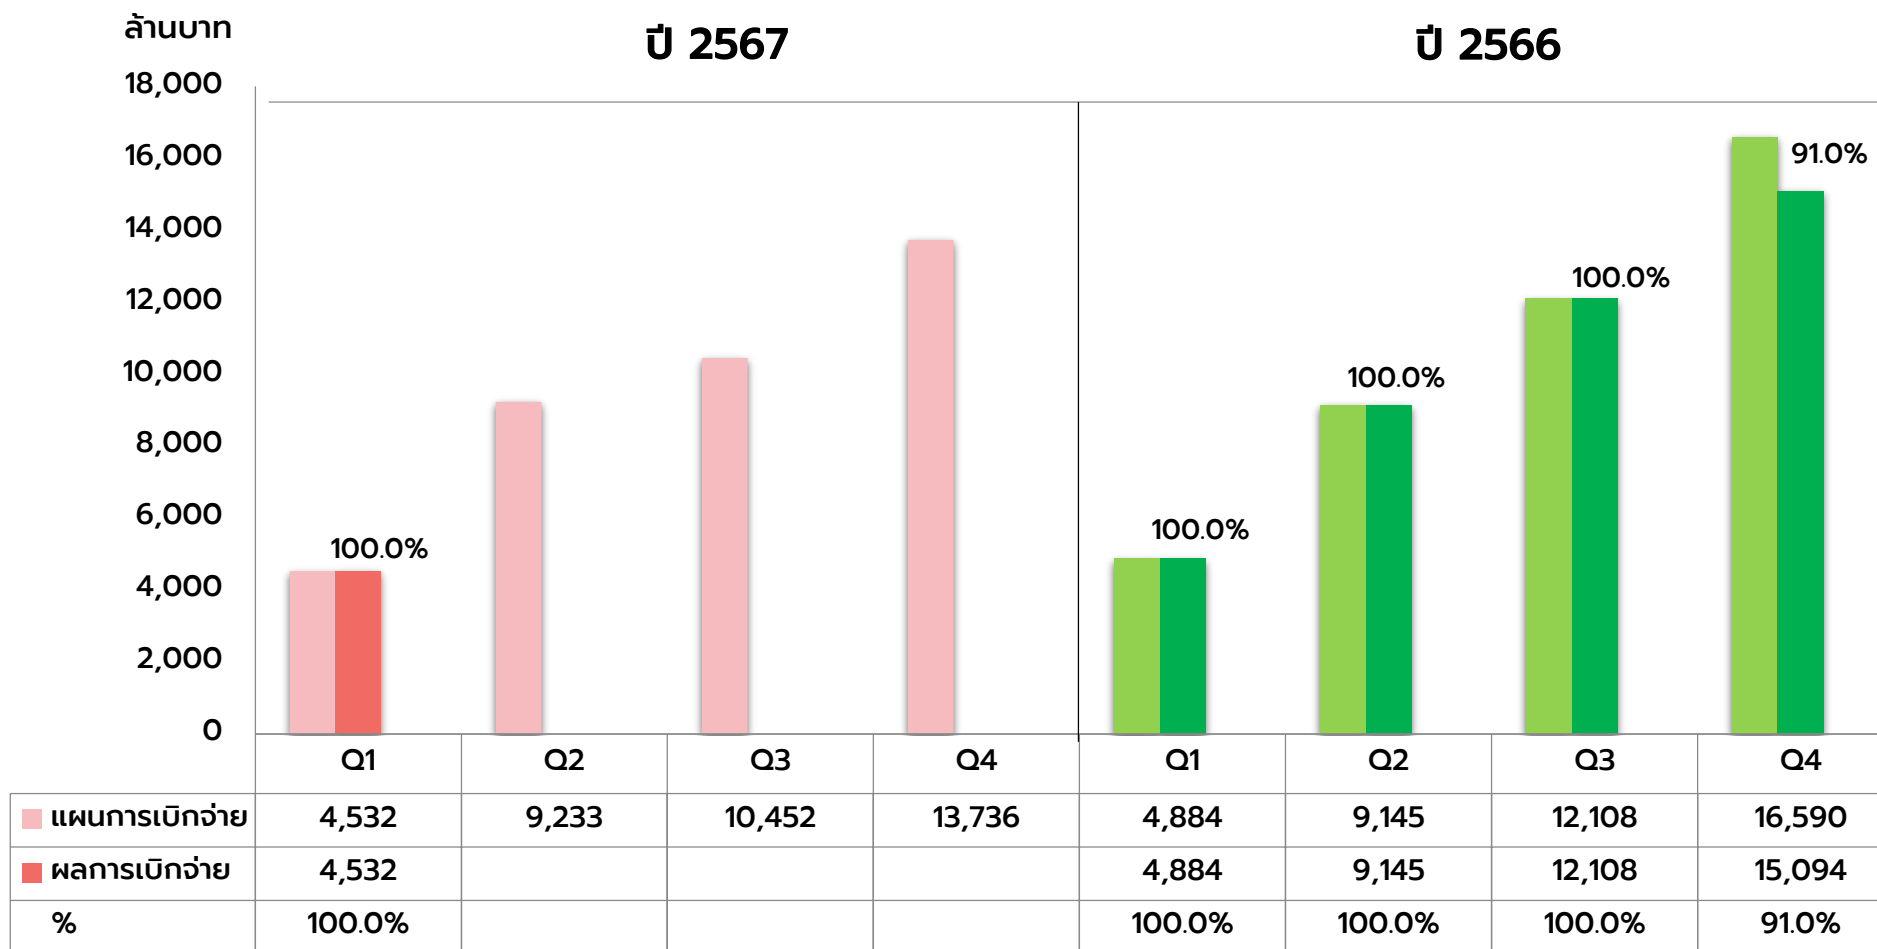

# การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2567

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มีนาคม 2567			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	12,993.790	1,711.571	1,722.336	100.6	13.3
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,816.970	2,804.385	2,773.570	98.9	11.2
- รายปี	11,757.839	1,068.015	1,122.038	105.1	9.5
- ระยะยาว	13,059.131	1,736.370	1,651.532	95.1	12.6
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	141.859	16.179	36.230	223.9	25.5
รวมทั้งสิ้น	37,952.619	4,532.135	4,532.136	100.0	11.9

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

# การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2567



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มีนาคม 2567			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	111.566	46.705	15.315	32.8	13.7
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	200.000	5.206	0.518	10.0	0.3
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	279.600	6.829	0.401	5.9	0.1
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	42.646	7.088	3.845	54.2	9.0
5. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,000.000	130.000	161.508	124.2	16.2
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	935.000	91.901	107.143	116.6	11.5
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	149.265	16.878	24.575	145.6	16.5
8. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	191.668	-	-	-	-
9. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	418.148	1.080	0.033	3.1	0.0
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	9,500.000	1,399.384	1,407.214	100.6	14.8
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	159.406	6.500	1.252	19.3	0.8
12. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	6.491	-	0.532	-	8.2
<b>รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>	<b>12,993.790</b>	<b>1,711.571</b>	<b>1,722.336</b>	<b>100.6</b>	<b>13.3</b>

# การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2567

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มีนาคม 2567			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,757.839	1,068.015	1,122.038	105.1	9.5
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	13,059.131	1,736.370	1,651.532	95.1	12.6
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,816.970	2,804.385	2,773.570	98.9	11.2
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	63.775	16.179	30.784	190.3	48.270
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	78.084	-	5.446	-	6.975
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	141.859	16.179	36.230	223.9	25.5
รวมทั้งสิ้น	37,952.619	4,532.135	4,532.136	100.0	11.9
