


ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	43,984.640	ลบ. (มติ ครม. 29 กันยายน 2563)
ปรับเพิ่ม	1,286.000	ลบ. (สชช. เห็นชอบ 30 เมษายน 2564)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u>45,270.640</u>	ลบ.

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

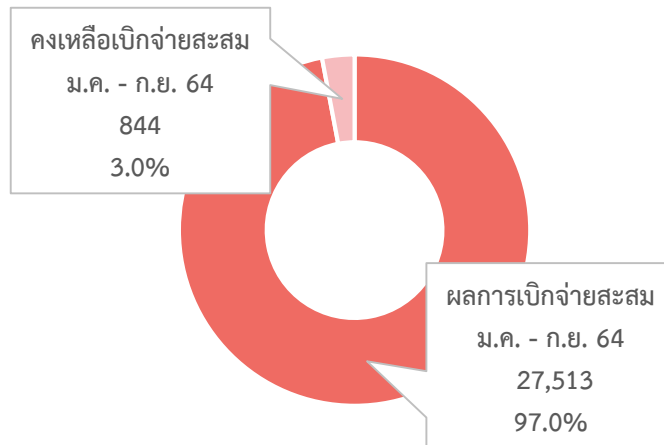

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 64
- คงเหลือเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 64

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564

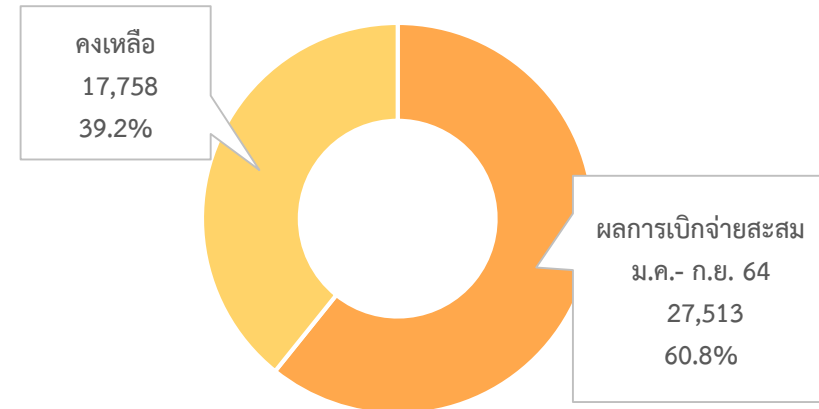

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 64
- คงเหลือ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564


หน่วย : ล้านบาท

(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

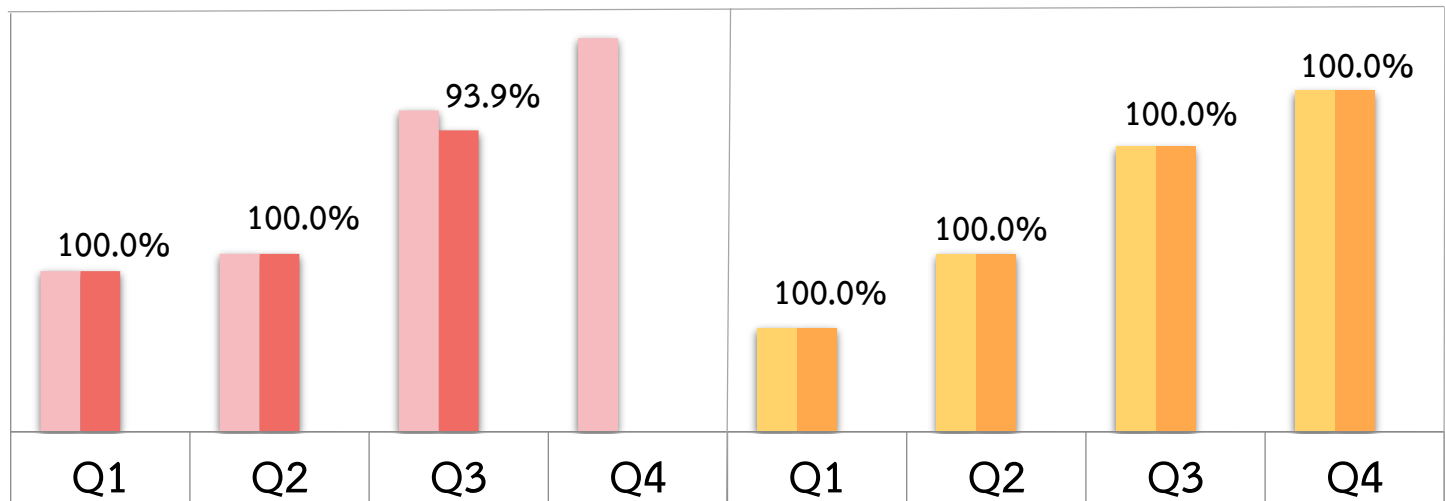

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
แผนการเบิกจ่าย	6,902	7,647	13,808	16,914	4,452	7,651	12,257	14,659
ผลการเบิกจ่าย	6,902	7,647	12,964	-	4,452	7,651	12,257	14,659
สูง/ต่ำกว่าแผน	-	-	(844)	-	-	-	-	-

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย	มกราคม - กันยายน 2564			%จ่ายจริงเทียบกับ กับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2564		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	22,111.506	14,168.393	13,916.423	98.2	62.9
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,159.134	14,188.453	13,596.658	95.8	58.7
- รายปี	11,026.005	6,739.358	7,145.506	106.0	64.8
- ระยะยาว	12,030.539	7,377.755	6,354.640	86.1	52.8
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	71.340	96.512	135.3	94.1
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	28,356.846	27,513.081	97.0	60.8

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - กันยายน 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	200.000	49.438	41.231	83.4	20.6
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	4.000	4.000	6.749	168.7	168.7
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	500.000	269.200	173.646	64.5	34.7
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	300.000	172.445	149.431	86.7	49.8
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,000.000	840.597	880.587	104.8	88.1
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	422.034	249.795	254.903	102.0	60.4
7. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	500.000	330.899	259.327	78.4	51.9
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	553.702	379.698	312.830	82.4	56.5
9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	252.150	242.150	253.132	104.5	100.4
10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	-	-	-	-	-
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	224.782	135.764	126.831	93.4	56.4
12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	58.000	40.471	88.761	219.3	153.0
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	10,000.000	6,476.054	5,593.897	86.4	55.9
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	19.700	18.407	12.902	70.1	65.5
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,620.000	1,173.516	1,153.341	98.3	71.2

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - กันยายน 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ					
16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	350.000	275.112	564.261	205.1	161.2
17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	750.000	647.472	1,030.840	159.2	137.4
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	0.007	-	-
19. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	180.575	180.575	-	-	-
20. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	199.503	18.933	14.211	75.1	7.1
21. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	4,800.000	2,649.867	2,998.499	113.2	62.5
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	160.060	-	-	-	-
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	17.000	14.000	1.037	7.4	6.1
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	22,111.506	14,168.393	13,916.423	98.2	62.9
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,026.005	6,739.358	7,145.506	106.0	64.8
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	12,030.539	7,377.755	6,354.640	86.1	52.8
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	71.340	96.512	135.3	94.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,159.134	14,188.453	13,596.658	95.8	58.7
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	28,356.846	27,513.081	97.0	60.8
