


งบลงทุนประจำปี 2565

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565


หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 46,037.830 ลบ. (มติ ครม. 21 กันยายน 2564)

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

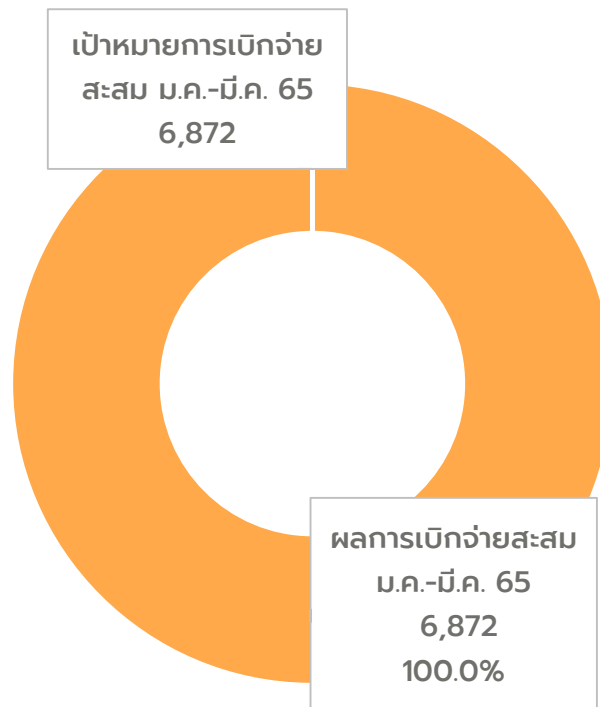


ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565

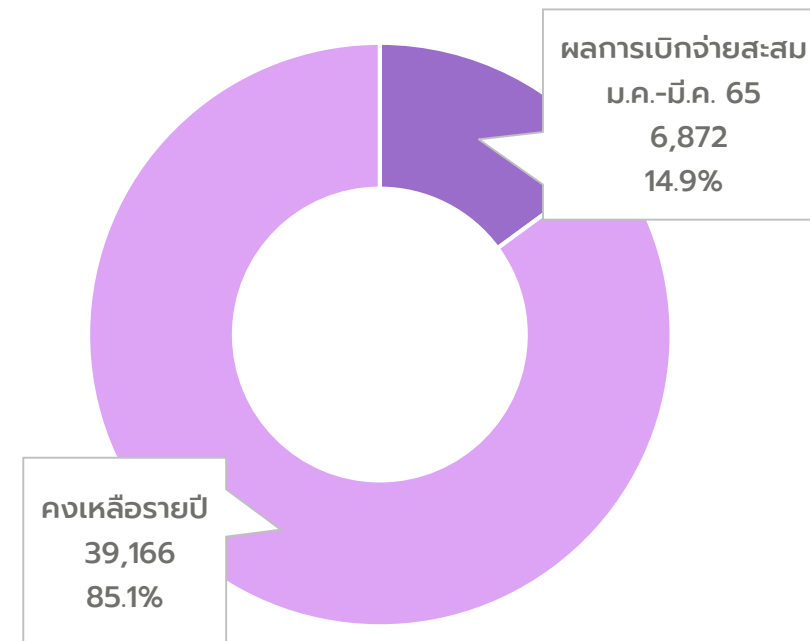

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

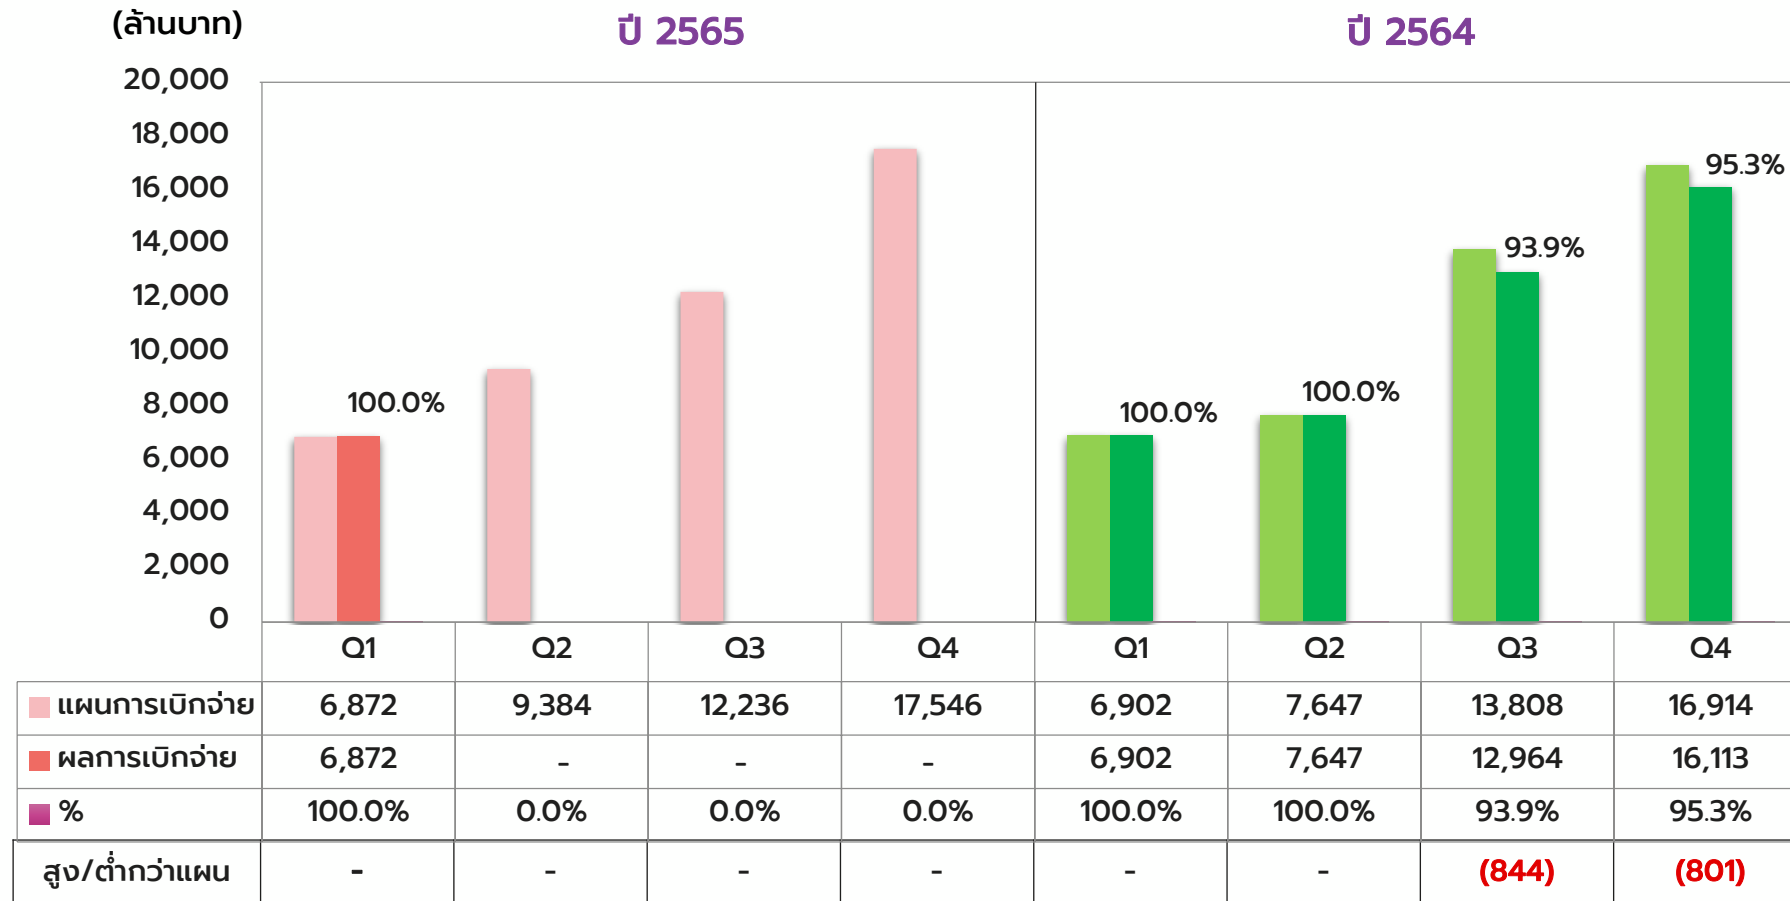

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.	มกราคม-มีนาคม 2565 (เทียบกับมติ ครม.)			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย
	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2565	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	18,077.006	2,684.985	3,456.835	128.7	19.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,960.824	4,187.167	3,415.344	81.6	12.2
- รายปี	12,503.153	2,835.141	1,795.182	63.3	14.4
- ระยะยาว	15,324.964	1,312.172	1,590.607	121.2	10.4
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	132.707	39.854	29.555	74.2	22.3
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	6,872.152	6,872.179	100.0	14.9

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.	มกราคม-มีนาคม 2565 (เทียบกับมติ ครม.)			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย
	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2565	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		กับเป้าหมาย 12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	100.000	0.500	27.947	5,589.4	27.9
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	300.000	52.678	86.109	163.5	28.7
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	450.000	81.164	42.985	53.0	9.6
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,200.000	175.234	171.356	97.8	14.3
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	277.285	54.344	28.203	51.9	10.2
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	33.996	17.823	10.362	58.1	30.5
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	486.638	7.988	78.822	986.8	16.2
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	90.000	-	0.036	-	0.0
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	-	-	-	-	-
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	89.000	14.360	12.644	88.1	14.2
11. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	6,500.000	822.010	1,113.475	135.5	17.1
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	-	-	-	-	-
13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,160.000	362.107	115.295	31.8	9.9
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	400.000	62.139	51.367	82.7	12.8

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.	มกราคม-มีนาคม 2565 (เทียบกับมติ ครม.)			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย
	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2565	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		กับเป้าหมาย 12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	700.000	53.041	264.176	498.1	37.7
16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เครี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	172.000	-	-	-	-
17. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	139.301	-	-	-	-
18. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	17.506	17.506	0.850	4.9	4.9
19. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,000.000	926.311	1,453.208	156.9	29.1
20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	851.280	11.060	-	-	-
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	110.000	26.720	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	18,077.006	2,684.985	3,456.835	128.7	17.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	12,503.153	2,835.141	1,795.182	63.3	14.4
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	15,324.964	1,312.172	1,590.607	121.2	10.4
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	132.707	39.854	29.555	74.2	22.3
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,960.824	4,187.167	3,415.344	81.6	13.3
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	6,872.152	6,872.179	100.0	14.9
