


งบลงทุนประจำปี 2565

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565


หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม




ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565

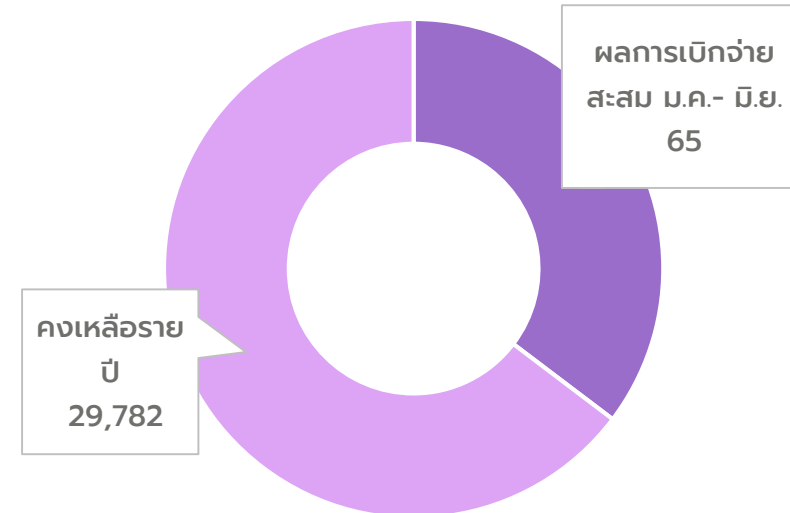

* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

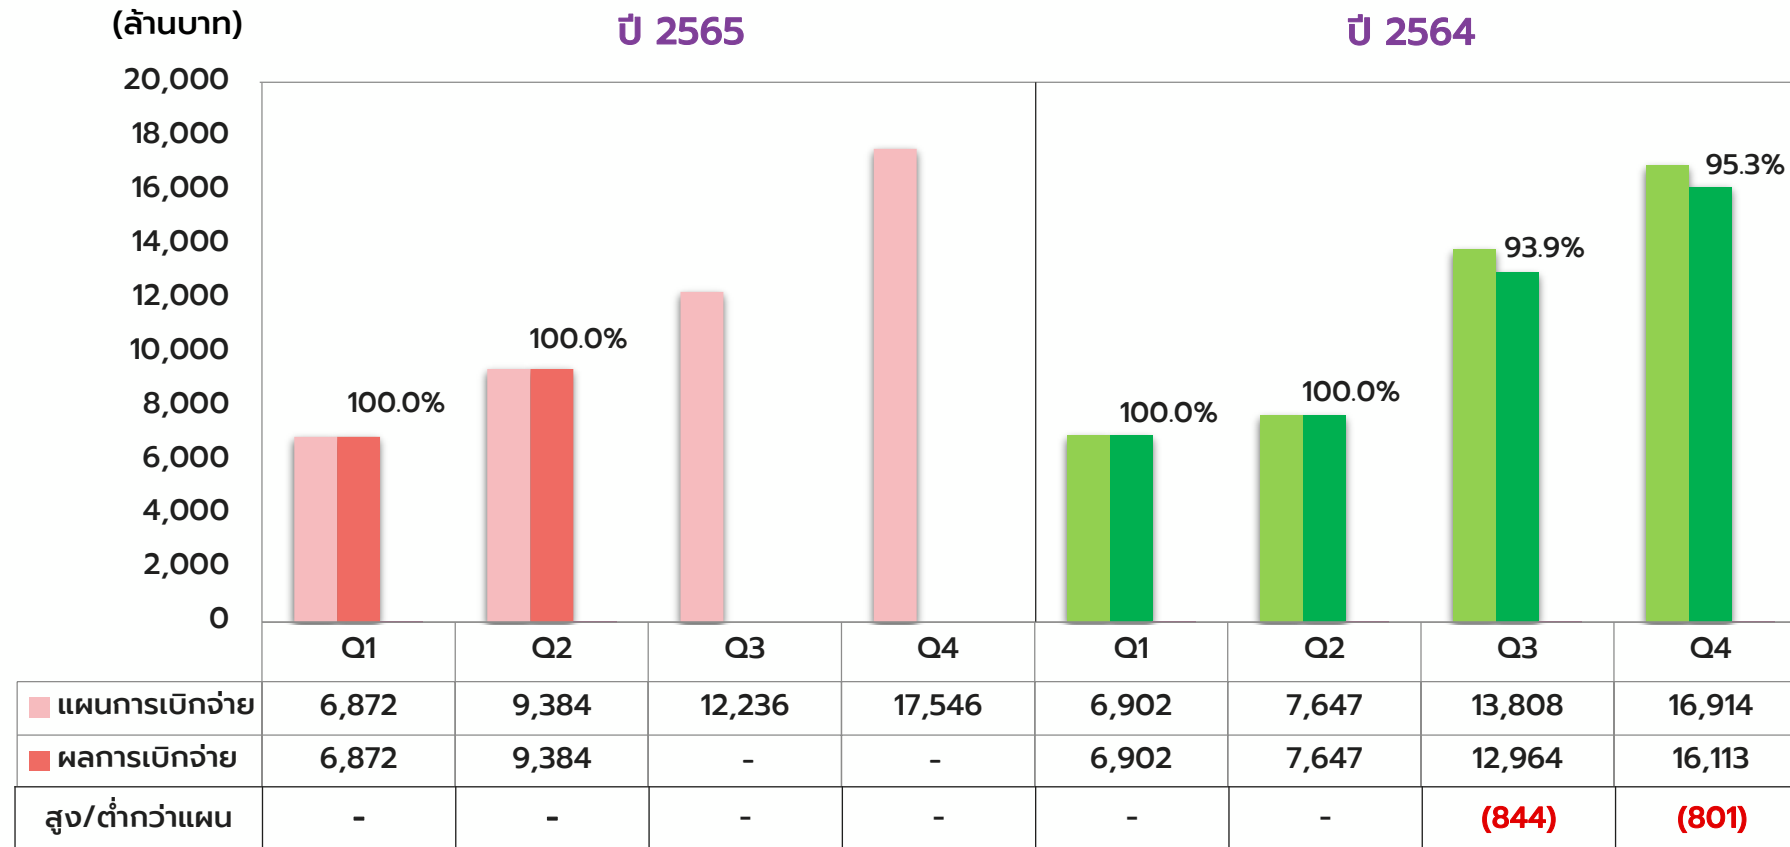

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-มิถุนายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับ กับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	40.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	9,208.743	8,125.702	88.2	31.6
- รายปี	12,253.162	4,537.949	4,042.759	89.1	33.0
- ระยะยาว	13,390.199	4,624.059	4,023.603	87.0	30.0
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	46.735	59.340	127.0	76.1
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	16,255.933	16,255.962	100.0	35.3

หมายเหตุ

- มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
- การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-มิถุนายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	160.000	11.661	74.708	640.7	46.7
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	350.000	87.358	146.471	167.7	41.8
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	380.000	71.278	67.654	94.9	17.8
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	800.000	368.578	735.294	199.5	91.9
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.493	82.703	43.254	52.3	25.7
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	154.330	36.744	59.512	162.0	38.6
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	551.741	171.212	123.906	72.4	22.5
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	15.000	1.500	0.057	3.8	0.4
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	0.100	0.100	0.073	73.0	73.0
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	120.000	49.841	78.108	156.7	65.1
11. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	6,000.000	1,894.373	2,223.108	117.4	37.1
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	21.800	10.620	0.079	0.7	0.4
13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	800.000	295.702	242.663	82.1	30.3
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	300.000	150.742	100.934	67.0	33.6

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-มิถุนายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	407.617	724.639	177.8	72.5
16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	-	-
17. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมณ.)	180.000	180.000	179.260	99.6	99.6
18. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	109.390	81.289	58.048	71.4	53.1
19. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	8,974.442	2,963.383	3,272.461	110.4	36.5
20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	171.220	160.040	-	-	-
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	60.000	22.449	0.031	0.1	0.1
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	40.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	12,253.162	4,537.949	4,042.759	89.1	33.0
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	13,390.199	4,624.059	4,023.603	87.0	30.0
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	46.735	59.340	127.0	76.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	9,208.743	8,125.702	88.2	31.6
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	16,255.933	16,255.962	100.0	35.3
