


งบลงทุนประจำปี 2565

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565


หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

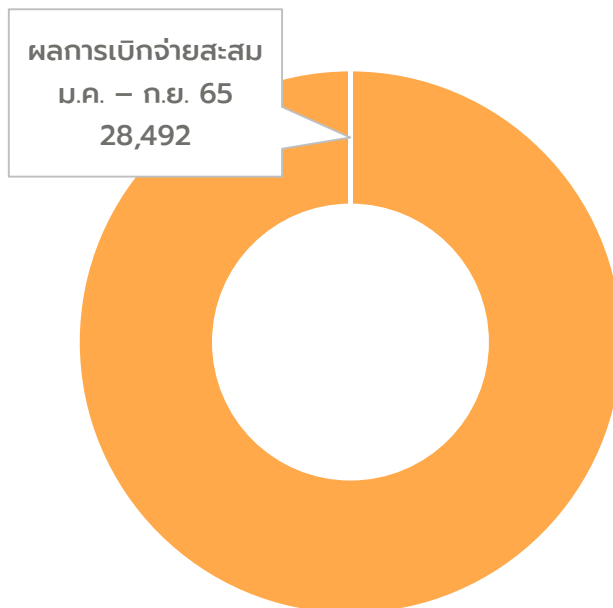

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565

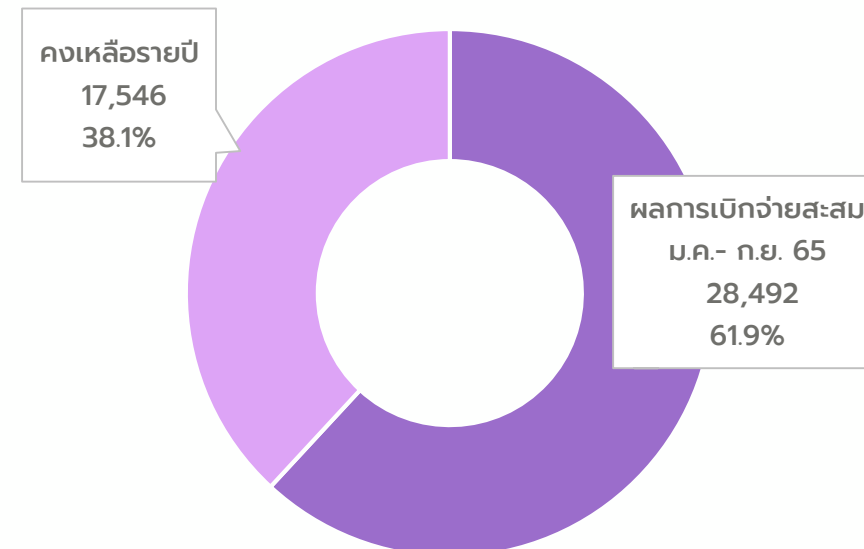


* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

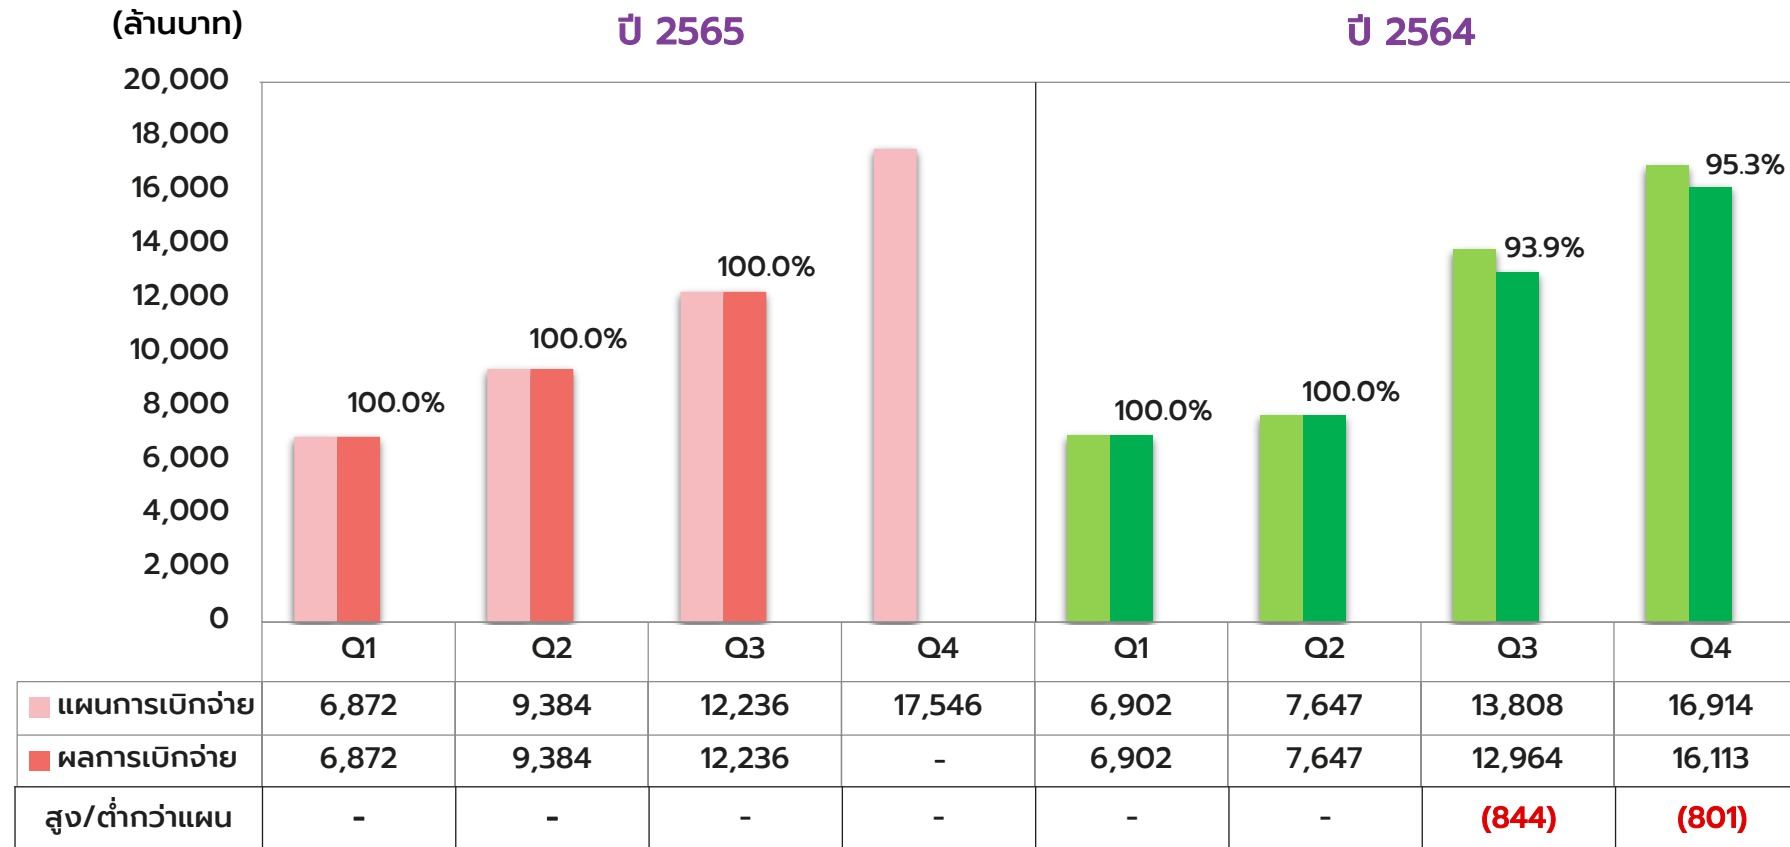

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-กันยายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับ กับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,316.516	12,741.870	14,953.514	117.4	73.6
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	15,750.036	13,538.425	86.0	52.6
- รายปี	12,253.162	7,545.374	7,167.063	95.0	58.5
- ระยะยาว	13,390.199	8,141.291	6,283.221	77.2	46.9
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	63.371	88.141	139.1	113.1
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	28,491.906	28,491.939	100.0	61.9

หมายเหตุ

- มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
- การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-กันยายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	160.000	24.900	105.395	423.3	65.9
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	350.000	259.689	289.355	111.4	82.7
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	380.000	136.860	223.795	163.5	58.9
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	800.000	618.346	935.162	151.2	116.9
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.493	91.578	87.434	95.5	51.9
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	154.330	120.814	67.176	55.6	43.5
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	551.741	186.248	515.342	276.7	93.4
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	15.000	2.250	0.058	2.6	0.4
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	0.100	0.100	0.073	73.0	73.0
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	120.000	86.277	96.794	112.2	80.7
11. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	6,000.000	3,468.189	3,459.398	99.7	57.7
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	21.800	18.400	0.140	0.8	0.6
13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	800.000	476.160	331.913	69.7	41.5
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	300.000	207.176	147.393	71.1	49.1

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-มิถุนายน 2565			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2565		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	407.617	724.639	177.8	72.5
16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	-	-
17. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	180.000	180.000	179.260	99.6	99.6
18. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	109.390	81.289	58.048	71.4	53.1
19. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	8,974.442	2,963.383	3,272.461	110.4	36.5
20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	171.220	160.040	-	-	-
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	60.000	22.449	0.031	0.1	0.1
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	40.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	12,253.162	4,537.949	4,042.759	89.1	33.0
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	13,390.199	4,624.059	4,023.603	87.0	30.0
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	46.735	59.340	127.0	76.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	9,208.743	8,125.702	88.2	31.6
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	16,255.933	16,255.962	100.0	35.3
