


งบลงทุนประจำปี 2565

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565

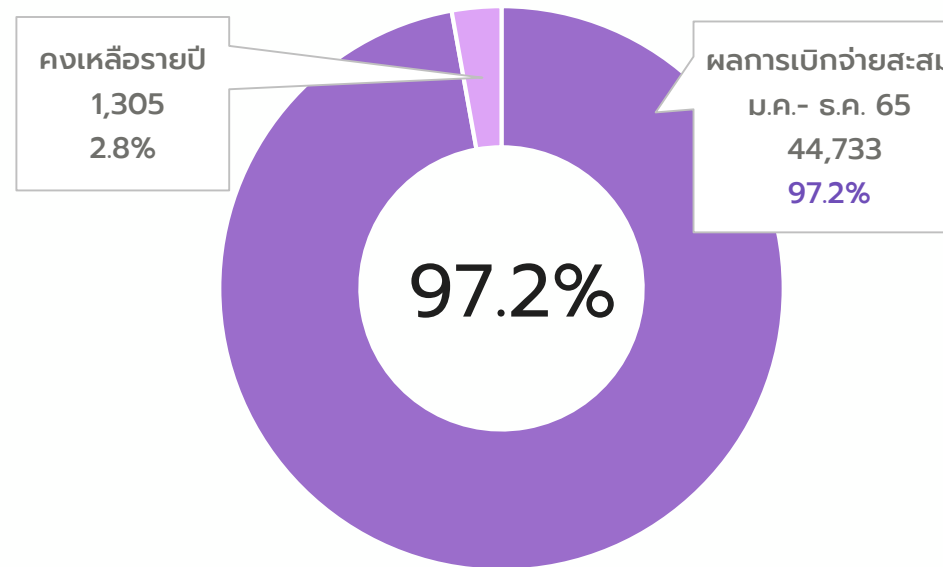


ทั้งนี้เมื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดฯ กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ทำให้ % การเบิกจ่ายเป็น **100.9%** ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

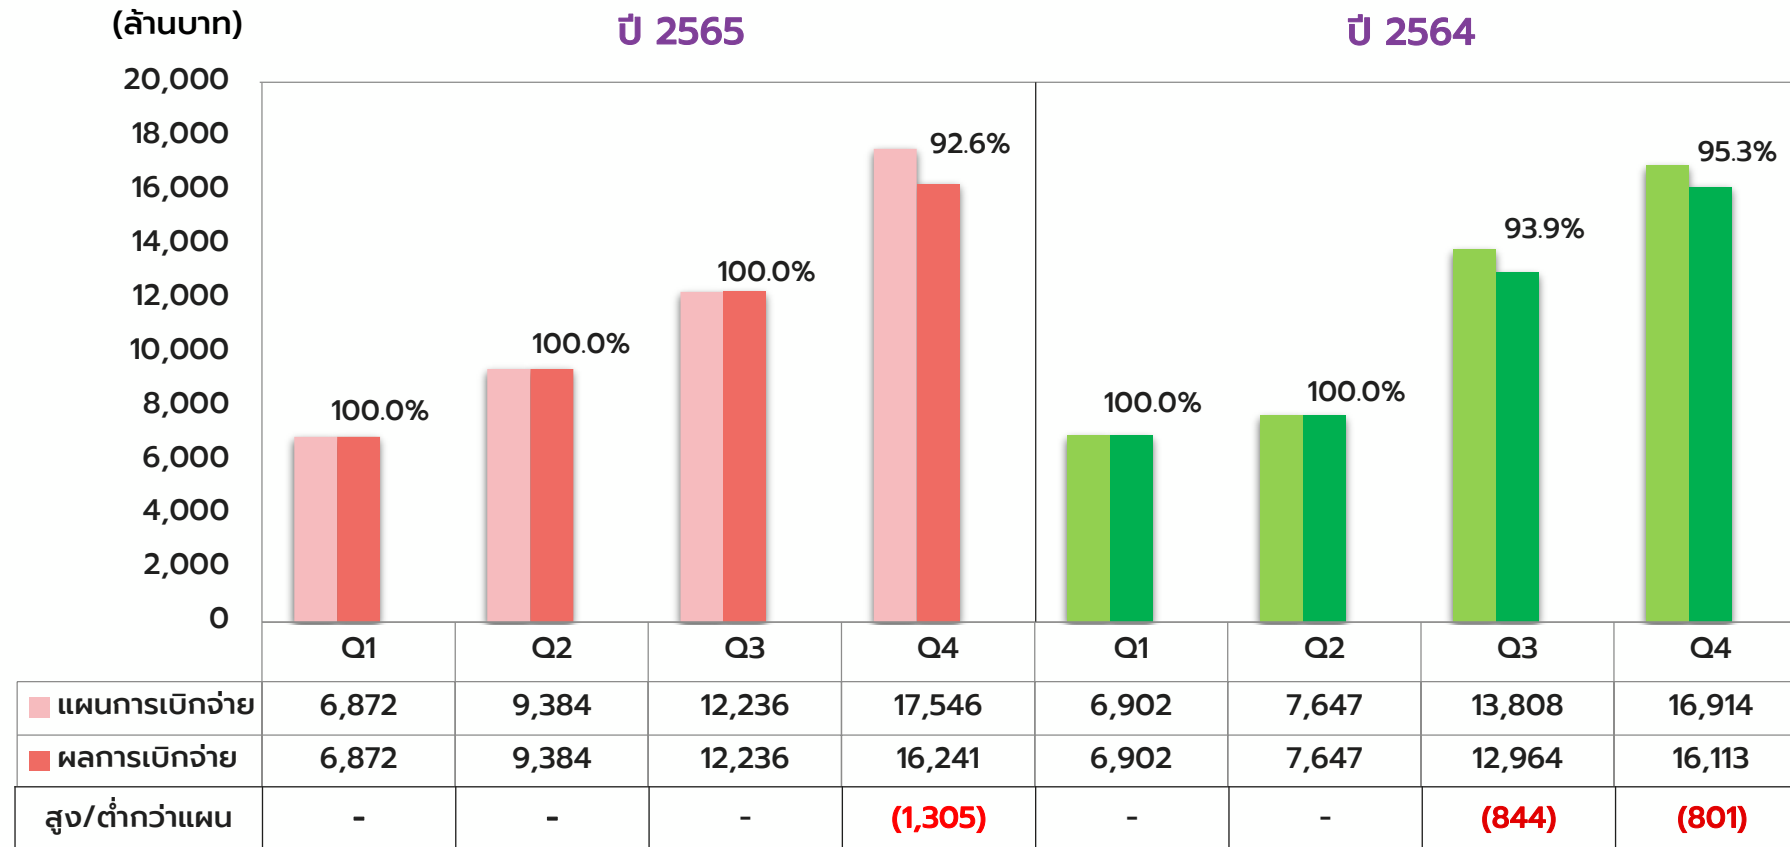

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-ธันวาคม 2565 จ่ายจริงปี 2565 วงเงิน	%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	20,316.516	24,000.605	118.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	20,731.785	80.6
- รายปี	12,253.162	10,827.877	88.4
- ระยะยาว	13,390.199	9,792.037	73.1
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	111.871	143.5
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	44,732.390	97.2

หมายเหตุ: ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน กรณีมีการจัดซื้อ/จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ วงเงินรวม 1,700.950 ล้านบาท
ทำให้ % การเบิกจ่ายเป็น 100.9% ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-ธันวาคม 2565 จ่ายจริงปี 2565 วงเงิน	%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ			
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	160.000	140.466	87.8
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	350.000	512.324	146.4
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	380.000	347.500	91.4
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	800.000	1,067.961	133.5
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.493	123.155	73.1
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	154.330	132.523	85.9
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	551.741	656.882	119.1
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	15.000	0.059	0.4
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	0.100	0.072	72.0
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	120.000	163.482	136.2
11. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	6,000.000	5,812.441	96.9
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	21.800	0.140	0.6
13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	800.000	721.934	90.2
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	300.000	276.627	92.2

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2565	มกราคม-ธันวาคม 2565 จ่ายจริงปี 2565 วงเงิน	%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ			
15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	1,306.686	130.7
16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	-	-	-
17. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	180.000	179.260	99.6
18. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	109.390	110.552	101.1
19. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	8,974.442	12,251.233	136.5
20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	171.220	166.932	97.5
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	60.000	30.376	50.6
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,316.516	24,000.605	118.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	12,253.162	10,827.877	88.4
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	13,390.199	9,792.037	73.1
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	77.953	111.871	143.5
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	25,721.314	20,731.785	80.6
รวมทั้งสิ้น	46,037.830	44,732.390	97.2
