


งบลงทุนประจำปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566


หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ. (มติ ครม. 20 กันยายน 2565)

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม




ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

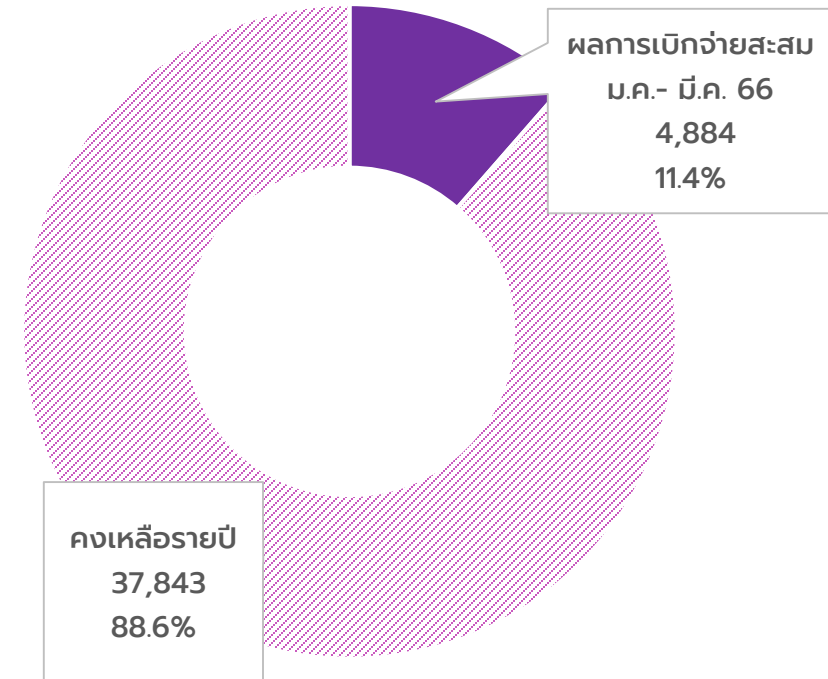

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2565 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

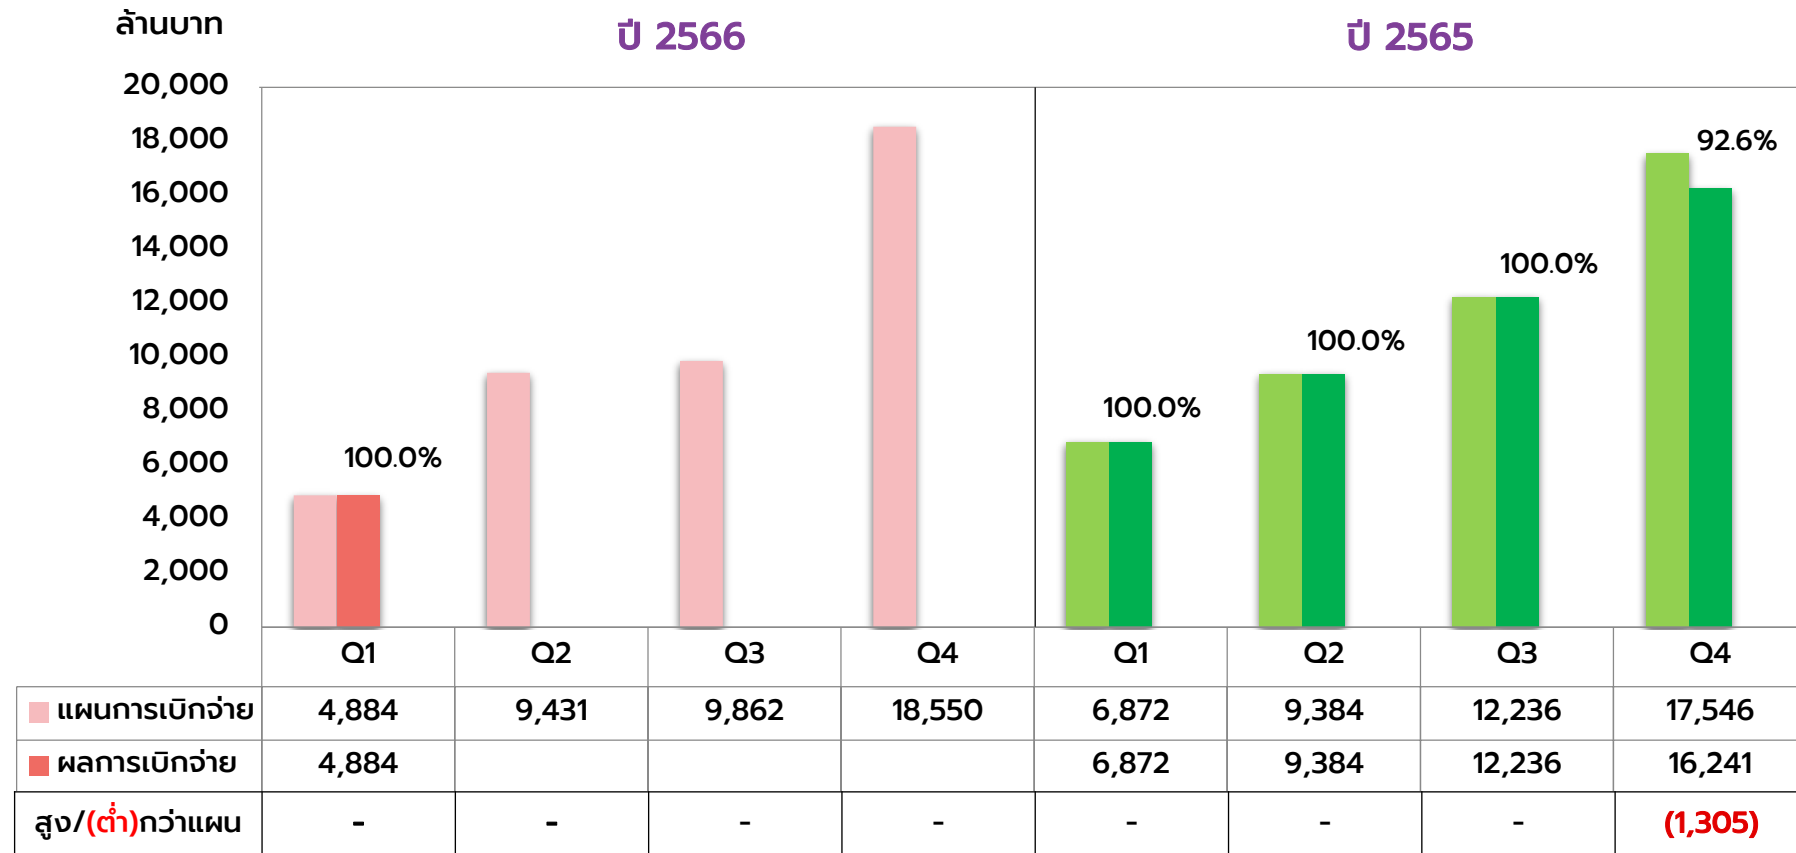

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566 (มติ ครม.)	มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)			ความก้าวหน้า
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		การดำเนินการ
			วงเงิน	%	(ร้อยละความสำเร็จ)
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	19,381.196	2,150.877	2,157.197	100.3	11.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,236.968	2,699.114	2,692.492	99.8	11.6
- รายปี	8,640.064	1,542.420	1,356.796	88.0	15.7
- ระยะยาว	14,596.904	1,156.694	1,335.696	115.5	9.2
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	108.435	33.419	33.722	100.9	31.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	4,883.410	4,883.411	100.0	11.4

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566 (มติ ครม.)	มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)			ความก้าวหน้า การดำเนินการ (ร้อยละความสำเร็จ)
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	355.511	62.792	2.364	3.8	0.7
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	314.019	12.000	1.004	8.4	0.3
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	700.000	94.463	41.663	44.1	6.0
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	241.294	18.179	1.411	7.8	0.6
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	-	-	-	-	-
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	577.169	149.949	13.612	9.1	2.4
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	-	-	-	-	-
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	55.000	43.949	2.323	5.3	4.2
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	2,400.000	200.000	477.359	238.7	19.9
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	-	-	-	-	-
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,190.000	152.425	19.381	12.7	1.6
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	119.600	14.000	31.444	224.6	26.3
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	142.053	163.670	115.2	16.4

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566 (มติ ครม.)	มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)			ความก้าวหน้า การดำเนินการ (ร้อยละความสำเร็จ)
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ					
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	172.000	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	139.301	-	-	-	-
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	-	-	-	-	-
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,552.036	1,250.747	1,388.492	111.0	13.2
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,500.780	0.320	1.761	550.3	0.1
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	64.486	10.000	12.713	127.1	19.7
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	19,381.196	2,150.877	2,157.197	100.3	11.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	8,640.064	1,542.420	1,356.796	88.0	15.7
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	14,596.904	1,156.694	1,335.696	115.5	9.2
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,236.968	2,699.114	2,692.492	99.8	11.6
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	60.387	21.407	33.722	157.5	55.8
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	48.048	12.012	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	108.435	33.419	33.722	100.9	31.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	4,883.410	4,883.411	100.0	11.4
