

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566

กองประเมินผลงบประมาณ

งบลงทุนประจำปี 2566




ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ. *

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

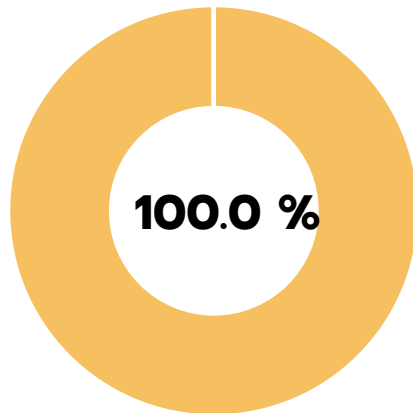

เป้า	14,029	ล้านบาท
จ่าย	14,029	ล้านบาท
คิดเป็น	100.0	%

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

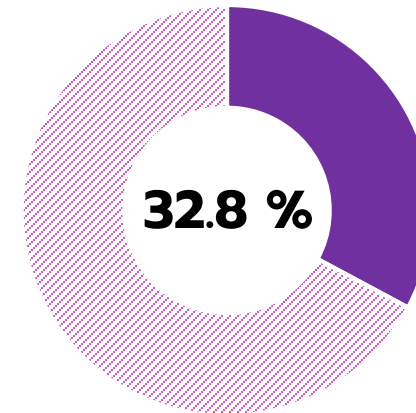


เป้า	42,727	ล้านบาท		
จ่าย	14,029	ล้านบาท	คิดเป็น	32.8 %
คงเหลือ	28,698	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	67.2 %

หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2565 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

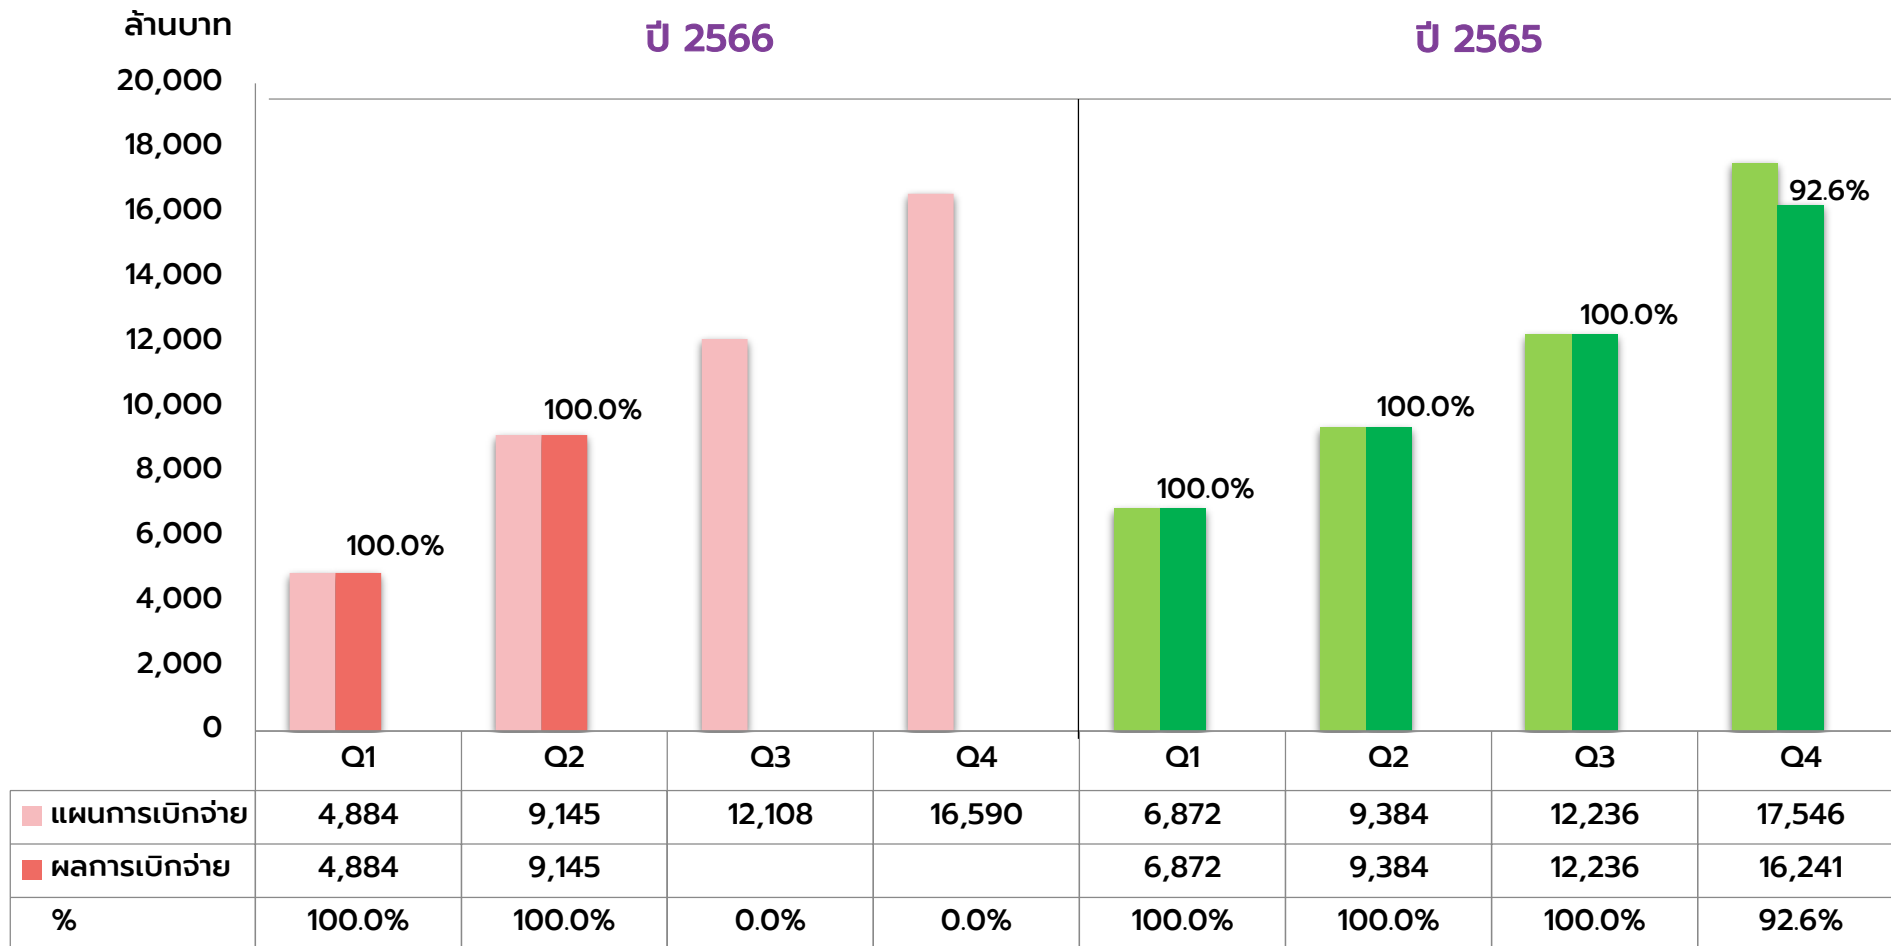

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - มิถุนายน 2566			%จ่ายจริงเทียบกับ
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		กับเป้าหมาย
			วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	18,608.998	5,947.740	6,292.975	105.8	33.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	8,044.033	7,677.088	95.4	32.0
- รายปี	11,560.051	4,166.493	4,297.235	103.1	37.2
- ระยะยาว	12,454.526	3,877.540	3,379.853	87.2	27.1
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	37.000	58.711	158.7	57.0
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	14,028.773	14,028.774	100.0	32.8

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566



ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - มิถุนายน 2566			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	18.819	18.819	19.034	101.1	101.1
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	202.711	105.798	35.101	33.2	17.3
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	204.000	126.387	89.553	70.9	43.9
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	500.000	237.475	52.214	22.0	10.4
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	81.519	32.878	11.776	35.8	14.4
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	35.976	31.070	26.310	84.7	73.1
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	672.857	163.887	60.538	36.9	9.0
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	2.500	2.500	0.231	9.2	9.2
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	10.223	7.727	3.537	45.8	34.6
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	2,400.000	1,150.171	1,387.305	120.6	57.8
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	20.618	20.002	5.947	29.7	28.8
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	844.251	163.539	159.037	97.2	18.8
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	152.579	66.000	61.531	93.2	40.3
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	373.035	287.219	77.0	28.7

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - มิถุนายน 2566			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	139.416	-	-	-	-
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.124	0.124	1.544	1,245.2	6.1
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,795.576	3,361.143	4,077.351	121.3	37.8
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,414.980	30.000	1.873	6.2	0.1
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	87.849	57.185	12.874	22.5	14.7
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	18,608.998	5,947.740	6,292.975	105.8	33.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,560.051	4,166.493	4,297.235	103.1	37.2
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,454.526	3,877.540	3,379.853	87.2	27.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	8,044.033	7,677.088	95.4	32.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	79.000	37.000	58.711	158.7	74.3
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	24.024	-	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	37.000	58.711	158.7	57.0
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	14,028.773	14,028.774	100.0	32.8
