

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566

กองประเมินผลงบประมาณ


งบลงทุนประจำปี 2566

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ.

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม



เป้า	26,137	ล้านบาท
จ่าย	26,137	ล้านบาท
คิดเป็น	100.0	%


ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

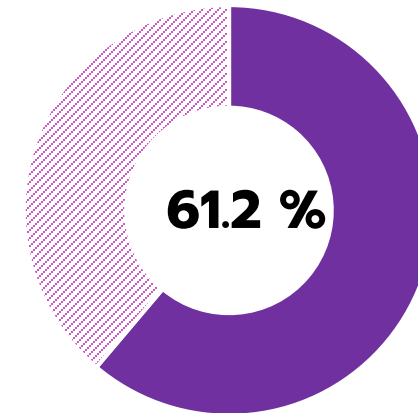

เป้า	42,727	ล้านบาท
จ่าย	26,137	ล้านบาท (61.2%)
คงเหลือ	16,590	ล้านบาท (38.8%)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2565 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

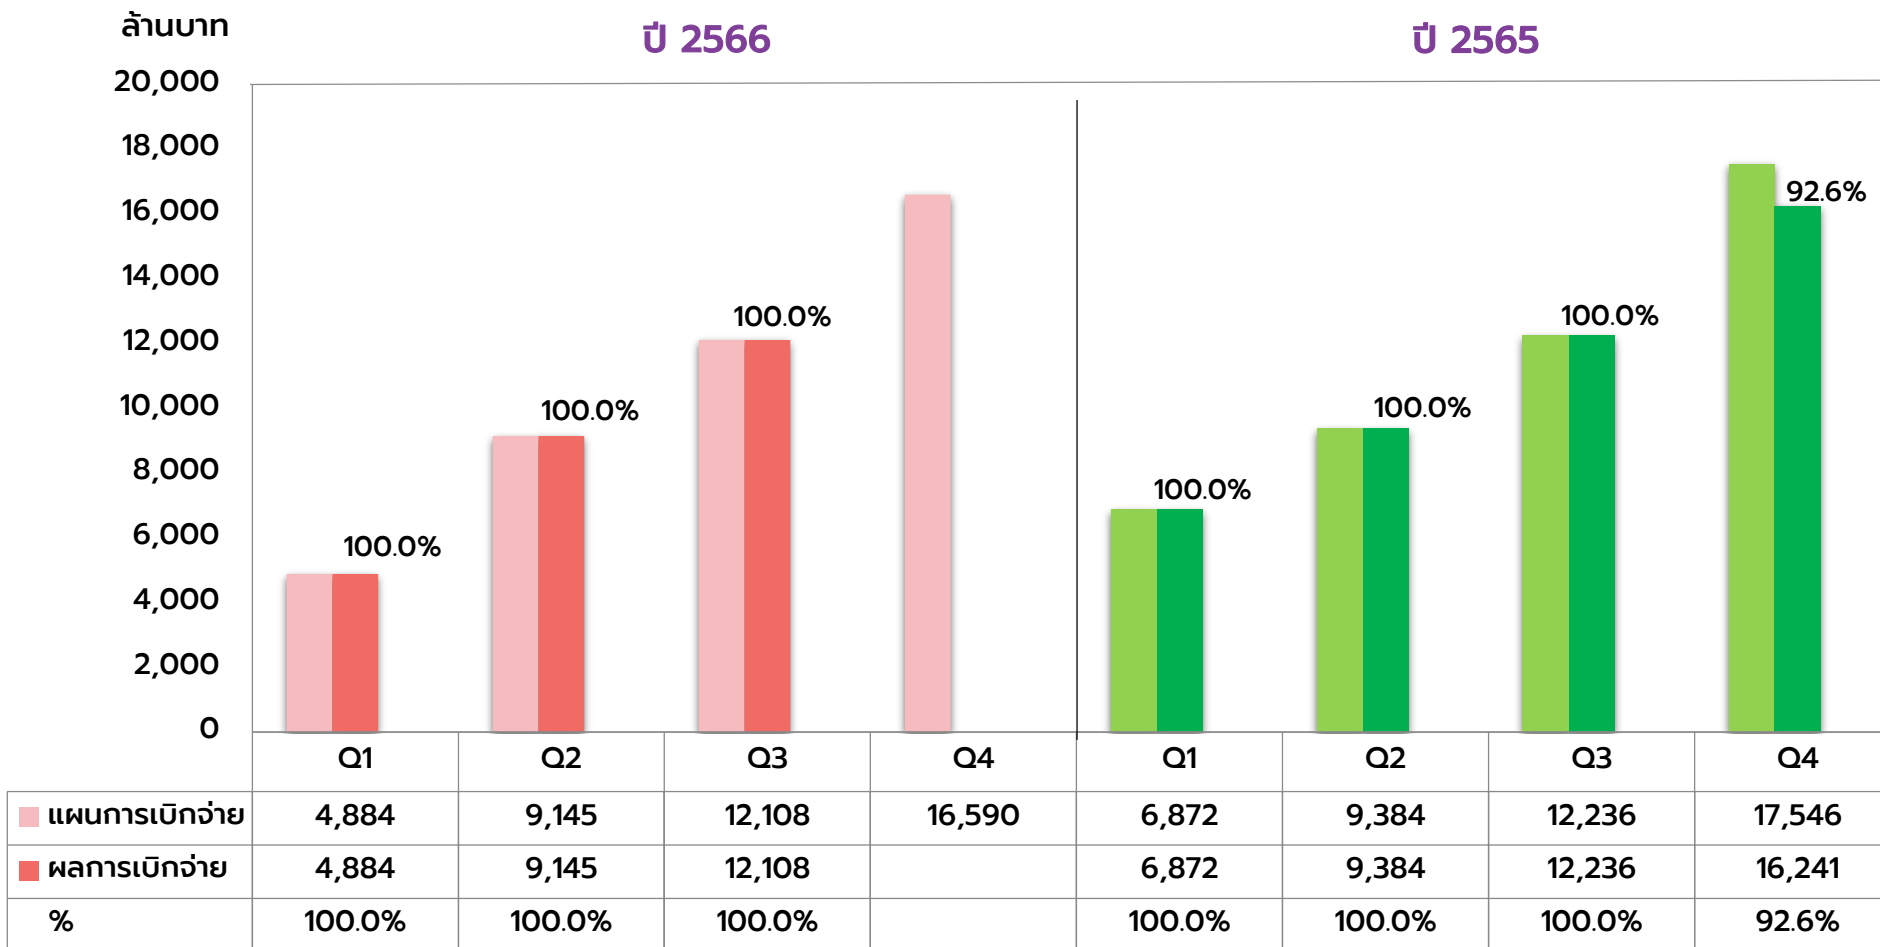

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - กันยายน 2566			%จ่ายจริงเทียบกับ
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		กับเป้าหมาย
			วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	18,608.998	10,755.274	11,668.408	108.5	62.7
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	15,311.608	14,383.881	93.9	59.9
- รายปี	11,560.051	7,640.236	7,324.123	95.9	63.4
- ระยะยาว	12,454.526	7,671.372	7,059.758	92.0	56.7
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	70.012	84.606	120.8	82.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	26,136.894	26,136.895	100.0	61.2

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สชช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	18.819	18.819	19.069	101.3	101.3
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	202.711	202.711	180.001	88.8	88.8
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	204.000	204.000	185.099	90.7	90.7
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	500.000	500.000	452.487	90.5	90.5
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	81.519	81.519	45.273	55.5	55.5
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	35.976	35.976	45.725	127.1	127.1
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	672.857	672.857	688.040	102.3	102.3
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	2.500	2.500	2.101	84.0	84.0
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	10.223	10.223	24.705	241.7	241.7
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	2,400.000	2,400.000	3,020.965	125.9	125.9
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	20.618	20.618	15.289	74.2	74.2
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	844.251	844.251	1,392.782	165.0	165.0
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	152.579	152.579	192.353	126.1	126.1
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	1,000.000	736.577	73.7	73.7

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - กันยายน 2566			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คท.)	-	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณ.)	139.416	138.286	-	-	-
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.124	25.124	1.877	7.5	7.5
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,795.576	6,381.311	7,532.588	118.0	69.8
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,414.980	39.980	44.011	110.1	3.1
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	87.849	60.523	29.540	48.8	33.6
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	18,608.998	10,755.274	11,668.408	108.5	62.7
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,560.051	7,640.236	7,324.123	95.9	63.4
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,454.526	7,671.372	7,059.758	92.0	56.7
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	15,311.608	14,383.881	93.9	59.9
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	79.000	58.000	84.606	145.9	107.1
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	24.024	12.012	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	70.012	84.606	120.8	82.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	26,136.894	26,136.895	100.0	61.2
