

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566

กองประเมินผลงบประมาณ


งบลงทุนประจำปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ.

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

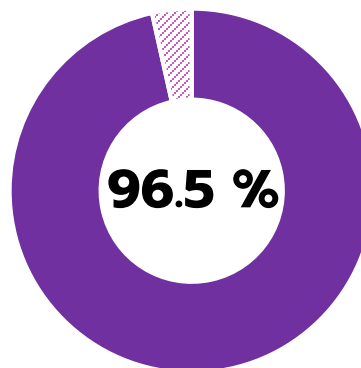

เป้า	42,727	ล้านบาท
จ่าย	41,231	ล้านบาท (96.5%)
คงเหลือ	1,496	ล้านบาท (3.5%)

ทั้งนี้ มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงิน 2,553.601 ล้านบาท ทำให้การเบิกจ่ายเป็น **102.6%**


หมายเหตุ

1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2565 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566

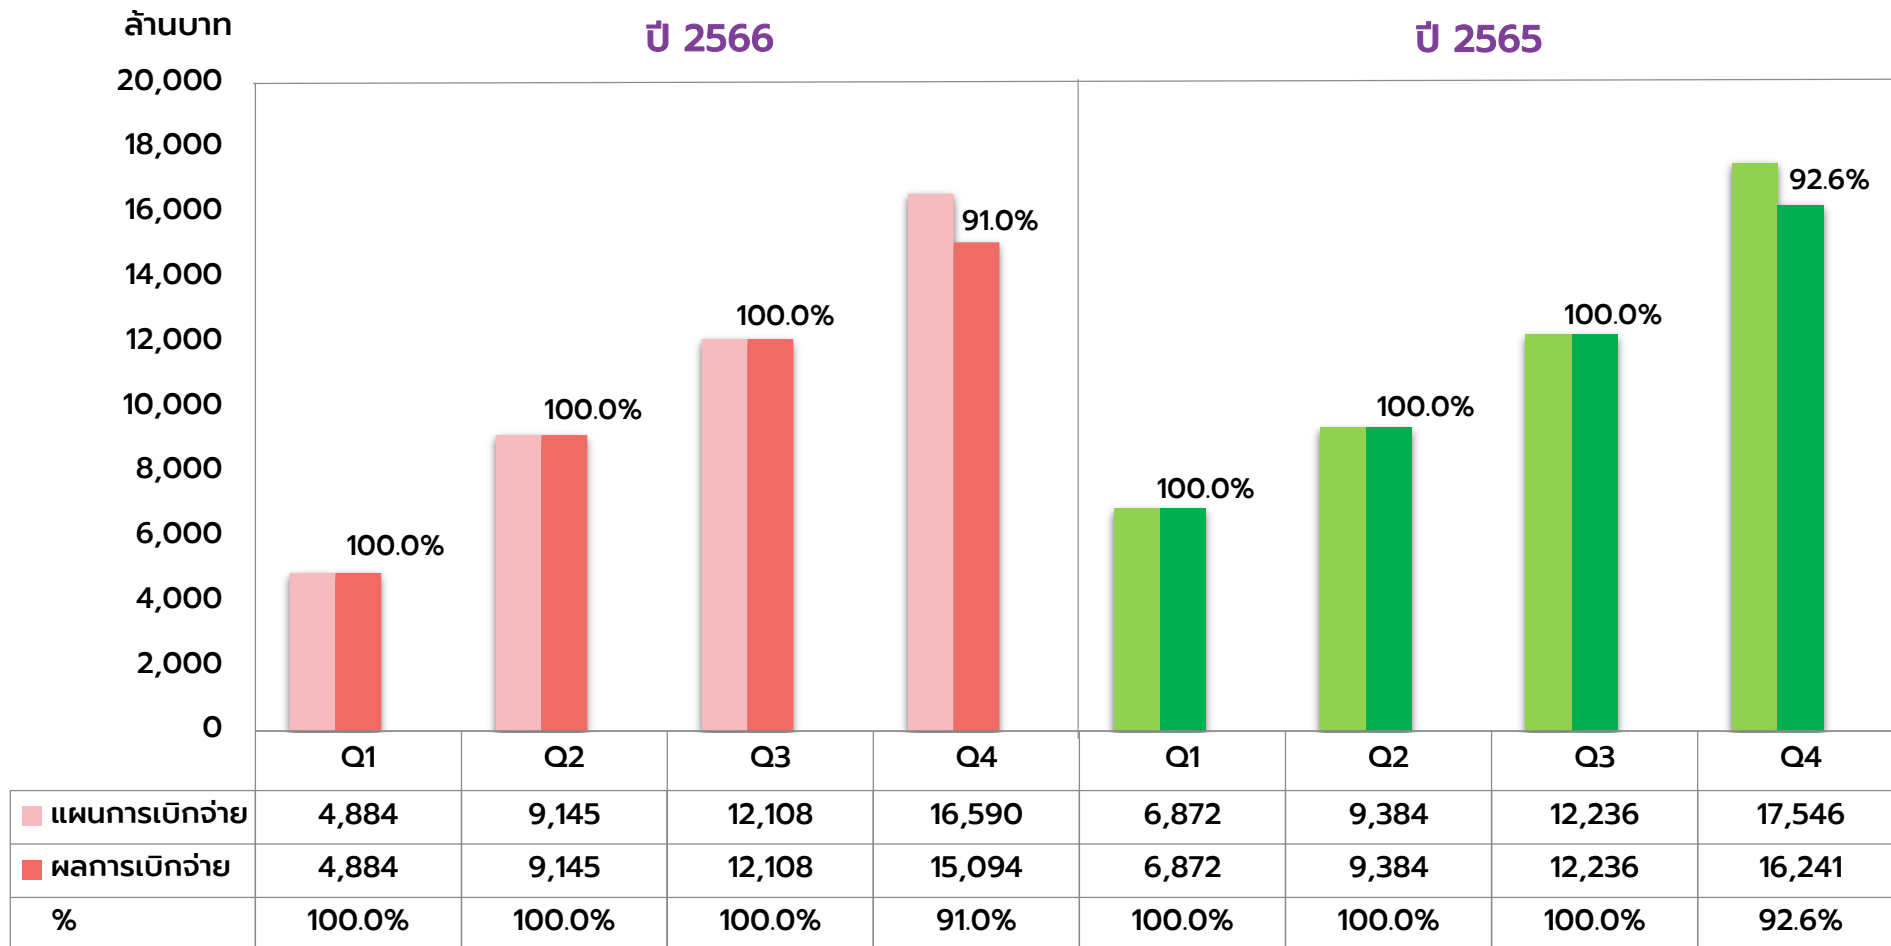

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566			%จ่ายจริงเทียบกับ
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		กับเป้าหมาย 12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	18,608.998	18,608.998	19,499.748	104.8	104.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	24,014.577	21,615.931	90.0	90.0
- รายปี	11,560.051	11,560.051	10,511.665	90.9	90.9
- ระยะยาว	12,454.526	12,454.526	11,104.266	89.2	89.2
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	103.024	115.490	112.1	112.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	42,726.599	41,231.169	96.5	96.5

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566



ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	18.819	18.819	19.069	101.3	101.3
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	202.711	202.711	180.001	88.8	88.8
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	204.000	204.000	185.099	90.7	90.7
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	500.000	500.000	452.487	90.5	90.5
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	81.519	81.519	45.273	55.5	55.5
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	35.976	35.976	45.725	127.1	127.1
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	672.857	672.857	688.040	102.3	102.3
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	2.500	2.500	2.101	84.0	84.0
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	10.223	10.223	24.705	241.7	241.7
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	2,400.000	2,400.000	3,020.965	125.9	125.9
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	20.618	20.618	15.289	74.2	74.2
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	844.251	844.251	1,392.782	165.0	165.0
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	152.579	152.579	192.353	126.1	126.1
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,000.000	1,000.000	736.577	73.7	73.7

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทพ.)	-	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	139.416	139.416	414.916	297.6	297.6
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.124	25.124	1.877	7.5	7.5
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,795.576	10,795.576	11,942.015	110.6	110.6
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,414.980	1,414.980	51.879	3.7	3.7
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	87.849	87.849	88.595	100.8	100.8
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	18,608.998	18,608.998	19,499.748	104.8	104.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,560.051	11,560.051	10,511.665	90.9	90.9
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,454.526	12,454.526	11,104.266	89.2	89.2
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	24,014.577	24,014.577	21,615.931	90.0	90.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	79.000	79.000	115.490	146.2	146.2
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	24.024	24.024	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	103.024	103.024	115.490	112.1	112.1
รวมทั้งสิ้น	42,726.599	42,726.599	41,231.169	96.5	96.5
