

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2567


กองประเมินผลงบประมาณ

งบลงทุนประจำปี 2567

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 41,925.619 ล้านบาท*

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567

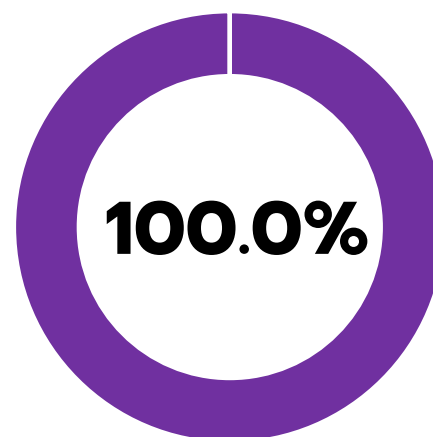


เป้าหมายเบิกจ่าย	41,926	ล้านบาท
เบิกจ่ายจริง	41,926	ล้านบาท

*หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่าย จาก 130,711.060 ล้านบาท และ 41,952.619 ล้านบาท เป็น 130,456.060 ล้านบาท และ 41,925.619 ล้านบาท ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2567 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567

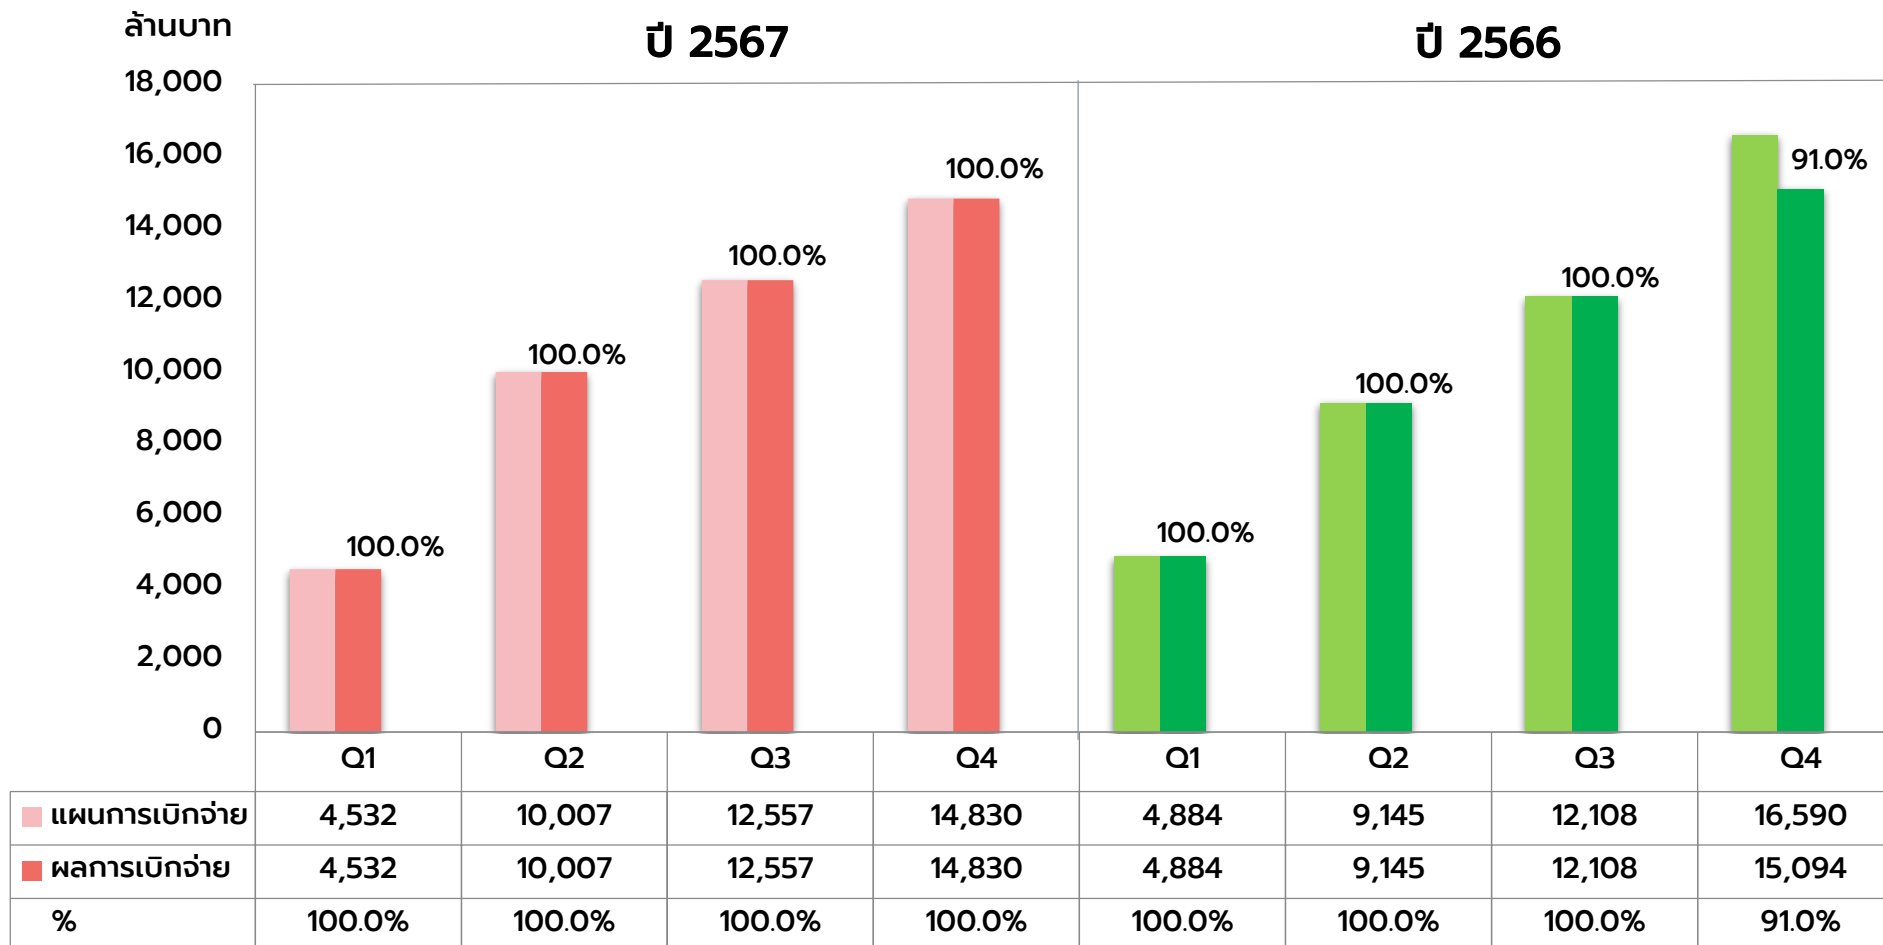

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - ธันวาคม 2567	
		จ่ายจริง	
		วงเงิน	%
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	14,301.721	15,830.736	110.7
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	25,945.628	94.3
- รายปี	15,601.619	16,486.778	105.7
- ระยะยาว	11,911.478	9,458.850	79.4
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	149.255	134.7
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	41,925.619	100.0

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - ธันวาคม 2567	
		จ่ายจริง	
		วงเงิน	%
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ			
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	25.465	26.125	102.6
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	136.193	75.071	55.1
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	150.000	42.734	28.5
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	155.871	44.897	28.8
5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	0.174	2.043	1,174.1
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	46.310	52.390	113.1
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	4.000	5.797	144.9
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,000.000	1,579.645	158.0
9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	5.548	5.464	98.5
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	935.000	913.928	97.7
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	165.310	148.709	90.0
12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	203.202	132.592	65.3
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	191.668	-	-

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - ธันวาคม 2567	
		จ่ายจริง	
		วงเงิน	%
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ			
14. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณ.)	418.160	599.239	143.3
15. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	26.000	-	-
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,700.000	12,109.534	113.2
17. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	131.252	77.665	59.2
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คคพ.)	7.568	14.903	196.9
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	14,301.721	15,830.736	110.7
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	15,601.619	16,486.778	105.7
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	11,911.478	9,458.850	79.4
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	25,945.628	94.3
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก			
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	70.593	117.590	166.6
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	40.208	31.665	78.8
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	149.255	134.7
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	41,925.619	100.0
