

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568

กองประเมินผลงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2568

สถานะ 31 มีนาคม 2568

ไตรมาส 1


(ม.ค. – มี.ค.)



เป้าเบิกจ่าย 5,597 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,597 ล้านบาท (100.0%)

ทั้งปี

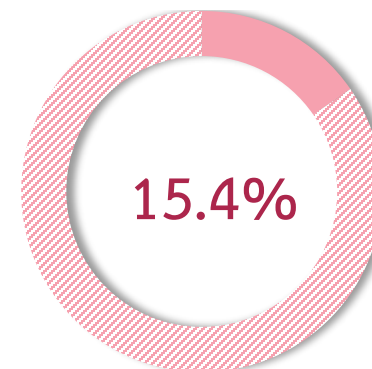

เป้าเบิกจ่าย 36,449 ล้านบาท *


จ่ายจริง 5,597 ล้านบาท (15.4%)

คงเหลือ 30,852 ล้านบาท (84.6%)

* มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส

สถานะ 31 มีนาคม 2568

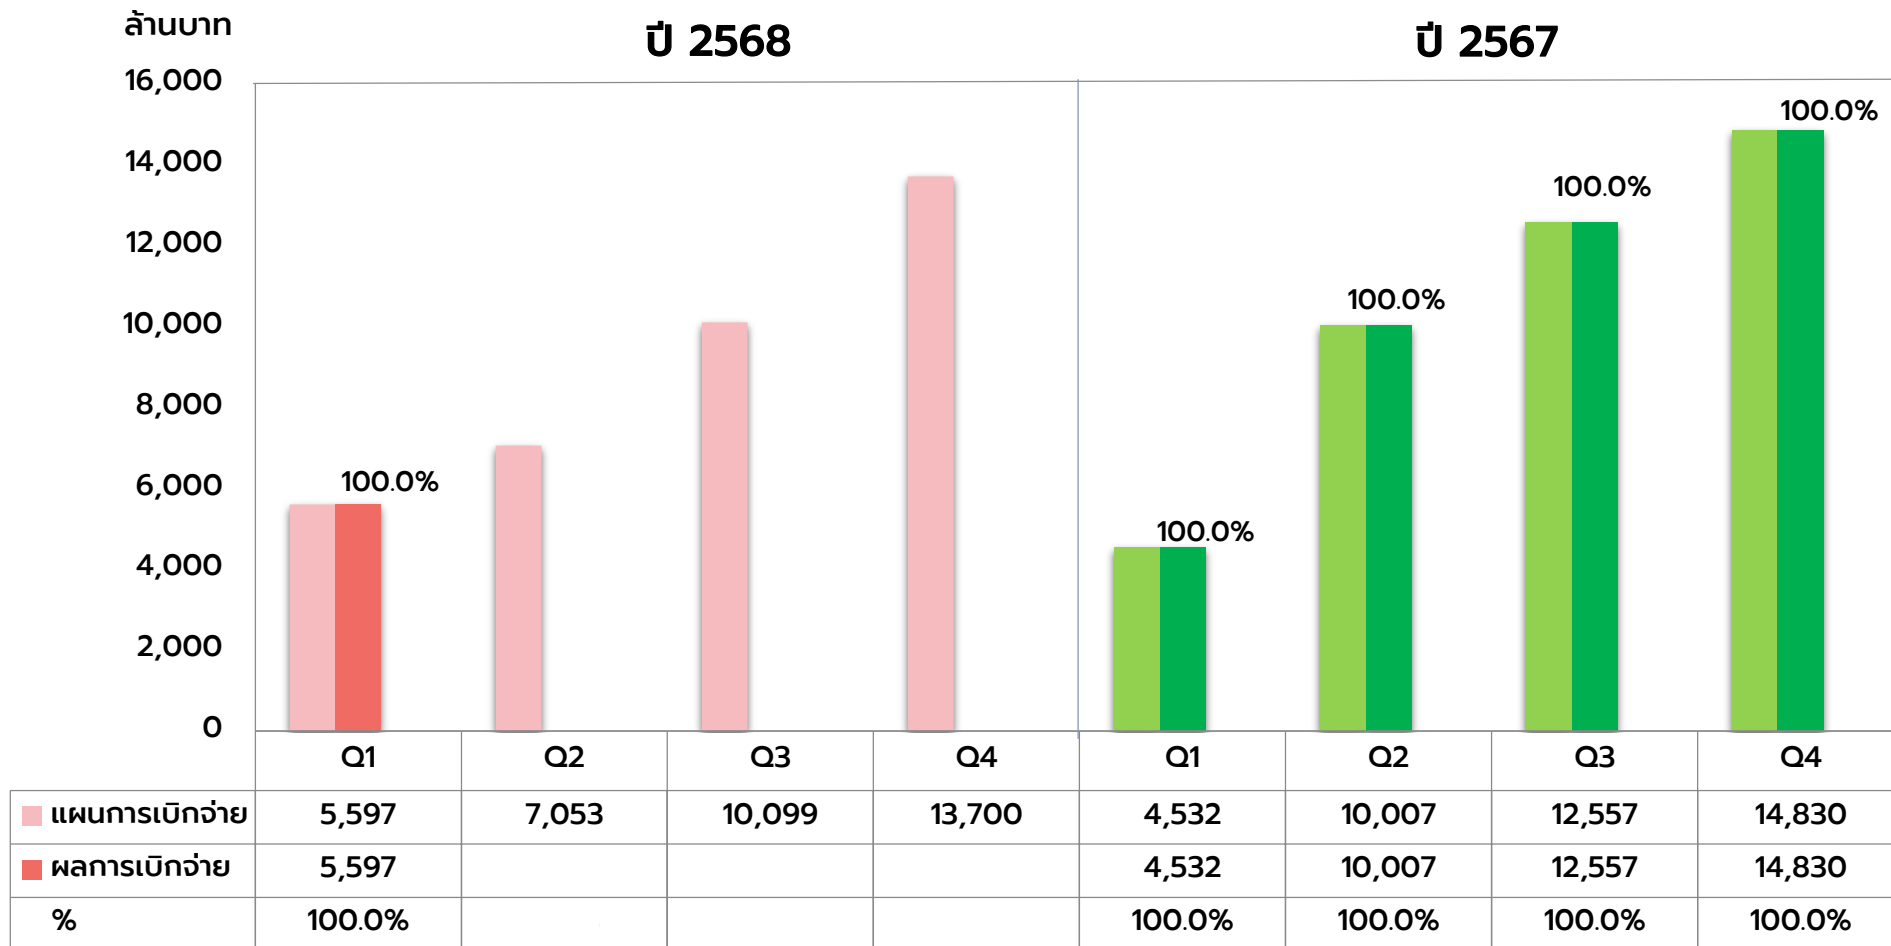

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2568

สถานะ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	มกราคม - มีนาคม 2568			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	10,000.454	1,241.437	1,604.955	129.3	16.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	26,243.790	4,317.329	3,948.463	91.5	15.0
- รายปี	15,553.265	2,760.850	2,472.888	89.6	15.9
- ระยะยาว	10,690.525	1,556.479	1,475.575	94.8	13.8
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	204.640	38.124	43.472	114.0	21.2
รวมทั้งสิ้น	36,448.884	5,596.890	5,596.890	100.0	15.4

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2568



สถานะ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	มกราคม - มีนาคม 2568			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	56.425	-	29.757	-	52.7
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	15.000	0.453	20.118	4,441.1	134.1
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	243.550	-	1.106	-	0.5
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	4.000	-	3.263	-	81.6
5. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	600.000	30.000	220.954	736.5	36.8
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	710.016	75.053	230.121	306.6	32.4
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	179.559	62.684	64.682	103.2	36.0
8. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	1,028.332	-	-	-	-
9. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	557.700	139.425	100.080	71.8	17.9
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,200.000	933.822	934.439	100.1	18.0
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,405.872	-	0.435	-	0.0
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	10,000.454	1,241.437	1,604.955	129.3	16.0

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2568

สถานะ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	มกราคม - มีนาคม 2568			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	15,553.265	2,760.850	2,472.888	89.6	15.9
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,690.525	1,556.479	1,475.575	94.8	13.8
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	26,243.790	4,317.329	3,948.463	91.5	15.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	81.812	14.484	32.549	224.7	39.8
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	122.828	23.640	10.923	46.2	8.9
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	204.640	38.124	43.472	114.0	21.2
รวมทั้งสิ้น	36,448.884	5,596.890	5,596.890	100.0	15.4
