



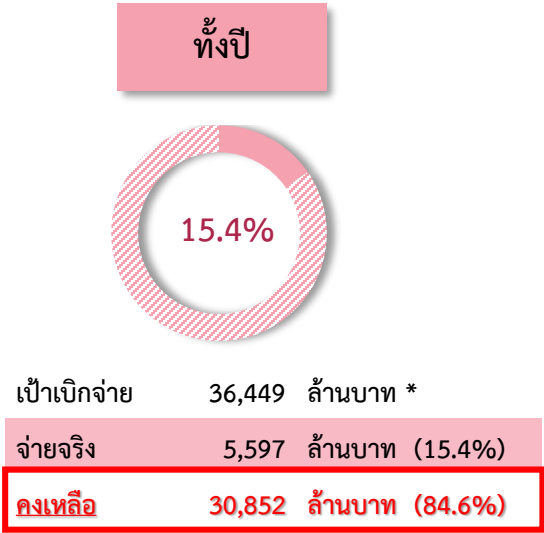


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

สถานะ 31 มีนาคม 2568

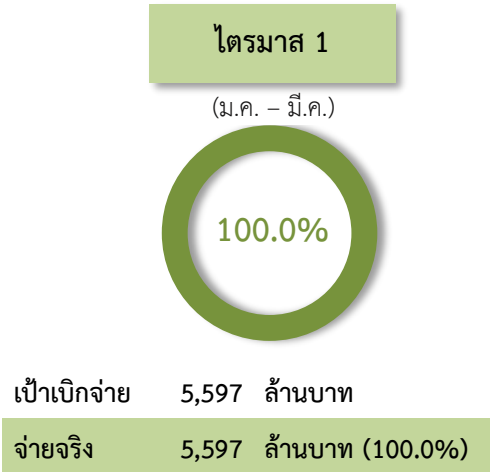

* มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส

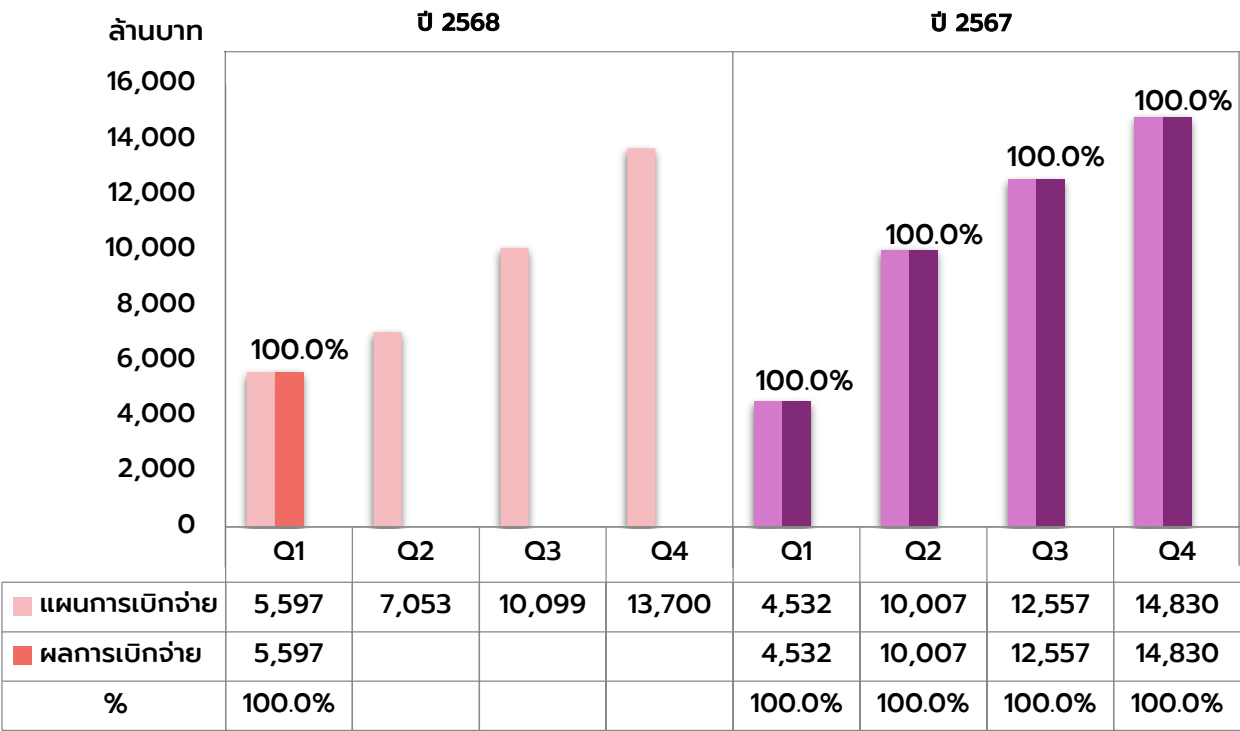

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

สถานะ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	มกราคม - มีนาคม 2568			% จ่ายจริง
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		เทียบกับเป้าหมาย
			วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	10,000.454	1,241.437	1,604.955	129.3	16.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	26,243.790	4,317.329	3,948.463	91.5	15.0
- งานรายปี	15,553.265	2,760.850	2,472.888	89.6	15.9
- แผนงานระยะยาว	10,690.525	1,556.479	1,475.575	94.8	13.8
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	204.640	38.124	43.472	114.0	21.2
รวมทั้งสิ้น	36,448.884	5,596.890	5,596.890	100.0	15.4

รายละเอียดงาน

สถานะ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	มกราคม - มีนาคม 2568			% จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	56.425	-	29.757	-	52.7
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	15.000	0.453	20.118	4,441.1	134.1
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	243.550	-	1.106	-	0.5
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)	4.000	-	3.263	-	81.6
5. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	600.000	30.000	220.954	736.5	36.8
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	710.016	75.053	230.121	306.6	32.4
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)	179.559	62.684	64.682	103.2	36.0
8. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เคริ เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทพ.)	1,028.332	-	-	-	-
9. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	557.700	139.425	100.080	71.8	17.9
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,200.000	933.822	934.439	100.1	18.0
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,405.872	-	0.435	-	-
รวมงบลงทุนที่ ทำเป็นโครงการ	10,000.454	1,241.437	1,604.955	129.3	16.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	15,553.265	2,760.850	2,472.888	89.6	15.9
2. งบลงทุนที่ ทำเป็นแผนระยะยาว	10,690.525	1,556.479	1,475.575	94.8	13.8
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	26,243.790	4,317.329	3,948.463	91.5	15.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	204.640	38.124	43.472	114.0	21.2
รวมทั้งสิ้น	36,448.884	5,596.890	5,596.890	100.0	15.4

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10,000.454	1,604.955	16.0
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	26,243.790	3,948.463	15.0
2.1 งานรายปี		15,553.265	2,472.888	15.9
2.2 แผนงานระยะยาว		10,690.525	1,475.575	13.8
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	204.640	43.472	21.2
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		36,448.884	5,596.890	15.4

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
1. งบประมาณที่ทำเป็นโครงการ							
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	56.425	29.757	52.7	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสุดท้ายของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	64.2
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	15.000	20.118	134.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน อยู่ระหว่าง กฟผ. แบ่งแยกโฉนดเพื่อขายให้ กฟผ.	13.6
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	243.550	1.106	0.5	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง	30.2
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	4.000	3.263	81.6	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง	10.0
5. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	600.000	220.954	36.8	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี จำนวน 7 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ระยะทาง 1,947.00 วงจร-กม.	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 161.00 วงจร-กม.	26.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	710.016	230.121	32.4	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	1.8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	179.559	64.682	36.0	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง	41.8
8. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,028.332	-	-	งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง	โครงการมีคืบความพ้องร้อง อยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาคดี	-
9. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	557.700	100.080	17.9	งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12,000 ชุด	ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 6,000 ชุด	50.0
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5,200.000	934.439	18.0	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 33 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 9 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 2,551.356 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 495.273 วงจร-กม. - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี - งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานของสัญญา - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ จำนวน 8 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานของสัญญา 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง - งานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ จำนวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานของสัญญา - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ลูบไล้ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานของสัญญา 3. ดำเนินแล้วเสร็จ ระยะทาง 893.318 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 219.676 วงจร-กม. - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,121.378 วงจร-กม.	31.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,405.872	0.435	-	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จำนวน 1 แห่ง 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) จำนวน 2 แห่ง - บริเวณเกาะพะงัน - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า อยู่ระหว่างดำเนินการตาม งวดงานสุดท้ายของสัญญา 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) - บริเวณเกาะพะงัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	33.3
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		10,000.454	1,604.955	16.0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	15,553.265	2,472.888	15.9	หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหามอเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณีหม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ) หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.	- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน - อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 4 แห่ง - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน จำนวน 1 แห่ง 1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - อยู่ระหว่างประกาศกำหนดให้เสนอราคาทางระบบ e-GP ทั้งหมด 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ Use Case เพื่อพัฒนางานของ กฟภ.	
รวมงานรายปี		15,553.265	2,472.888	15.9			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	21.000	0.053	0.3	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง 2. การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ - อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 1 แห่ง	26.0
2. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.478	99.036	43.3	1. งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขความชำรุดและสนับสนุนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบงาน	1. คงเหลืองานเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ในเดือน พ.ค. 2568 2. อยู่ระหว่างตรวจรับตามงวดงาน	63.4
3. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	62.962	-	-	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - ดำเนินการพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ฯ 2. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพไฟฟ้า	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - อยู่ระหว่างหาแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน 2. การจัดทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	15.0
4. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	40.168	-	-	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตกไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 4 สถานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	75.0
5. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	227.004	57.150	25.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง - การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 17 แห่ง - การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 5 แห่ง	หมวดสิ่งก่อสร้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 17 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 5 แห่ง	55.1
6. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	18.524	6.877	37.1	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
7. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	8.756	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุที่ศูนย์ฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย : เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ มีความเสถียรและครอบคลุม - งานปรับปรุงพื้นที่ (งานทำประตูน้ำ) : เพื่อจัดการระบบระบายน้ำ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากน้ำท่วม	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง จำนวน 3 รายการ 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา	20.0
8. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	50.685	13.145	25.9	งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี จำนวน 7 สถานี	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 7 สถานี	45.9
9. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	58.345	-	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน 2. ครั้วเรือน จำนวน 1,680 ครั้วเรือน	ปัจจุบัน ครม. มีมติผ่อนผัน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 และอยู่ระหว่าง ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้	-
10. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	172.850	0.110	0.1	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	8.0
11. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	106.254	8.312	7.8	แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	50.0
12. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10.429	6.177	59.2	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
13. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	300.000	74.584	24.9	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยาย ถนนของกรมทางหลวง - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 90% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความ มั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 90% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าฯ - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,063 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 15,834 งาน คิดเป็น 92.80% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,049 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 7,696 งาน คิดเป็น 95.61%	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
14. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	138.890	6.695	4.8	1. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) 2. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) 3. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - จัดหาระบบ Contact Center ทดแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ Service Desk 1 ระบบ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดสัญญา 2. อยู่ระหว่างเสนอขอพิจารณาพิจารณาครั้งที่ 3 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน	35.0
15. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	187.118	0.002	-	งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็น สำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy)	จัดทำและออกแบบประมาณการอาคาร (PEA Academy) สำหรับหา ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ จากผู้รับจ้างเดิม ซึ่งละทิ้งงาน	5.0
16. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	55.396	25.367	45.8	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
17. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	130.484	32.403	24.8	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
18. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานี ไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	659.796	24.549	3.7	เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้สถานี ไฟฟ้ามีความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จำนวน 25 สถานี	- อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 20 สถานี - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 5 สถานี	25.0
19. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบ จำหน่าย ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	14.041	17.961	127.9	งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวน 780 ชุด	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 453 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 327 ชุด	45.0
20. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	29.500	-	-	จัดซื้อรถพ่วงฉีดน้ำเพื่อรองรับการใช้งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ	10.0
21. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยน ทดแทนมิเตอร์จานหมุน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	77.767	-	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic จำนวน 12 สัญญา	- อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา จำนวน 3 สัญญา - ส่งมอบงานและอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย จำนวน 9 สัญญา	65.0
22. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/ อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	225.334	152.828	67.8	จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองและเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและ สายส่งในกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และสำรองฉุกเฉิน 1. Underground Cable จำนวน 10,000 เมตร 2. อุปกรณ์สวิตช์ จำนวน 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด	จัดหาอุปกรณ์ตามแผนงานแล้วตามรายละเอียดดังนี้ 1. อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบตามงวดงาน 2. ทำสัญญาแล้ว จำนวน 738 ชุด อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบตามงวดงาน จำนวน 928 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	50.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
23. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	320.880	54.302	16.9	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินรายละเอียด จำนวน 16 แห่ง	- จัดทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 13 แห่ง - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	45.5
24. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	161.315	40.155	24.9	งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	25.0
25. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	634.940	52.151	8.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 24 แห่ง	- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานสัญญา 19 แห่ง	20.8
					2. การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 7 แห่ง	- อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 4 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ 3 แห่ง	
					หมวดที่ดิน จำนวน 3 แห่ง หมวดยานพาหนะ - จัดซื้อรถเครนขนาด 35 ตัน และรถขุดตักดินตะขาบ ติดสว่าน ชุดเจาะ เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติแผน จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาแปลงที่ดิน จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างรอการส่งมอบรถ	15.0 55.0
26. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	366.504	48.591	13.3	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 สัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 สัญญา	20.0
27. แผนงาน Big Data Platform	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	54.000	-	-	- ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และ แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และ พัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	- การดำเนินงานล่าช้าโดยมีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข TOR ปัจจุบัน อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อออกประกวดราคาใหม่	15.0
28. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	174.996	43.215	24.7	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา เช่า	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
29. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟผ.	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	810.877	-	-	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟผ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้าน ไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟผ.	ทั้ง 2 ระบบ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	25.0
30. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	824.128	166.040	20.1	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง	- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างก่อสร้างตามงวดงาน จำนวน 3 แห่ง	40.0
31. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผัง บริเวณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการ ประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	150.000	-	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง โดยมีประเด็นที่ต้องจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง พิจารณาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง	0.0
32. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2566-2571	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	136.533	29.100	21.3	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
33. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	206.903	26.515	12.8	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 20 แห่ง	- อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 8 แห่ง - อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญาจำนวน 12 แห่ง	16.0
34. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและ โทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	399.980	97.112	24.3	ดำเนินการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network 2. พัฒนาโครงข่าย IP Access Network 3. ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 4. จัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อม และปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมคำดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง และตรวจรับเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	25.0
35. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกัน และควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	89.826	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 13 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ/ประมาณการ	26.0
36. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	56.580	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำประมาณการ	10.0
37. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้า ขัดข้อง (Outage Management System : OMS)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	259.438	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจ้างจากผู้มีอำนาจ	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
38. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	141.645	8.002	5.6	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	20.0
39. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยง ระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาส์มุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาส์ มุย 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	497.000	-	-	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้า เกาส์มุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาส์มุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	20.0
40. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อ เพิ่มความมั่นคง ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,387.152	306.271	22.1	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 50% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่ม ความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 50% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,160 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 2,976 งาน คิดเป็น 36.47% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 3,567 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 1,507 งาน คิดเป็น 42.25%	25.0
41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	348.545	1.029	0.3	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 15 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 20 แห่ง	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 19 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 1 แห่ง	20.0
42. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและ โทรคมนาคม ของ กฟภ. ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.555	0.008	0.0	1. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network 2. งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 3. งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN 4. งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ. 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ กฟภ. กับ สฟ.หนองจอก กฟผ. 6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP CCTV พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ ทดแทนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขา และคลังพัสดุ	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำขอบเขตงาน	5.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
43. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	47.470	-	-	1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 2. ITSM Assessment and Implementation 3. การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	1. อยู่ระหว่างจัดทำสเปค 2. อยู่ระหว่างรอเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของมหาดไทย ต่อไป 3. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาสำหรับระบบควบคุมความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเครือข่าย IT	25.0
44. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	11.500	-	-	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดทำสเปค	10.0
45. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	44.565	-	-	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างสำรวจ และประมาณการ	20.0
46. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	49.200	-	-	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ	18.0
47. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10.800	0.068	0.6	จ้างออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านบริการลูกค้า	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	10.0
48. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	229.382	-	-	1. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย 2. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	39.0
49. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	65.189	-	-	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	10.0
50. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	102.783	-	-	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 9 งาน	ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 2 งาน คงเหลืออยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และออกประกวดราคา 7 งาน	16.7
51. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	243.825	-	-	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วย 2 ระบบ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน	25.0
รวมแผนงานระยะยาว		10,690.525	1,475.575	13.8			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		26,243.790	3,948.463	15.0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	204.640	43.472	21.2	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม 2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อม ระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนดใน ไตรมาส 1 ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนดใน ไตรมาส 1	22.0 21.0
รวม		204.640	43.472	21.2			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		36,448.884	5,596.890	15.4			
