





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

สถานะ 30 มิถุนายน 2568

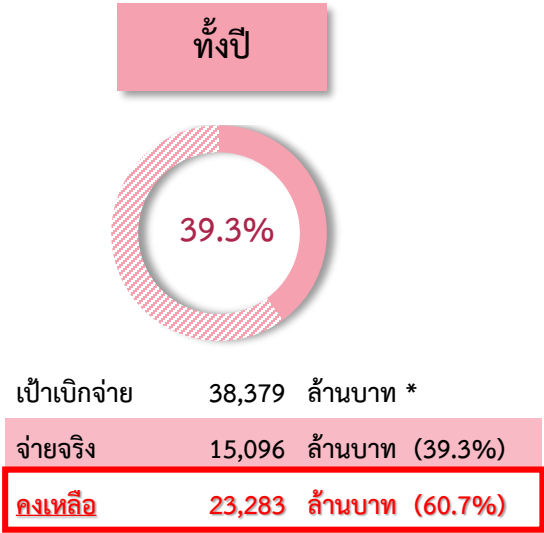

* - มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ
- สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่าย จาก 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท เป็น 120,789.900 ล้านบาท และ 38,379.127 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส

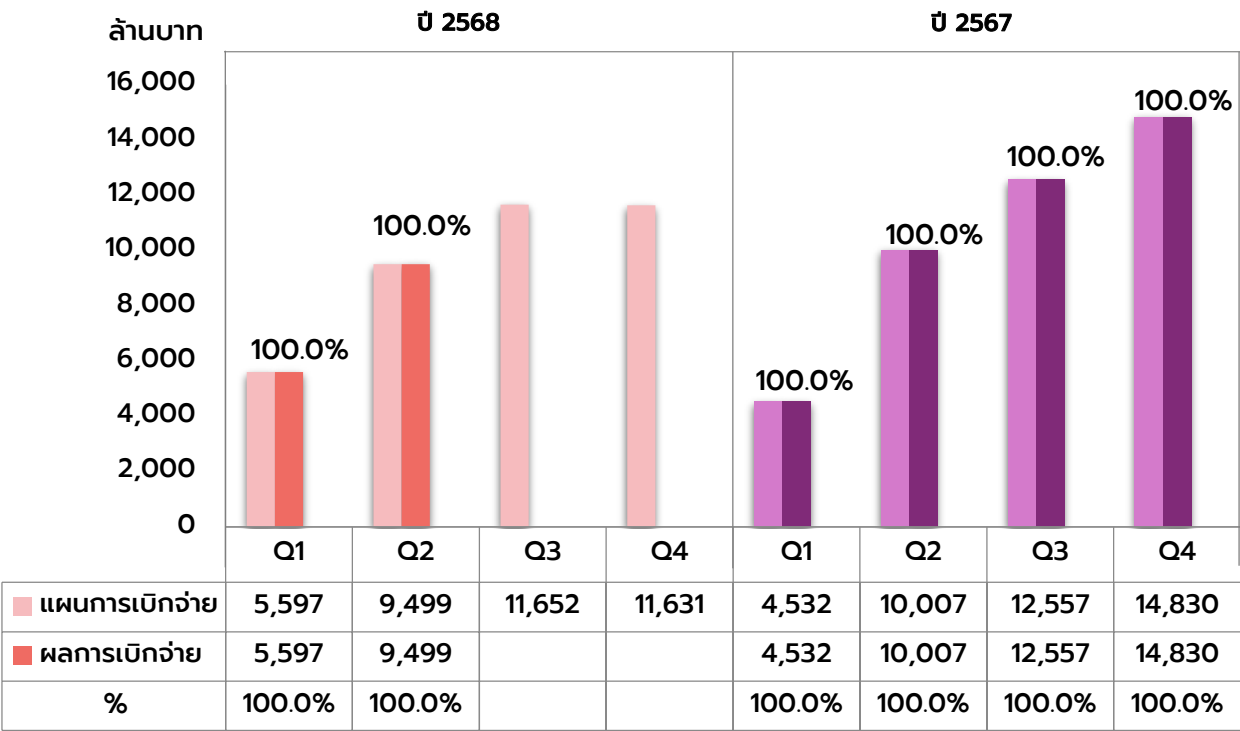

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

สถานะ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	ม.ค. - มิ.ย. 2568			%จ่ายจริง
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		เทียบกับเป้าหมาย
			วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	9,727.692	5,837.381	6,251.799	107.1	64.3
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	9,199.800	8,737.910	95.0	30.7
- รายปี	17,534.775	5,145.473	5,080.802	98.7	29.0
- ระยะยาว	10,971.264	4,054.327	3,657.108	90.2	33.3
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	59.070	106.542	180.4	73.3
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	15,096.251	15,096.251	100.0	39.3

รายละเอียดงาน

สถานะ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	ม.ค. - มิ.ย. 2568			% จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	0.500	0.500	0.450	90.0	90.0
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	122.154	59.396	62.218	104.8	50.9
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	118.851	103.846	20.124	19.4	16.9
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.267	81.717	4.964	6.1	3.0
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	0.100	0.100	0.100	100.0	100.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	2.000	0.990	4.908	495.8	245.4
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,300.000	450.000	1,167.985	259.6	89.8
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	731.688	385.745	367.831	95.4	50.3
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	96.256	85.256	90.755	106.4	94.3
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	0.500	0.500	0.651	130.2	130.2
11. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	496.101	378.832	239.467	63.2	48.3
12. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.000	2.500	1.934	77.4	7.7
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,500.000	3,159.160	3,160.640	100.0	57.5
14. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,166.275	1,128.839	1,129.772	100.1	96.9
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	9,727.692	5,837.381	6,251.799	107.1	64.3
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,534.775	5,145.473	5,080.802	98.7	29.0
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,971.264	4,054.327	3,657.108	90.2	33.3
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	9,199.800	8,737.910	95.0	30.7
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	82.397	41.196	61.891	150.2	75.1
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	62.999	17.874	44.651	249.8	70.9
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	59.070	106.542	180.4	73.3
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	15,096.251	15,096.251	100.0	39.3

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	9,727.692	6,251.799	64.3
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28,506.039	8,737.910	30.7
2.1 งานรายปี		17,534.775	5,080.802	29.0
2.2 แผนงานระยะยาว		10,971.264	3,657.108	33.3
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	106.542	73.3
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		38,379.127	15,096.251	39.3

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ							
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.450	90.0	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง	33.3
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	122.154	62.218	50.9	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสุดท้ายของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	92.1
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.851	20.124	16.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน อยู่ระหว่าง กฟผ. แบ่งแยกโฉนดเพื่อขายให้ กฟผ.	15.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	168.267	4.964	3.0	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	47.9
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.100	0.100	100.0	งานก่อสร้างเพื่อรองรับงานติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 1 แห่ง	99.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.000	4.908	245.4	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง	30.0
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,300.000	1,167.985	89.8	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี จำนวน 7 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ระยะทาง 1,947.00 วงจร-กม.	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาดำเนินการได้มากกว่าแผนที่คาดไว้ จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 261.00 วงจร-กม.	44.9
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	731.688	367.831	50.3	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	66.3

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	96.256	90.755	94.3	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง	53.0
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.651	130.2	งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 5 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ 3 แห่ง	60.0
11. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมณ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	496.101	239.467	48.3	งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12,000 ชุด	ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 8,000 ชุด	67.0
12. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.000	1.934	7.7	งานจ้างเหมาก่อสร้าง Concrete Matt เพื่อป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำ ไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นน้ำ หรือท้องเรือที่จะมากระทบ จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงดงานของสัญญา	50.0
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5,500.000	3,160.640	57.5	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 33 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 9 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 2,551.356 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 495.273 วงจร-กม. - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี - งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 25 แห่ง แล้วเสร็จ 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงดงานของสัญญา 20 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ จำนวน 8 แห่ง แล้วเสร็จ 6 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงดงานของ สัญญา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง - งานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ จำนวน 7 แห่ง แล้วเสร็จ 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงดงานของสัญญา 2 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ลูบไล้ จำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงดงานของสัญญา 2 แห่ง 3. ดำเนินแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,392.214 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 330.397 วงจร-กม. - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	69.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
14. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,166.275	1,129.772	96.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จำนวน 1 แห่ง 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) จำนวน 2 แห่ง - บริเวณเกาะพะงัน - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) - บริเวณเกาะพะงัน ดำเนินการแล้วเสร็จ - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.0
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		9,727.692	6,251.799	64.3			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	17,534.775	5,080.802	29.0			
					หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน ประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหามอเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณีหม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้งรีดออน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ) หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.	- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน - อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 4 แห่ง - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 1 แห่ง 1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - อยู่ระหว่างประกาศกำหนดให้เสนอราคาทางระบบ e-GP ทั้งหมด 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน - อยู่ระหว่างกระบวนการจ่ายเงินตามงวดงาน โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จครบจำนวน use case ตามสัญญา	
รวมงานรายปี		17,534.775	5,080.802	29.0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	35.346	30.190	85.4	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง 2. การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ - อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 1 แห่ง	35.0
2. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.477	228.477	100.0	1. งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขความชำรุดและสนับสนุนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบงาน	1. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	100.0
3. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5.853	-	-	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - ดำเนินการพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ฯ 2. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพไฟฟ้า	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - อยู่ระหว่างหาแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน 2. การจัดทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	20.0
4. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	24.902	-	-	1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ตามแผนงาน GIS.3 2. การพัฒนาเชื่อมโยง Map Service ของสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจากระบบ TAMS มาแสดงผลในระบบ GIS	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	20.0
5. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	68.472	50.573	73.9	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 4 สถานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	79.0
6. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	229.846	105.333	45.8	หมวดสิ่งก่อสร้าง - การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 17 แห่ง - การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 5 แห่ง	หมวดสิ่งก่อสร้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 17 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 5 แห่ง	55.1
7. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	18.524	12.870	69.5	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	50.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
8. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.846	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย : เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ มีความเสถียรและครอบคลุม - งานปรับปรุงพื้นที่ (งานทำประตุน้ำ) : เพื่อจัดการระบบระบายน้ำ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากน้ำท่วม	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง จำนวน 3 รายการ 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา	20.0
9. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า เสื่อมสภาพ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	42.224	15.639	37.0	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เครื จำนวน 3 สถานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	50.0
10. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เครื	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	88.783	49.727	56.0	งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เครื จำนวน 7 สถานี	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 7 สถานี	65.9
11. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	0.029	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน 2. คริวเรือน จำนวน 1,680 คริวเรือน	ปัจจุบัน ครม. มีมติผ่อนผัน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 และอยู่ระหว่าง ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้	-
12. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.305	0.170	0.7	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	9.0
13. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	67.147	14.057	20.9	แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	53.0
14. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10.429	9.189	88.1	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	33.3
15. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดย ใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลัง พัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	45.316	37.497	82.7	1. ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License) 2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุนขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวาง พัสดุนขนาดเล็ก Micro Rack	1. ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับ ระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License) เรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุนขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวางพัสดุ ขนาดเล็ก Micro Rack อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	95.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	6.727	-	-	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย	90.0
17. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	202.400	183.213	90.5	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายถนนของกรมทางหลวง - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 90% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 90% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าฯ - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,063 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 15,991 งาน คิดเป็น 93.72% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,049 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 7,742 งาน คิดเป็น 96.19%	50.0
18. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	29.417	6.908	23.5	1. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) 2. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) 3. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - จัดหาระบบ Contact Center ทดแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ Service Desk 1 ระบบ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดสัญญา 2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	40.0
19. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.550	0.003	0.1	1. งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy) 2. งานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารโรงเก็บ เสาธง ถนน-ลาน รวางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟส.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	1. จัดทำและออกแบบประมาณการอาคาร (PEA Academy) สำหรับหาผู้รับจ้างดำเนินการต่อจากผู้รับจ้างเดิมซึ่งละทิ้งงาน 2. ได้รับงบประมาณในไตรมาส 2 อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	5.0
20. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	55.396	38.088	68.8	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	33.3
21. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	130.484	64.950	49.8	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	33.3
22. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.980	31.593	13.8	เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จำนวน 25 สถานี	- อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 16 สถานี - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 9 สถานี	29.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
23. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.480	20.303	64.5	งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวน 780 ชุด	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 553 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 227 ชุด	65.0
24. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	628.265	111.494	17.7	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic จำนวน 12 สัญญา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 สัญญา - แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อลงนาม จำนวน 2 สัญญา - ส่งมอบงานและอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย จำนวน 9 สัญญา	70.0
25. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	246.506	205.275	83.3	จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองและเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและสายส่งในกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และสำรองฉุกเฉิน 1. Underground Cable จำนวน 10,000 เมตร 2. อุปกรณ์สวิตช์ จำนวน 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด	จัดหาอุปกรณ์ตามแผนงานแล้วตามรายละเอียดดังนี้ 1. อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบตามงวดงาน จำนวน 7,500 เมตร และจัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,500 เมตร 2. ทำสัญญาแล้ว จำนวน 430 ชุด อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบตามงวดงาน จำนวน 1,236 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	58.0
26. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	342.648	158.213	46.2	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินรายละเอียดจำนวน 16 แห่ง	- จัดทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 14 แห่ง - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	55.0
27. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	162.695	80.654	49.6	งานเช่าระบบ BESS พักใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	28.0
28. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	607.351	166.621	27.4	หมวดสิ่งก่อสร้าง		
					1. การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 24 แห่ง	- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา 21 แห่ง	
					2. การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 7 แห่ง	- อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ 3 แห่ง	
					หมวดที่ดิน จำนวน 3 แห่ง	- อยู่ระหว่างจัดหาแปลงที่ดิน จำนวน 2 แห่ง - จัดซื้อแล้ว 1 แห่ง	25.0
					หมวดยานพาหนะ		
					- จัดซื้อรถเครนขนาด 35 ตัน และรถชุดตัดกิ่งตะขาบ ติดส่วนชุดเจาะ เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างรอการส่งมอบรถ	55.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
29. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	264.652	55.518	21.0	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าจำนวน 5 สัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 สัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 สัญญา	55.0
30. แผนงาน Big Data Platform	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	6.000	-	-	ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	การดำเนินงานล่าช้าโดยมีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข TOR ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อออกประกวดราคาใหม่	15.0
31. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2565-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	174.865	86.763	49.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	33.3
32. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ.	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	788.685	-	-	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟภ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ.	1. ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 2. ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว	50.0
33. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	966.302	380.539	39.4	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง	- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างก่อสร้างตามงวดงาน จำนวน 3 แห่ง	45.0
34. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	23.850	-	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง โดยมีประเด็นที่ต้องจัดส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง	4.0
35. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	139.593	69.438	49.7	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	33.3
36. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	135.930	57.545	42.3	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 20 แห่ง	- อยู่ระหว่างบริษัทเสนอราคา จำนวน 8 แห่ง - อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญาจำนวน 12 แห่ง	19.0
37. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	40.570	-	-	ระบบบริหารข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform) 1 ระบบ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งและส่งมอบงาน	80.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	388.816	122.180	31.4	ดำเนินการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network 2. พัฒนาโครงข่าย IP Access Network 3. ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 4. จัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจสอบ และปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมค่าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง, ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	30.0
39. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	62.264	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวจำนวน 13 แห่ง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำประมาณการ	30.0
40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.120	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำประมาณการ	10.0
41. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	95.220	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจ้างจากผู้มีอำนาจ	25.0
42. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	72.777	42.311	58.1	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	25.0
43. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสมุย 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	52.000	-	-	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา TOR เพื่อออกประกวดราคาใหม่	20.0
44. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2,257.562	1,166.718	51.7	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 50% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 50% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,765 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 3,004 งาน คิดเป็น 34.27% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 3,921 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 1,575 งาน คิดเป็น 40.17%	50.0
45. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	337.438	44.162	13.1	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 15 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 20 แห่ง	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 16 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 4 แห่ง	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.556	1.101	0.9	1. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network 2. งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 3. งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN 4. งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ กฟผ. กับ สฟ.หนองจอก กฟผ. 6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP CCTV พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ ทดแทนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขา และคลังพัสดุ	- อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำขอบเขตงาน - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 1 สัญญา	10.0
47. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	47.470	4.093	8.6	1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 2. ITSM Assessment and Implementation 3. การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	1. อยู่ระหว่างจัดทำสเปก และจัดทำสัญญา 2. อยู่ระหว่างรอเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของมหาดไทยต่อไป 3. ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งและส่งมอบงาน	50.0
48. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	12.000	-	-	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ	VT GIS 115kV อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง	5.0
49. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	33.100	-	-	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	10.0
50. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28.815	-	-	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ	22.0
51. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	14.200	-	-	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา	20.0
52. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.217	43.4	จ้างออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านบริการลูกค้า	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ	15.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 2)	ร้อยละ			
53. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.285	5.448	1.6	1. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย 2. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน	- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จำนวน 3 รายการ และรอตรวจรับระบบ 1 รายการ - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 8 ระบบ , รอตรวจรับระบบ 1 รายการ และยกเลิกตามอนุมัติ จำนวน 4 ระบบ - อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำสัญญา จำนวน 6 ระบบ และยกเลิกตามอนุมัติ จำนวน 2 ระบบ (ดำเนินการด้วยงบลงทุนเร่งด่วนปี 2568)	45.0
54. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	43.340	-	-	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	15.0
55. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	76.050	0.009	-	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 9 งาน	ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 2 งาน คงเหลืออยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และออกประกวดราคา 7 งาน	20.0
56. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.935	-	-	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วย 2 ระบบ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	35.0
57. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	500.000	-	-	งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปีค่างานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 25% ของงานทั้งหมด	อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้แก่แต่ละเขต	-
รวมแผนงานระยะยาว		10,971.264	3,657.108	33.3			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		28,506.039	8,737.910	30.7			

3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	106.542	73.3	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	33.0
					2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	25.0
รวม		145.396	106.542	73.3			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		38,379.127	15,096.251	39.3			
