





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

สถานะ 30 กันยายน 2568

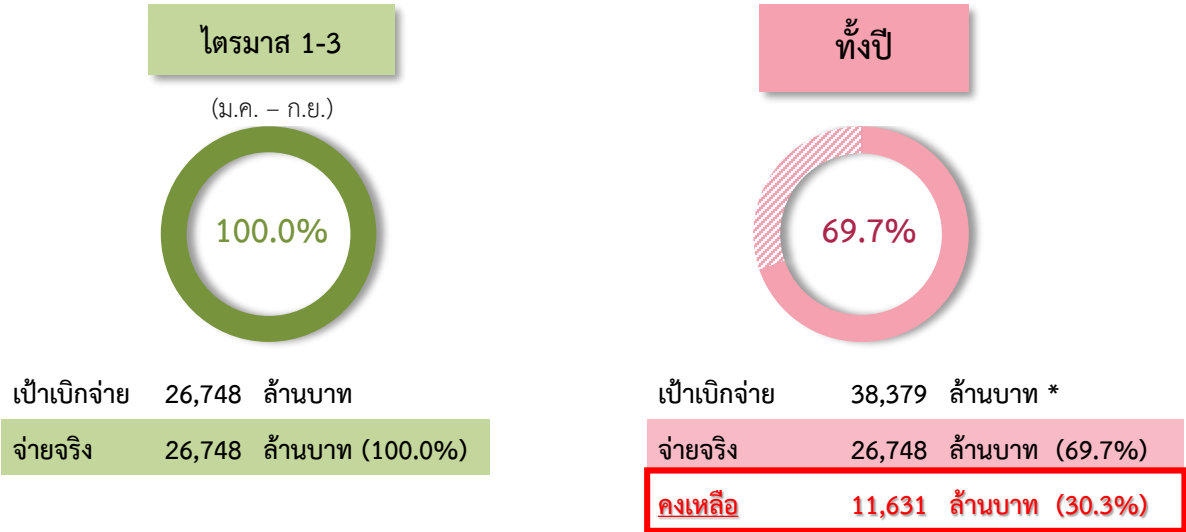

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส

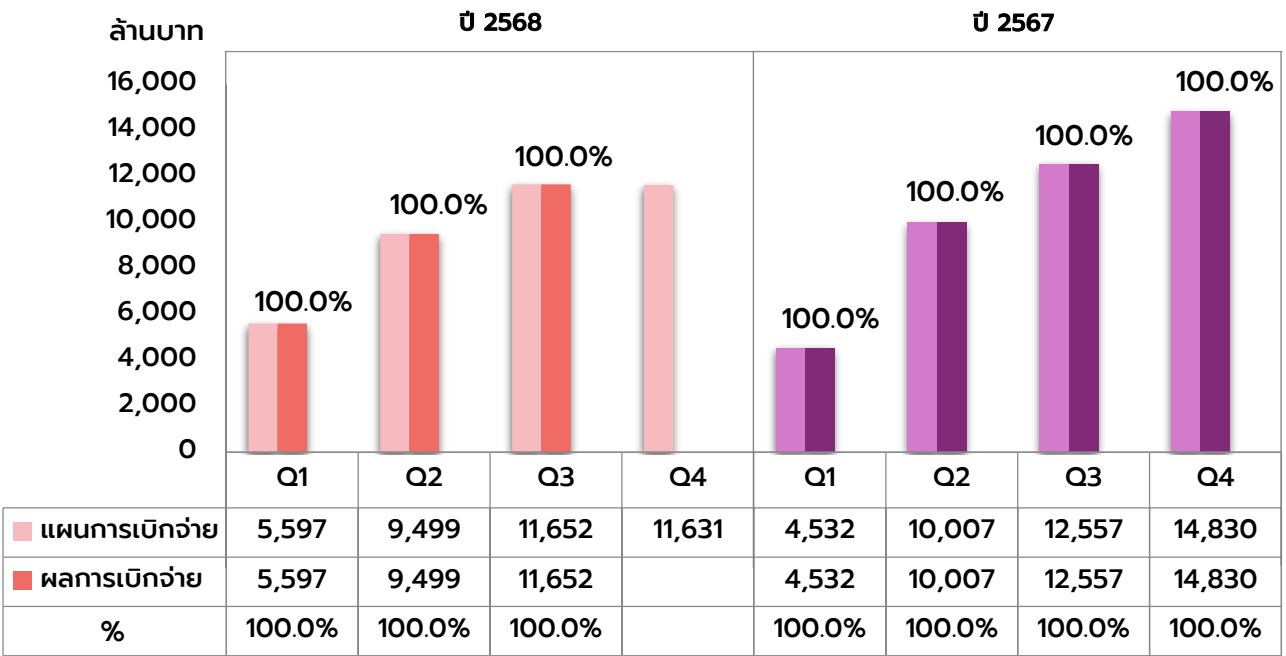

*หมายเหตุ

1) มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ

2) สศช. พิจารณาให้ปรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายประจำปี 2568 ลดวงเงินงบประมาณ 800.410 ล้านบาท และลดเป้าเบิกจ่าย 77.945 ล้านบาท

3) สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่าย จาก 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท เป็น 120,789.900 ล้านบาท และ 38,379.127 ล้านบาท

4) มติ ครม. 1 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วงเงินเต็มโครงการ 255 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่ายในปี 2568 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 120,789.900 ล้านบาท เป็น 121,044.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

5) มติ ครม. 2 กันยายน 2568 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพ.ม.3) วงเงินเต็มโครงการ 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2568 มีวงเงินลงทุน 700 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 121,044.900 ล้านบาท เป็น 121,744.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

สถานะ 30 กันยายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2568	ม.ค. - ก.ย. 2568			%จ่ายจริงเทียบกับ
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		เป้าหมาย 12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	9,727.692	7,803.957	9,042.402	115.9	93.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	18,842.107	17,557.320	93.2	61.6
- รายปี	17,534.775	11,435.223	10,520.449	92.0	60.0
- ระยะยาว	10,971.264	7,406.884	7,036.871	95.0	64.1
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	102.140	148.482	145.4	102.1
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	26,748.204	26,748.204	100.0	69.7

รายละเอียดงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2568	ม.ค. - ก.ย. 2568			% จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	0.500	0.500	0.359	71.8	71.8
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	122.154	79.696	93.319	117.1	76.4
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	118.851	107.846	20.230	18.8	17.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.267	118.607	96.027	81.0	57.1
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	0.100	0.100	0.130	130.0	130.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	2.000	1.485	11.442	770.5	572.1
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,300.000	800.000	1,531.365	191.4	117.8
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	731.688	633.569	540.810	85.4	73.9
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	96.256	93.256	190.695	204.5	198.1
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	0.500	0.500	0.753	150.6	150.6
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	-	-
12. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	496.101	495.201	396.191	80.0	79.9
13. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะป็นหยี จ.พังงา) (คคป.)	25.000	2.500	1.997	79.9	8.0
14. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,500.000	4,341.858	5,000.127	115.2	90.9
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,166.275	1,128.839	1,158.957	102.7	99.4
16. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	-	-	-	-	-
17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	9,727.692	7,803.957	9,042.402	115.9	93.0
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,534.775	11,435.223	10,520.449	92.0	60.0
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	10,971.264	7,406.884	7,036.871	95.0	64.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	18,842.107	17,557.320	93.2	61.6
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	82.397	61.794	81.162	131.3	98.5
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	62.999	40.346	67.320	166.9	106.9
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	102.140	148.482	145.4	102.1
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	26,748.204	26,748.204	100.0	69.7

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	9,727.692	9,042.402	93.0
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28,506.039	17,557.320	61.6
2.1 งานรายปี		17,534.775	10,520.449	60.0
2.2 แผนงานระยะยาว		10,971.264	7,036.871	64.1
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	148.482	102.1
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		38,379.127	26,748.204	69.7

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ							
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.359	71.8	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	78.0
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	122.154	93.319	76.4	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสุดท้ายของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	95.0
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.851	20.230	17.0	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน มีอนุมัติจัดซื้อที่ดินอยู่ระหว่างรอตรวจรับ	30.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	168.267	96.027	57.1	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	70.2
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.100	0.130	130.0	งานก่อสร้างเพื่อรองรับงานติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	100.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.000	11.442	572.1	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง	70.0
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,300.000	1,531.365	117.8	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี จำนวน 7 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ระยะทาง 1,947.00 วงจร-กม.	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 5 แห่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 851.87 วงจร-กม.	59.7
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	731.688	540.810	73.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	73.7

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	96.256	190.695	198.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง	80.0
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.753	150.6	งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 5 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง	100.0
11. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	496.101	396.191	79.9	งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12,000 ชุด	ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10,000 ชุด	85.0
12. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.000	1.997	8.0	งานจ้างเหมาก่อสร้าง Concrete Matt เพื่อป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำ ไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นน้ำ หรือท้องเรือที่จะมากระทบ จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	55.0
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5,500.000	5,000.127	90.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 33 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 9 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 2,551.356 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 495.273 วงจร-กม. - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี - งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 25 แห่ง แล้วเสร็จ 9 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 16 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ แล้ว เสร็จจำนวน 8 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง - งานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ แล้วเสร็จจำนวน 7 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ลูบไล่น้ำ จำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 2 แห่ง 3. ดำเนินแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,637.667 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 330.397 วงจร-กม. - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	97.8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
14. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,166.275	1,158.957	99.4	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จำนวน 1 แห่ง 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) จำนวน 2 แห่ง - บริเวณเกาะพะงัน - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) - บริเวณเกาะพะงัน ดำเนินการแล้วเสร็จ - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.0
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		9,727.692	9,042.402	93.0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	17,534.775	10,520.449	60.0			
					หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟ ทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน ประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 1.งานจัดหาหม้อเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหาหม้อเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยน ตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณี หม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รี้ออน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ) หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.	- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน 2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 4 แห่ง 1.งานจัดหาหม้อเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - อยู่ระหว่างประกาศกำหนดให้เสนอราคาทางระบบ e-GP ทั้งหมด 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน - อยู่ระหว่างกระบวนการจ่ายเงินตามงวดงาน โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ให้แล้วเสร็จครบจำนวน use case ตามสัญญา	
รวมงานรายปี		17,534.775	10,520.449	60.0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	35.346	44.952	127.2	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง 2. การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 1 แห่ง	40.0
2. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.477	228.477	100.0	1. งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขความชำรุดและสนับสนุนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบงาน	1. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	100.0
3. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5.853	-	-	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - ดำเนินการพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ฯ 2. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพไฟฟ้า	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - อยู่ระหว่างหาแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน 2. การจัดทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	22.0
4. แผนงานพัฒนากฎิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	24.902	11.238	45.1	1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ตามแผนงาน GIS.3 2. การพัฒนาเชื่อมโยง Map Service ของสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจากระบบ TAMS มาแสดงผลในระบบ GIS	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายตามสัญญาแล้ว 1 งวด	40.0
5. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	68.472	68.472	100.0	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 4 สถานี	อยู่ระหว่างดำเนินการปิดงาน	99.0
6. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	229.846	134.072	58.3	หมวดสิ่งก่อสร้าง - การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 17 แห่ง - การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 5 แห่ง	หมวดสิ่งก่อสร้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 16 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 5 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง	56.2

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
7. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	18.524	16.602	89.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	75.0
8. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.846	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย : เพื่อให้การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ มีความเสถียรและครอบคลุม - งานปรับปรุงพื้นที่ (งานทำประตุน้ำ) : เพื่อจัดการระบบระบายน้ำ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากน้ำท่วม	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง จำนวน 3 รายการ 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา	20.0
9. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า เสื่อมสภาพ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	42.224	42.224	100.0	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 3 สถานี	อยู่ระหว่างดำเนินการปิดงาน	99.0
10. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	88.783	88.544	99.7	งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี จำนวน 7 สถานี	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าประสานงาน และดำเนินการปิดงาน	99.9
11. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	0.120	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน 2. คริวเรือน จำนวน 1,680 คริวเรือน	ปัจจุบัน ครม. มีมติผ่านเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 และอยู่ระหว่าง ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางและจัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 3 เส้นทาง จาก 11 เส้นทาง ที่ได้รับอนุญาตให้ ใช้พื้นที่	5.0
12. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.305	0.267	1.1	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	12.0
13. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	67.147	22.463	33.5	แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา จำนวน 2 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	60.0
14. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10.429	10.249	98.3	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	75.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
15. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	45.316	37.727	83.3	1. ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License) 2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุนาขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวางพัสดุนาขนาดเล็ก Micro Rack	1. ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License) เรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุนาขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวางพัสดุนาขนาดเล็ก Micro Rack อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	95.0
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	6.727	7.089	105.4	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850	เบิกจ่ายครบถ้วน - อยู่ระหว่างขั้นตอนปิดงาน	99.0
17. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	202.400	201.976	99.8	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายถนนของกรมทางหลวง - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 90% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 90% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าฯ - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,058 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 16,123 งาน คิดเป็น 94.51% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,045 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 7,781 งาน คิดเป็น 96.72%	99.9
18. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	29.417	13.604	46.2	1. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) 2. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) 3. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - จัดหาระบบ Contact Center ทดแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ Service Desk 1 ระบบ	1. ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	60.0
19. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.550	0.006	0.2	1. งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy) 2. งานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารโรงเก็บ เสาธง ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟส.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	1. อนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนที่เหลือ) ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง จากสาเหตุที่ผู้รับเดิมซึ่งละทิ้งงาน 2. ระหว่างประกวดราคา	10.0
20. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	55.396	47.274	85.3	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
21. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	130.484	97.644	74.8	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0
22. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.980	66.350	29.0	เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจำนวน 25 สถานี	- อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 16 สถานี - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 3 สถานี - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 6 สถานี - จัดซื้ออุปกรณ์ต่อปลายสาย จำนวน 150 ชุด อยู่ระหว่างจัดซื้อ	33.0
23. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.480	32.873	104.4	งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวน 780 ชุด	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 553 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับจำนวน 120 ชุด ของเขต กฟต.2 และ กฟต.3	80.0
24. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	628.265	324.634	51.7	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic จำนวน 12 สัญญา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 สัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 7 สัญญา	80.0
25. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	246.506	258.875	105.0	จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองและเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและสายส่งในกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และสำรองฉุกเฉิน 1. Underground Cable จำนวน 10,000 เมตร 2. อุปกรณ์สวิตช์ จำนวน 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด	จัดหาอุปกรณ์ตามแผนงานแล้วตามรายละเอียดดังนี้ 1. จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10,000 เมตร 2. จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100.0
26. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	342.648	348.756	101.8	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินรายละเอียดจำนวน 16 แห่ง	- จัดทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 14 แห่ง - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	60.0
27. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	162.695	121.500	74.7	งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	70.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
28. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	607.351	356.514	58.7	หมวดสิ่งก่อสร้าง	- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานสัญญา 24 แห่ง - อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 4 แห่ง - อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ 18 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาแปลงที่ดิน จำนวน 2 แห่ง - จัดซื้อแล้ว 1 แห่ง - ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	55.0
					1. การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 24 แห่ง		
					2. การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 7 แห่ง		
					หมวดที่ดิน จำนวน 3 แห่ง		
					หมวดยานพาหนะ - จัดซื้อรถเครนขนาด 35 ตัน และรถขุดตักดินตะขาบ ติดสว่าน ขุดเจาะ เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า		
29. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกัน และควบคุมในสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	264.652	87.577	33.1	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 สัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 สัญญา	60.0
30. แผนงาน Big Data Platform	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	6.000	-	-	ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และ แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	การดำเนินงานล่าช้าโดยมีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข TOR ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสำนักอัยการฯ ตรวจร่างสัญญา และขออนุมัติจ้างจาก ผวก.	20.0
31. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	174.865	130.645	74.7	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	75.0
32. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟผ.	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	788.685	759.712	96.3	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟผ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้าน ด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟผ.	1. ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน 2. ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน	98.0
33. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	966.302	461.573	47.8	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง	- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง - อยู่ระหว่างก่อสร้างตามวงงาน จำนวน 11 แห่ง	55.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
34. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	23.850	-	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร	อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติจัดจ้าง	8.0
35. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2566-2571	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	139.593	107.567	77.1	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0
36. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	135.930	76.107	56.0	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 20 แห่ง	- อยู่ระหว่างบริษัทเสนอราคา จำนวน 8 แห่ง - ติดตั้งระบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างปิดงานจำนวน 12 แห่ง	39.0
37. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	40.570	40.000	98.6	ระบบบริหารข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform) 1 ระบบ	ปัจจุบันดำเนินการติดตั้ง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	100.0
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	388.816	157.219	40.4	ดำเนินการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง IP Core Network 2. พัฒนาโครงข่าย IP Access Network 3. ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 4. จัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อม และปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง, ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	35.0
39. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	62.264	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวจำนวน 13 แห่ง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำประมาณการ	33.0
40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.120	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแผน	14.0
41. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	95.220	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจ้างจากผู้มีอำนาจ	25.0
42. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	72.777	64.893	89.2	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	65.0
43. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสุมย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสุมย 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	52.000	0.048	0.1	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสุมย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสุมย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา TOR เพื่อออกประกวดราคาใหม่	20.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
44. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2,257.562	2,131.411	94.4	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 50% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 50% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,912 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 3,754 งาน คิดเป็น 42.12% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 4,065 งาน และปิดงานก่อสร้าง จำนวน 1,844 งาน คิดเป็น 45.36%	96.0
45. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	337.438	112.769	33.4	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 15 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 20 แห่ง	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 9 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 14 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 6 แห่ง	35.0
46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.556	36.228	30.6	1. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network 2. งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 3. งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN 4. งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ กฟผ. กับ สฟ.หนองจอก กฟผ. 6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP CCTV พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ ทดแทนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขา และคลังพัสดุ	- อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำขอบเขตงาน - เบิกจ่ายครบตามสัญญา 1 สัญญา - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 3 สัญญา	45.0
47. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	47.470	21.766	45.9	1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 2. ITSM Assessment and Implementation 3. การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	1. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญากลาง 2 รายการ และรอส่งมอบพร้อมประชุม kick-off ไตรมาส 4 2. อยู่ระหว่างรอขอพิจารณาพิจารณาจากผู้วิจารณ์ 3. ปัจจุบันดำเนินการติดตั้ง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	65.0
48. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	12.000	-	-	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ	VT GIS 115kV อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง	8.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
49. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	33.100	-	-	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115เควี ของสถานีไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดหา และทำสัญญา	13.0
50. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสาย เคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28.815	9.090	31.5	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา	25.5
51. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลง ไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	14.200	4.060	28.6	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการ ปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา	22.0
52. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.429	85.8	จ้างออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านบริการลูกค้า	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ	60.0
53. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.285	85.215	24.7	1. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย 2. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ ฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน	- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จำนวน 3 รายการ และรอตรวจรับระบบ 1 รายการ - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 3 ระบบ , รอประกาศผู้ชนะ 1 รายการ และยกเลิกตามอนุมัติ จำนวน 4 ระบบ และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ - อยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งโปรแกรมแกรม และตรวจสอบ จำนวน 6 ระบบ และยกเลิกตามอนุมัติ จำนวน 2 ระบบ (ดำเนินการด้วยงบลงทุนเร่งด่วน ปี 2568)	60.0
54. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	43.340	4.214	9.7	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า และดำเนินการเพื่อจัดเช่า	35.0
55. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	76.050	20.348	26.8	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 9 งาน	ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 5 งาน , อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา 2 งาน และออกแบบกับออกประกวดราคา 7 งาน	20.0
56. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.935	140.600	40.6	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วย 2 ระบบ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	60.6

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1 - 3)	ร้อยละ			
57. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	500.000	2.898	0.6	งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 25% ของงานทั้งหมด	อยู่ระหว่างจัดสรรงบให้แต่ละเขตและดำเนินการตามงานก่อสร้างฯ	1.0
รวมแผนงานระยะยาว		10,971.264	7,036.871	64.1			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		28,506.039	17,557.320	61.6			

3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	148.482	102.1	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	75.0
					2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	65.0
รวม		145.396	148.482	102.1			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		38,379.127	26,748.204	69.7			
