




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2569

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สถานะ 31 มีนาคม 2569


ไตรมาส 1

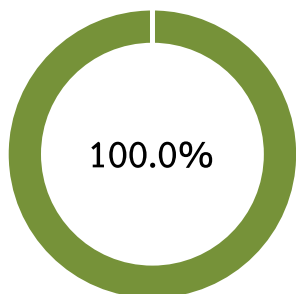

เป้าเบิกจ่าย 5,227 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท

ทั้งปี

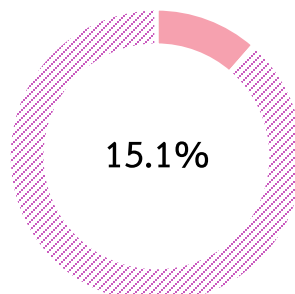


เป้าเบิกจ่าย 34,673 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท (15.1%)

คงเหลือ 29,446 ล้านบาท (84.9%)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และ 2568 รายไตรมาส

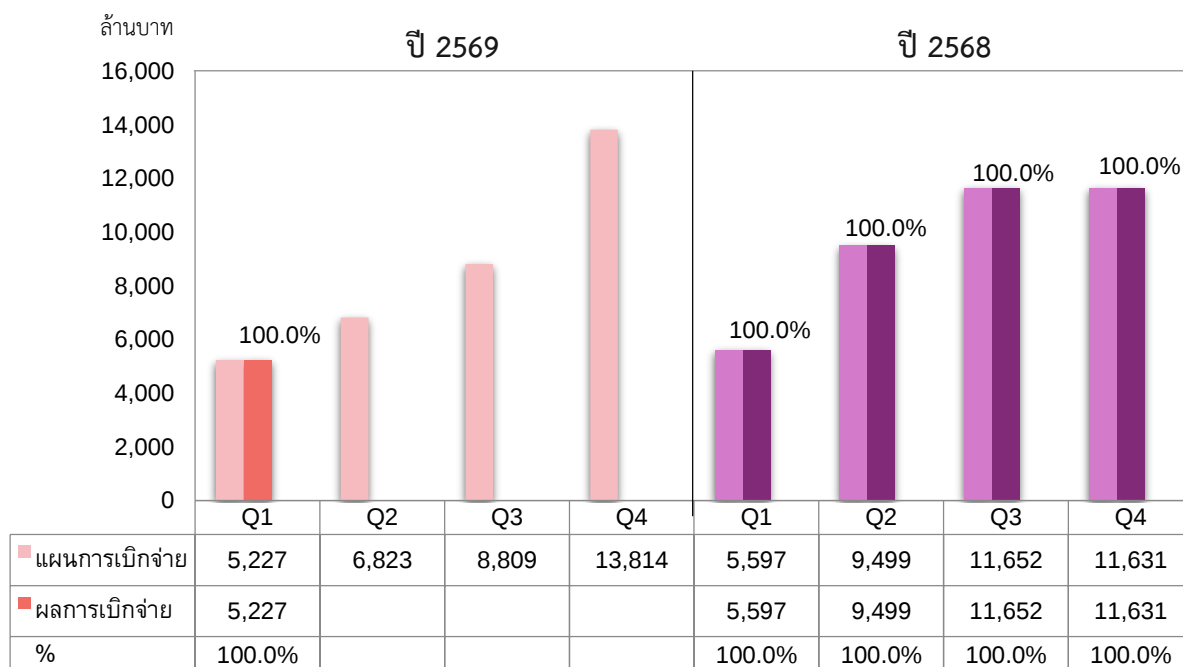

หมายเหตุ:

- มติ ครม. 14 ตุลาคม 2568 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2569 วงเงิน 105,324.420 ล้านบาท และ 34,398.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- ตามความเห็นชอบของ สศช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการโครงการ คพม.3 วงเงิน 1,400 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 274 ล้านบาท ทำให้วงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 106,724.420 ล้านบาท และ 34,672.951 ล้านบาท ตามลำดับ

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2568

สถานะ 31 มีนาคม 2569

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับ กับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	95.5	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
- รายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
- ระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	125.5	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	70.000	11.156	0.011	-	0.0
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	191.070	75.190	1.151	1.5	0.6
3. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	500.000	50.000	158.737	317.5	31.7
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	53.090	43.690	32.330	74.0	60.9
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	157.000	53.000	12.128	22.9	7.7
6. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	190.002	-	-	-	-
7. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	116.189	115.289	-	-	-
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	3,500.000	857.326	1,475.032	172.1	42.1
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	25.500	-	-	-	-
11. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	274.000	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	139.3	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	90.537	20.733	31.659	152.7	35.0
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	119.803	22.834	23.034	100.9	19.2
แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	70.812	-	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	253.6	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5,076.851	1,679.389	33.1
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	29,314.948	3,492.347	11.9
2.1 งานรายปี		16,697.833	1,920.301	11.5
2.2 แผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	281.152	54.693	19.5
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		34,672.951	5,226.429	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ							
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	70.000	0.011	0.02	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบสถานีไฟฟ้า	13.6
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	191.070	1.151	0.6	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา	30.2
3. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	500.000	158.737	31.7	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ สายส่ง 115/22 เควี จำนวน 2 แห่ง	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ.อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน พิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ของสัญญา และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี ดำเนินการแล้วเสร็จ	34.6
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	53.090	32.330	60.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	1.8
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	157.000	12.128	7.7	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง 2. งานเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	41.8
6. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถใน การจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	190.002	-	-	งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง	โครงการมีคดีความฟ้องร้อง อยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาคดี	-
7. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	116.189	-	-	ปิดโครงการ	ปี 2568 ดำเนินงานครบตามแผนงานแล้ว และจะอนุมัติปิดโครงการ ในปี 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ	100.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	3,500.000	1,475.032	42.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 6 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 1,675.839 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 102.041 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 310.201 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 แห่ง และ อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 147.828 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,528.011 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 71.305 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30.736 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 98.415 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 211.786 วงจร-กม.	29.2
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	25.500	-	-	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	33.3
10. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	274.000	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 146,000 ครัวเรือน	อยู่ระหว่างการคัดเลือกครัวเรือนเข้าโครงการ	10.0
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		5,076.851	1,679.389	33.1			

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	16,697.833	1,920.301	11.5			
					หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. 2. ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง คาดแล้วเสร็จปี 2569 จำนวน 1 แห่ง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหามอเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณีหม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ) หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.	- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน 2 งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7 แห่ง ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งของ 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน - ดำเนินการงานพัฒนา business solution เพิ่มประสิทธิภาพ ได้ครบทั้ง 7 use case เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนา solution และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	14.000	0.405	2.9	หมวดสิ่งก่อสร้าง 1.คาดว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กพต. 3 พร้อมทั้งเบิกจ่าย ADV ได้ภายในปี 2569	อยู่ระหว่างประกวดราคา	15.0
2. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	34.238	-	-	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพไฟฟ้า	1. การจัดทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	10.0
3. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	92.198	42.444	46.0	หมวดที่ดิน จัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง (กฟจ.มุกดาหาร กฟย.ห้วยใหญ่)	- ปัจจุบันได้แปลงเป้าหมายแล้ว	25.0
					หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 จำนวน 7 แห่ง (โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 69= 5 แห่ง)	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานสัญญา 6 แห่ง และอยู่ระหว่าง ประกวดราคา 1 แห่ง	25.0
4. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	7.846	1.938	24.7	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
5. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5.909	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และสื่ทัศน์อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย : เพื่อให้การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ มีความเสถียรและครอบคลุม - งานปรับปรุงพื้นที่ (งานทำประตุน้ำ) : เพื่อจัดการระบบระบายน้ำ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากน้ำท่วม	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	10.0
6. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	0.029	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน 2. คริวเรือน จำนวน 1,680 คริวเรือน	ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ 3 เส้นทางจาก 11 เส้นทาง โดย ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 2 เส้นทาง และอยู่ระหว่างประกวดราคา 1 เส้นทาง	20.0
7. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ หลักของ กฟผ.	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	49.000	-	-	สามารถจัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอตไลน์) ได้ ภายในปี 2569	- อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	25.0
8. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	173.950	0.033	0.02	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	22.0
9. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	38.475	5.167	13.4	สามารถก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดราไวย์ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมทางหลวง เพื่อเริ่มดำเนินการด้านโยธา (ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้)	-

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
10. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.097	0.097	100.0	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0
11. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	50.000	2.051	4.1	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 2 ปี 2563-2566 (4 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ 100% ของงานทั้งหมด - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ 100% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,170 งาน และปิด งานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 16,987 งาน คิดเป็น 98.93% - งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,171 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 10,169 งาน คิดเป็น 99.98%	80.0
12. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	138.191	6.695	4.8	งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร EPM) งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM)	- งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร EPM) ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารับประกัน บำรุงรักษา และคุ้มครองระบบตาม สัญญา 2 ครั้ง / ปี - งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) จัดทำ สัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	60.0
13. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	137.943	0.045	0.03	- งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็น สำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy) - งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กมต., กมป., กบค.และ กฟภ. ลาดหลุมแก้ว	- กำลังทำTOR/ ราคากลาง - กำลังทำTOR/ ราคากลาง	10.0
14. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	10.474	5.335	50.9	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
15. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	58.330	30.292	51.9	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	696.600	27.360	3.9	- เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สวิตเกียร์ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี - สามารถดำเนินการประกวดราคา งานเปลี่ยนทดแทนสวิตเกียร์ 22kV จำนวน 20 สถานีไฟฟ้า ได้ภายในปี 2569	สวิตเกียร์ฯ GIS - ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 2 สถานี - ระหว่างดำเนินการปรับปรุงจำนวน 3 สถานี - สวิตเกียร์ 22kV อยู่ระหว่างร่าง TOR	37.0
17. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	29.500	-	-	สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อรถพ่วงฉีดน้ำได้ภายในปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	15.0
18. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	188.815	0.001	0.001	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic - เบิกจ่ายตามสัญญา คงเหลือ จำนวน 1 สัญญา - คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ Electronic (ส่วนของปี 2568) ได้ภายในปี 2569	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแผนการจัดซื้อ	2.0
19. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	220.675	-	-	ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อ Recloser และสวิตช์ จำนวน 3 รายการ	อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	10.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
20. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	50.000	93.224	186.4	สามารถเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และงานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด (ปัจจุบันคงเหลือ 18 จังหวัด)	ขออนุมัติแบบประมาณการงานรื้อถอนแล้วจำนวน 17 จังหวัด (อยู่ระหว่าง กฟจ.เร่งดำเนินการ)	28.2
21. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	168.336	41.548	24.7	งานเข้าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	8.3
22. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	572.586	104.495	18.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง - คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน หมวดที่ดิน จัดซื้อจำนวน 2 แห่ง (กฟส.อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และ กฟส.อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) - สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับและรถรถชุดเจาะ 4x2 ได้ภายในปี 2568	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจงานสัญญา 15 แห่ง - ได้แปลงเป้าหมายแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่ม กฟส.อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี - จัดซื้อแล้ว 1 แห่ง (กฟส.อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี) - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	25.0 50.0 15.0
					ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการปิดงานปี 2566 - ในส่วนของงานปี 2567 ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างและลงนามสัญญา (ดำเนินงานที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3 และ กฟภ.3)	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า - ปิดงานปี 2566 แล้วเสร็จ - ในส่วนของงานปี 2567 อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR	15.0
					ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจงาน	10.0
25. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	180.308	44.559	24.7	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
26. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ. (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,244.971	451.473	36.3	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟภ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ.	1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจงาน 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจงาน	25.0
27. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	674.183	129.566	19.2	1) สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (ตะพานหิน, กาญจนบุรี) 2) สามารถก่อสร้างงานด้านโยธาแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง (พิษณุโลก , ห้วยยอด จ.ตรัง, เจิมปัญญา จ.ตรัง และ รังสิต)	1) งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 แห่ง 2) งานโยธา 4 แห่ง ส่งมอบพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	30.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
28. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่เพื่อ ขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	28.300	21.936	77.5	สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ และสามารถก่อสร้างได้ประมาณ 40% ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด ภายในปี 2569	ทำสัญญาแล้วระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	18.0
29. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	156.343	38.481	24.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเข้าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
30. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	105.486	10.016	9.5	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 8 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน 8 แห่ง	42.0
31. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	172.158	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว - ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง และลงนามสัญญา (ดำเนินงานที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ กพฉ.1, กพฉ.2, กพฉ.3, กฟภ.1, กฟภ.2, กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3)	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว - อยู่ระหว่างขายแบบประกวดราคา	20.0
32. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	455.664	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ราคากลาง	16.0
33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	95.220	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	26.0
34. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	116.160	30.925	26.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเข้าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
35. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	361.831	-	-	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา TOR เพื่อออกประกวดราคาใหม่	5.0
36. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	24.305	158.921	653.9	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 75% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่ม ความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 75% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,379 งาน และปิดงานก่อสร้าง พร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 6,539 งาน คิดเป็น 63.00% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่ม ความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,741 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อม ขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 7,405 งาน คิดเป็น 84.72%	25.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
37. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,359.178	45.215	3.3	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 17 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 17 แห่ง หมวดยานพาหนะ - ดำเนินการจัดหายานพาหนะ 7 ประเภท หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้หน่วยงานในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 17 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 14 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 11 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 6 แห่ง หมวดยานพาหนะ - จัดทำสัญญาแล้ว 6 ประเภท หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงิน	25.0
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	91.296	5.424	5.9	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : ตรวจรับรายละเอียดและ เบิกจ่ายเงินในไตรมาส 3 และ 4 - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : ดำเนินการงาน ตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : จัดซื้อได้คู่สัญญา และ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (70%) (ส่งของ) ได้ในไตรมาส 4 - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ : จัดซื้อได้ คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%) ได้ในไตรมาส 4	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการแล้วเสร็จ และ เบิกจ่ายเงินแล้ว 100% - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : คู่สัญญาดำเนินการติดตั้งแล้ว เสร็จ 70% ของงานอยู่ระหว่างส่งมอบงานทดสอบและส่งมอบงาน ตรวจรับรายละเอียด - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : เบิกค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : อนุมัติสเปกอุปกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ : อยู่ระหว่าง ขอความเห็นชอบร่าง TOR	25.0
39. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	32.400	-	-	- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ - ITSM Assessment and Implementation	- ทบทวนรายการจัดซื้อประเภท และจำนวนของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ - จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	40.0
40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)	1 ม.ค. 69 -	209.700	-	-	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ	VT GIS 115kV อยู่ระหว่างประกวดราคา	10.0
41. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	30.200	3.690	12.2	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดหาและทำสัญญา	18.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
42. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	85.437	7.271	8.5	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เครื่อ ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 8 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามสัญญา	28.0
43. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	272.000		-	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อ การปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา	22.0
44. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	15.000	0.021	0.1	งานพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการบริการลูกค้า จำนวน 3 ระบบ และ งานพัฒนา PEA LINE 1 ระบบ	- มีการปรับขอบเขตงาน เพื่อให้เข้าซ้อนกับระบบ CBS 3 - งานพัฒนา PEA LINE ดำเนินการหาผู้รับจ้าง	20.0
45. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	112.440	10.226	9.1	งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 1 รายการ -อยู่ระหว่างจัดประชาพิจารณ์ 1 รายการ -อยู่ระหว่างพิจารณาผล 1 รายการ	30.0
46. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	132.925	34.532	26.0	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
47. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	404.302	30.997	7.7	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง (น่าน, เชียงทะเล, คลองสาม 2, พระยาสังจาย, ศรีราชา)	1) งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง (น่าน) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 แห่ง	30.0
48. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	410.671	87.905	21.4	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วย 2 ระบบ	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	25.0
49. แผนงานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	204.500	0.280	0.1	- ผู้ให้เช่าซื้อติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Fixed Radio, Mobile Radio), อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater และอุปกรณ์ตามสัญญาครบถ้วน พร้อมใช้งานภายในไตรมาส 2 - ตรวจรับเริ่มต้นการใช้งานได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 - ตรวจรับการใช้งาน งวดที่ 1 (3 เดือน) และเบิกจ่ายเงินค่าเช่า ในไตรมาส 4	- อยู่ระหว่างผู้ให้เช่าซื้อติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Fixed Radio, Mobile Radio), อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater และอุปกรณ์ตามสัญญา (ภาคเหนือ 70%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80%, ภาคใต้ 70%)	25.0
50. แผนงานบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ งานซอฟต์แวร์สำหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM-Software) (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	-	-	แผนงานจ้างบำรุงรักษาฯ 1 ระบบ ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประชาพิจารณาร่างขอบเขตงานครั้งที่ 1 และคณะกรรมการสรุปผล การประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ กำลังขออนุมัติ เพื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2	0.0
51. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568 (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	500.000	92.780	18.6	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 3 ปี 2568 (1 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ > 25% ของงานทั้งหมด	- งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 2,063 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 155 งาน คิดเป็น 0%	25.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	318.508	0.085	0.03	- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (40%) - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา, เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (55%) - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 (100%) - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%)	- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : ได้คู่สัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ บ.16/2569 ลว. 26 มี.ค. 2569 - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : อนุมัติจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และจัดเตรียมทำสัญญา - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : อยู่ระหว่างขายแบบประกวดราคา กำหนดยื่นซอง 3 เม.ย. 2569 - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : อนุมัติจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมทำสัญญา - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : อยู่ระหว่างแจกแบบประกวดราคา กำหนดยื่นซอง 21 เม.ย. 2569	30.0
53. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	308.325	-	-	- งาน Infrastructure & Hardware จำนวน 4 รายการ - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ - IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	15.0
54. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	335.492	-	-	งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 10 รายการ	- ยกเลิก 1 รายการ - จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 5 รายการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 2 รายการ	15.0
55. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	146.343	-	-	- ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า - ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า	- จัดทำสัญญาแล้ว 2 สัญญา	25.0
56. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	849.750	0.994	0.1	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 4 ปี 2569-2570 (2 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ > 5% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 659 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 0 งาน คิดเป็น 0.00%	5.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
57. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	25.909	-	-	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	9.0
58. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2569 - 2574	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	68.779	-	-	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อนุมัติหลักการ/สเปกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเข้า	5.0
รวมแผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		29,314.948	3,492.347	11.9			

3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	281.152	54.693	19.5	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนดในไตรมาส 1	25.0
					2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนดในไตรมาส 1	25.0
					3. แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างนำเสนอคณะทำงานพิจารณาถ้อยแถลงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (คณะเล็ก) เป็นครั้งที่ 3 ที่นำเสนอคาบประชุมวันที่ 3 เม.ย. 69	5.0
รวม		281.152	54.693	19.5			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		34,672.951	5,226.429	15.1			

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569
