



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2569

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สถานะ 31 มีนาคม 2569

ไตรมาส 1

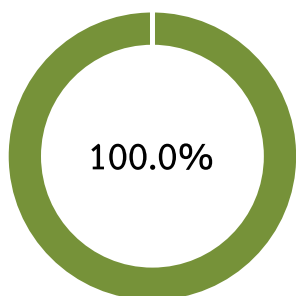

เป้าเบิกจ่าย 5,227 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท

ทั้งปี




เป้าเบิกจ่าย 34,673 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท (15.1%)

คงเหลือ 29,446 ล้านบาท (84.9%)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 รายไตรมาส

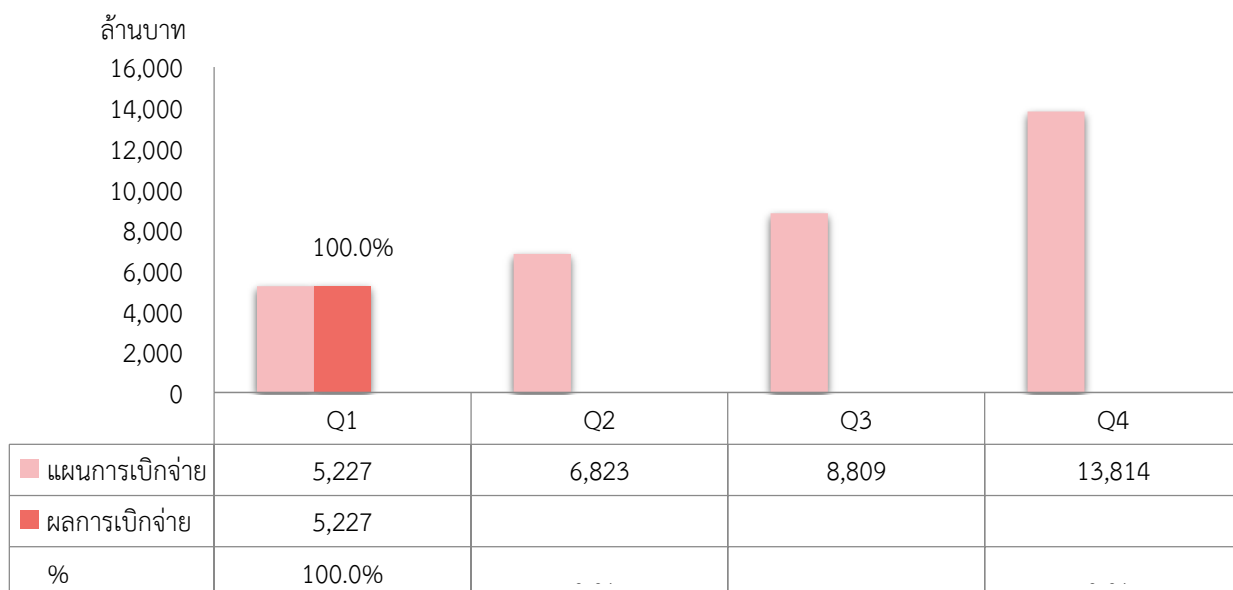

หมายเหตุ:

- มติ ครม. 14 ตุลาคม 2568 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2569 วงเงิน 105,324.420 ล้านบาท และ 34,398.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- ตามความเห็นชอบของ สศช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการโครงการ คพม.3 วงเงิน 1,400 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 274 ล้านบาท ทำให้วงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 106,724.420 ล้านบาท และ 34,672.951 ล้านบาท ตามลำดับ

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569

สถานะ 31 มีนาคม 2569

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	95.5	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
- รายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
- ระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	125.5	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	70.000	11.156	0.011	-	0.0
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	191.070	75.190	1.151	1.5	0.6
3. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	500.000	50.000	158.737	317.5	31.7
4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	53.090	43.690	32.330	74.0	60.9
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	157.000	53.000	12.128	22.9	7.7
6. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	190.002	-	-	-	-
7. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	116.189	115.289	-	-	-
8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	3,500.000	857.326	1,475.032	172.1	42.1
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (คพช.)	25.500	-	-	-	-
11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	274.000	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	139.3	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	253.6	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5,076.851	1,679.389	33.1
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	29,314.948	3,492.347	11.9
2.1 งานรายปี		16,697.833	1,920.301	11.5
2.2 แผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 6 - 31 ธ.ค. 69	281.152	54.693	19.5
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		34,672.951	5,226.429	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ							
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	70.000	0.011	0.02	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบสถานีไฟฟ้า	13.6
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	191.070	1.151	0.6	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	30.2
3. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	500.000	158.737	31.7	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ สายส่ง 115/22 เควี จำนวน 2 แห่ง	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ.อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน พิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ของสัญญา และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี ดำเนินการแล้วเสร็จ	34.6
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	53.090	32.330	60.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	1.8
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	157.000	12.128	7.7	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการ จัดจ้าง 2. งานเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	41.8
6. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถ ในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	190.002	-	-	งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง	โครงการมีคืบความฟ้องร้อง อยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาคดี	-
7. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	116.189	-	-	ปิดโครงการ	ปี 2568 ดำเนินงานครบตามแผนงานแล้ว และจะอนุมัติปิดโครงการ ในปี 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	3,500.000	1,475.032	42.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 6 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 1,675.839 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 102.041 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 310.201 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 แห่ง และ อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 147.828 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,528.011 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 71.305 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30.736 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 98.415 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 211.786 วงจร-กม.	29.2
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีซัง จ.ชลบุรี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	25.500	-	-	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจางานของสัญญา	33.3
10. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	274.000	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 146,000 ครัวเรือน	อยู่ระหว่างการคัดเลือกครัวเรือนเข้าโครงการ	10.0
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		5,076.851	1,679.389	33.1			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	16,697.833	1,920.301	11.5	1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. 2. จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น จัดหาหม้อเตอร่า และหม้อแปลง	1. ดำเนินการเพื่อรองรับผู้ใช้ไฟได้ตามแผน 2. ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งของ	25.0 25.0
รวมงานรายปี		16,697.833	1,920.301	11.5			
2.2 แผนงานระยะยาว	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	12,617.115	1,572.046	12.5	1. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 2. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. และปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพเพื่อเสถียรภาพในการจ่ายไฟ 3. แผนเข้ายานพาหนะ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานก่อสร้างบางส่วนดำเนินการแล้วเสร็จ 3. ดำเนินการจัดทำสัญญาเข้าครบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา และบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเข้า	30.0 25.0 25.0
รวมแผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		29,314.948	3,492.347	11.9			
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	281.152	54.693	19.5	แผนงานเช่าที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม / เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเช่า และบางส่วนดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้ว	25.0
รวม		281.152	54.693	19.5			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		34,672.951	5,226.429	15.1			
