



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2569

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สถานะ 31 มีนาคม 2569


ไตรมาส 1

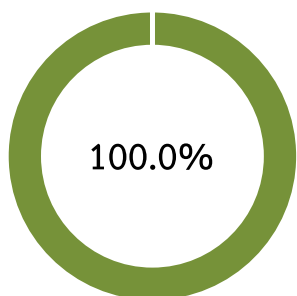

เป้าเบิกจ่าย 5,227 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท

ทั้งปี

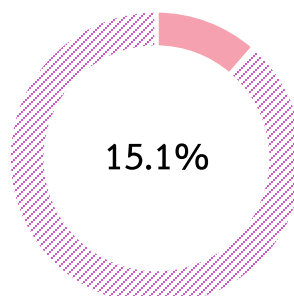


เป้าเบิกจ่าย 34,673 ล้านบาท

จ่ายจริง 5,227 ล้านบาท (15.1%)

คงเหลือ 29,446 ล้านบาท (84.9%)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 รายไตรมาส

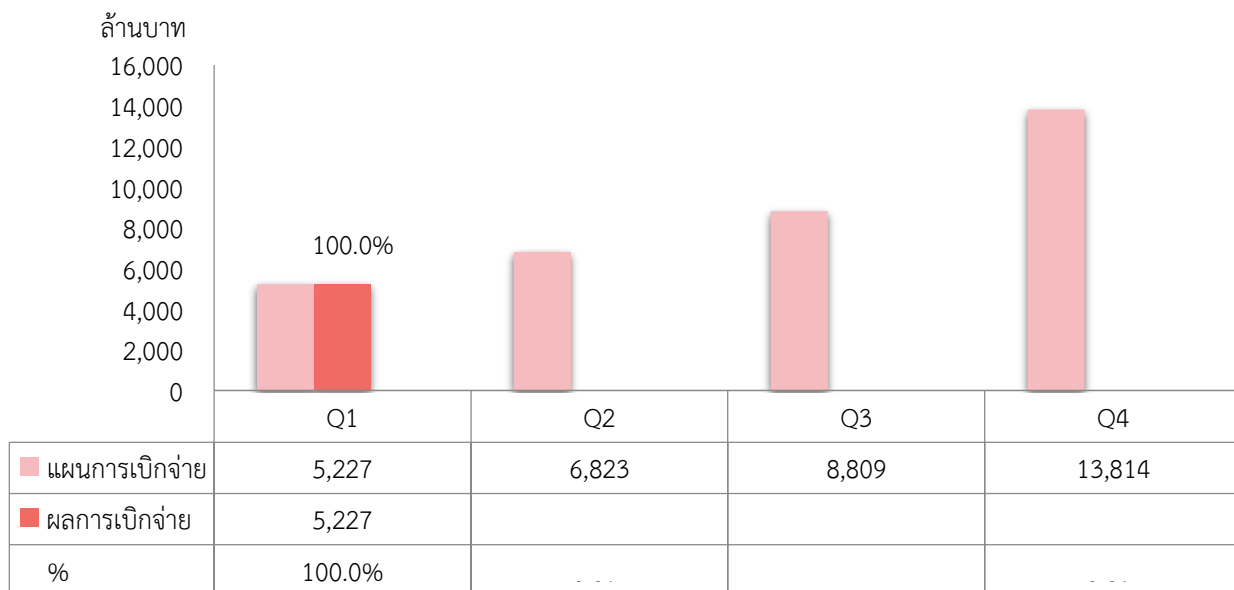

หมายเหตุ:

- มติ ครม. 14 ตุลาคม 2568 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2569 วงเงิน 105,324.420 ล้านบาท และ 34,398.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- ตามความเห็นชอบของ สศช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการโครงการ คพม.3 วงเงิน 1,400 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 274 ล้านบาท ทำให้วงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 106,724.420 ล้านบาท และ 34,672.951 ล้านบาท ตามลำดับ

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569

สถานะ 31 มีนาคม 2569

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	95.5	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
- รายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
- ระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	125.5	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-มี.ค. 2569 (เทียบกับเป้าหมายสศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1))			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	70.000	11.156	0.011	-	0.0
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	191.070	75.190	1.151	1.5	0.6
3. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	500.000	50.000	158.737	317.5	31.7
4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	53.090	43.690	32.330	74.0	60.9
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	157.000	53.000	12.128	22.9	7.7
6. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	190.002	-	-	-	-
7. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	116.189	115.289	-	-	-
8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	3,500.000	857.326	1,475.032	172.1	42.1
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (คทช.)	25.500	-	-	-	-
10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาหาลายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	274.000	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	5,076.851	1,205.651	1,679.389	139.3	33.1
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	16,697.833	2,515.778	1,920.301	76.3	11.5
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,617.115	1,461.433	1,572.046	107.6	12.5
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	29,314.948	3,977.211	3,492.347	87.8	11.9
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	281.152	43.567	54.693	253.6	19.5
รวมทั้งสิ้น	34,672.951	5,226.429	5,226.429	100.0	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5,076.851	1,679.389	33.1
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	29,314.948	3,492.347	11.9
2.1 งานรายปี		16,697.833	1,920.301	11.5
2.2 แผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	281.152	54.693	19.5
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		34,672.951	5,226.429	15.1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ							
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	70.000	0.011	0.02	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบสถานีไฟฟ้า	13.6
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	191.070	1.151	0.6	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	30.2
3. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	500.000	158.737	31.7	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ สายส่ง 115/22 เควี จำนวน 2 แห่ง	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน พิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ของสัญญา และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี ดำเนินการแล้วเสร็จ	34.6
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	53.090	32.330	60.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิล ใต้ดิน จำนวน 3 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงานของสัญญา 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง และ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	1.8
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	157.000	12.128	7.7	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการ จัดจ้าง 2. งานเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	41.8
6. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถใน การจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	190.002	-	-	งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง	โครงการมีคืบความฟ้องร้อง อยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาคดี	-
7. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	116.189	-	-	ปิดโครงการ	ปี 2568 ดำเนินงานครบตามแผนงานแล้ว และจะอนุมัติปิดโครงการ ในปี 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ	100.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	3,500.000	1,475.032	42.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 6 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 1,675.839 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 102.041 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 310.201 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 แห่ง และ อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 147.828 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,528.011 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 71.305 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30.736 วงจร-กม. • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 98.415 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 211.786 วงจร-กม.	29.2
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	25.500	-	-	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	33.3
10. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	274.000	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 146,000 ครัวเรือน	อยู่ระหว่างการคัดเลือกครัวเรือนเข้าโครงการ	10.0
รวมงบลงทุนที่เป็นโครงการ		5,076.851	1,679.389	33.1			

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	16,697.833	1,920.301	11.5			
					<p>หมวดสิ่งก่อสร้าง</p> <p>1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ.</p> <p>2. ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง คาดแล้วเสร็จปี 2569 จำนวน 1 แห่ง</p> <p>หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</p> <p>1.งานจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหามีเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง</p> <p>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณีหม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รีดถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ)</p> <p>หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.</p>	<p>- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ใช้ไฟได้ตามแผน</p> <p>2 งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7 แห่ง</p> <p>ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งของ</p> <p>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน</p> <p>- ดำเนินการงานพัฒนา business solution เพิ่มประสิทธิภาพ ได้ครบทั้ง 7 use case เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนา solution และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ</p>	<p>25.0</p> <p>25.0</p> <p>25.0</p> <p>25.0</p> <p>95.0</p>
รวมงานรายปี		16,697.833	1,920.301	11.5			

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	14.000	0.405	2.9	หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. คาดว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญางานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ กฟต. 3 พร้อมทั้งเบิกจ่าย ADV ได้ภายในปี 2569	อยู่ระหว่างประกวดราคา	15.0
2. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	34.238	-	-	การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า	อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	10.0
3. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	92.198	42.444	46.0	หมวดที่ดิน จัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง (กฟจ.มุกดาหาร กฟย.ห้วยน้ำใหญ่) หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 จำนวน 7 แห่ง (โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 69= 5 แห่ง)	ปัจจุบันได้แปลงเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา 6 แห่ง และอยู่ระหว่าง ประกวดราคา 1 แห่ง	25.0 25.0
4. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	7.846	1.938	24.7	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	25.0
5. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5,909	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม)	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	10.0
6. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	0.029	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน	ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ 3 เส้นทางจาก 11 เส้นทาง โดย ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 2 เส้นทาง และอยู่ระหว่างประกวดราคา 1 เส้นทาง	20.0
7. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ หลักของ กฟภ.	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	49.000	-	-	สามารถจัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านซอฟต์แวร์) ได้ ภายในปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	25.0
8. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	173.950	0.033	0.02	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	22.0
9. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	38.475	5.167	13.4	ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดตราไว	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมทางหลวง เพื่อเริ่มดำเนินการด้านโยธา (ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้)	-
10. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.097	0.097	100.0	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนประจำปี	ผล (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
11. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	50.000	2.051	4.1	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 2 ปี 2563-2566 (4 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ 100% ของงานทั้งหมด - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ 100% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,170 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 16,987 งาน คิดเป็น 98.93% - งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,171 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 10,169 งาน คิดเป็น 99.98%	80.0
12. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	138.191	6.695	4.8	- งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) - งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM)	- งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกัน บำรุงรักษา และคุ้มครองระบบตามสัญญา 2 ครั้ง / ปี - งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	60.0
13. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	137.943	0.045	0.03	- งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy) - งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. ลาดหลุมแก้ว	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ ราคากลาง - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ ราคากลาง	10.0
14. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	10.474	5.335	50.9	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
15. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	58.330	30.292	51.9	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	696.600	27.360	3.9	- เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี - สามารถดำเนินการประกวดราคา งานเปลี่ยนทดแทนสวิตช์เกียร์ 22kV จำนวน 20 สถานีไฟฟ้า ได้ภายในปี 2569	- สวิตช์เกียร์ GIS ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 2 สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงจำนวน 3 สถานี - สวิตช์เกียร์ 22kV อยู่ระหว่างร่าง TOR	37.0
17. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	29.500	-	-	จัดซื้อรถพ่วงฉีดน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	15.0
18. แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	188.815	0.001	0.001	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic - เบิกจ่ายตามสัญญา คงเหลือ จำนวน 1 สัญญา - คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมิเตอร์ Electronic (ส่วนของปี 2568) ได้ภายในปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแผนการจัดซื้อ	2.0
19. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	220.675	-	-	จัดซื้อ Recloser และสวิตช์	อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	10.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนประจำปี	ผล (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
20. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	50.000	93.224	186.4	ปรับปรุงระบบจำหน่าย และงานรื้อถอน (ปัจจุบันคงเหลือ 18 จังหวัด)	ขออนุมัติงบประมาณการงานรื้อถอนแล้วจำนวน 17 จังหวัด (อยู่ระหว่าง กฟภ. เร่งดำเนินการ)	28.2
21. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	168.336	41.548	24.7	งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	8.3
22. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	572.586	104.495	18.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง - คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน หมวดที่ดิน - จัดซื้อจำนวน 2 แห่ง หมวดยานพาหนะ - จัดทำสัญญาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ และรถลดชุดเจาะ 4x2	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจางานสัญญา 15 แห่ง - ได้แปลงเป้าหมายแล้ว จำนวน 1 แห่ง และจัดซื้อแล้ว 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา	25.0 50.0 15.0
23. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	261.868	0.170	0.1	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า - ปีคงานปี 2566 แล้วเสร็จ - ในส่วนของงานปี 2567 อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR	15.0
24. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	90.000	5.420	6.0	ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจางาน	10.0
25. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	180.308	44.559	24.7	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
26. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ. (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,244.971	451.473	36.3	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟภ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟภ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ.	1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจางาน 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจางาน	25.0
27. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	674.183	129.566	19.2	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 6 แห่ง	- งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 แห่ง - งานโยธา 4 แห่ง ส่งมอบพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	30.0
28. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และฝั่งบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	28.300	21.936	77.5	สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ และสามารถก่อสร้างได้ประมาณ 40% ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด ภายในปี 2569	ทำสัญญาแล้วระหว่างเบิกจ่ายตามวงจางาน	18.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
29. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	156.343	38.481	24.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
30. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	105.486	10.016	9.5	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 8 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน 8 แห่ง	42.0
31. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	172.158	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	อยู่ระหว่างขยายแบบประกวดราคา	20.0
32. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	455.664	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ราคา	16.0
33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	95.220	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างทำสัญญา	26.0
34. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	116.160	30.925	26.6	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
35. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	361.831	-	-	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา TOR เพื่อออกประกวดราคาใหม่	5.0
36. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	24.305	158.921	653.9	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 75% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 75% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,379 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 6,539 งาน คิดเป็น 63.00% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,741 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 7,405 งาน คิดเป็น 84.72%	25.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
37. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,359.178	45.215	3.3	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 17 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 17 แห่ง หมวดยานพาหนะ - ดำเนินการจัดหายานพาหนะ 7 ประเภท หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้หน่วยงานในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 17 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 14 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 11 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 6 แห่ง หมวดยานพาหนะ - จัดทำสัญญาแล้ว 6 ประเภท หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงิน	25.0
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	91.296	5.424	5.9	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : ตรวจรับรายเส้นทางและ เบิกจ่ายเงินในไตรมาส 3 และ 4 - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : ดำเนินการงาน ตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : จัดซื้อได้สัญญา และ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (70%) (ส่งของ) ได้ในไตรมาส 4 - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดฯ : จัดซื้อได้ สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%) ได้ในไตรมาส 4	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการแล้วเสร็จ และ เบิกจ่ายเงินแล้ว 100% - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : คู่สัญญาดำเนินการติดตั้งแล้ว เสร็จ 70% ของงานอยู่ระหว่างส่งมอบงานทดสอบและส่งมอบงาน ตรวจรับรายเส้นทาง - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : เบิกค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : อนุมัติสเปกอุปกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดฯ : อยู่ระหว่าง ขอความเห็นชอบร่าง TOR	25.0
39. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	32.400	-	-	- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ - ITSM Assessment and Implementation	- ทบทวนรายการจัดซื้อประเภท และจำนวนของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ - จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	40.0
40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)	1 ม.ค. 69 -	209.700	-	-	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ	VT GIS 115kV อยู่ระหว่างประกวดราคา	10.0
41. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	30.200	3.690	12.2	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดหาและทำสัญญา	18.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนประจำปี	ผล (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
42. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	85.437	7.271	8.5	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 8 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามสัญญา	28.0
43. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพลิ้นทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	272.000		-	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา	22.0
44. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	15.000	0.021	0.1	งานพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการบริการลูกค้า จำนวน 3 ระบบ และงานพัฒนา PEA LINE 1 ระบบ	- มีการปรับขอบเขตงาน เพื่อให้เข้าช้กับระบบ CBS 3 - งานพัฒนา PEA LINE ดำเนินการหาผู้รับจ้าง	20.0
45. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	112.440	10.226	9.1	งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 1 รายการ -อยู่ระหว่างจัดพิจารณาพิจารณา 1 รายการ -อยู่ระหว่างพิจารณาผล 1 รายการ	30.0
46. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	132.925	34.532	26.0	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	25.0
47. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	404.302	30.997	7.7	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง (นำน) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 แห่ง	30.0
48. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	410.671	87.905	21.4	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงจางาน	25.0
49. แผนงานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	204.500	0.280	0.1	เช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	อยู่ระหว่างผู้ให้เข้าซื้อติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Fixed Radio, Mobile Radio), อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater และอุปกรณ์ตามสัญญา (ภาคเหนือ 70%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80%, ภาคใต้ 70%)	25.0
50. แผนงานบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM-Software) (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	-	-	งานบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM-Software)	พิจารณาพิจารณาร่างขอบเขตงานครั้งที่ 1 และคณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาพิจารณาแล้วเสร็จ กำลังขออนุมัติ เพื่อพิจารณาพิจารณาครั้งที่ 2	0.0
51. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568 (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	500.000	92.780	18.6	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 3 ปี 2568 (1 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ > 25% ของงานทั้งหมด	- งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 2,063 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 155 งาน คิดเป็น 0%	25.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนประจำปี	ผล (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	318.508	0.085	0.03	<ul style="list-style-type: none"> - งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (40%) - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา, เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (55%) - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 (100%) - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) 	<ul style="list-style-type: none"> - งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : ได้คู่สัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ บ.16/2569 ลว. 26 มี.ค. 2569 - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : อนุมัติจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และจัดเตรียมทำสัญญา - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : อยู่ระหว่างขยายแบบประกวดราคา กำหนดยื่นซอง 3 เม.ย. 2569 - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : อนุมัติจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมทำสัญญา - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : อยู่ระหว่างแจกแบบประกวดราคา กำหนดยื่นซอง 21 เม.ย. 2569 	30.0
53. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	308.325	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - งาน Infrastructure & Hardware จำนวน 4 รายการ - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ - IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ 	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	15.0
54. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	335.492	-	-	งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 10 รายการ	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิก 1 รายการ - จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 5 รายการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 2 รายการ 	15.0
55. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	146.343	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า - ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 	- จัดทำสัญญาแล้ว 2 สัญญา	25.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1)	ร้อยละ			
56. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	849.750	0.994	0.1	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 4 ปี 2569-2570 (2 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนว > 5% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 659 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 0 งาน คิดเป็น 0.00%	5.0
57. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	25.909	-	-	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	9.0
58. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2569 - 2574	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	68.779	-	-	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อนุมัติหลักการ/สเปกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเช่า	5.0
รวมแผนงานระยะยาว		12,617.115	1,572.046	12.5			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		29,314.948	3,492.347	11.9			

3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	281.152	54.693	19.5	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	25.0
					2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	25.0
					3. แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างนำเสนอคณะทำงานพิจารณาครั้งรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (คณะเล็ก) เป็นครั้งที่ 3 ที่นำเสนอ คาดประชุมวันที่ 3 เม.ย. 69	5.0
รวม		281.152	54.693	19.5			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		34,672.951	5,226.429	15.1			
