



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2569

# รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สถานะ 30 มิถุนายน 2569

ไตรมาส 1-2


(ม.ค. – มิ.ย.)



เป้าเบิกจ่าย 12,050 ล้านบาท

จ่ายจริง 12,050 ล้านบาท (100.0%)

ทั้งปี

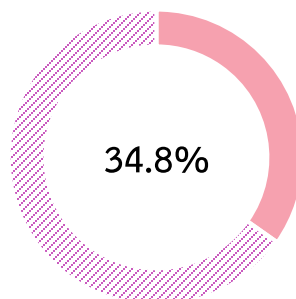


เป้าเบิกจ่าย 34,673 ล้านบาท

จ่ายจริง 12,050 ล้านบาท (34.8%)

**คงเหลือ 22,623 ล้านบาท (65.2%)**

## แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 รายไตรมาส

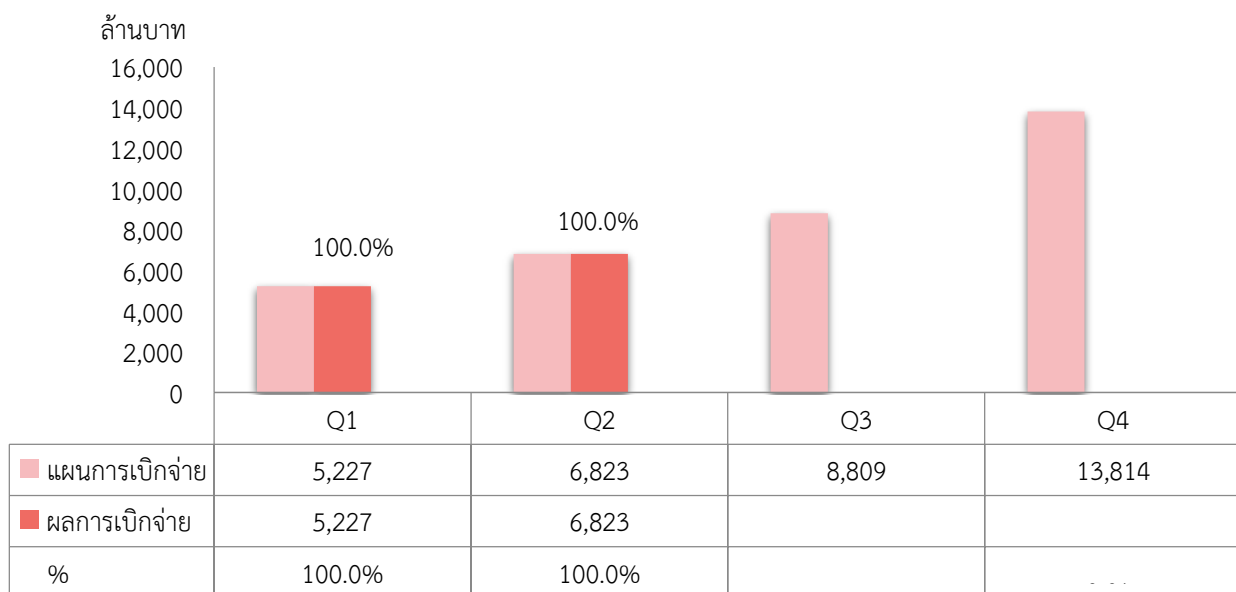

หมายเหตุ:

- มติ ครม. 14 ตุลาคม 2568 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2569 วงเงิน 105,324.420 ล้านบาท และ 34,398.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- ตามความเห็นชอบของ สช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการโครงการ คพม.3 วงเงิน 1,400 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 274 ล้านบาท ทำให้วงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 106,724.420 ล้านบาท และ 34,672.951 ล้านบาท ตามลำดับ

# การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2569

สถานะ 30 มิถุนายน 2569

## สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| แผนงาน/งาน/โครงการ                            | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ปี 2569 | ม.ค.-มิ.ย. 2569 (เทียบกับเป้าหมาย สศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)) |            |       | %จ่ายจริงเทียบกับ<br>กับเป้าหมาย<br><br>12 เดือน |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------|
|                                               |                             | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย                                            | จ่ายจริง   |       |                                                  |
|                                               |                             |                                                                 | วงเงิน     | %     |                                                  |
| งบลงทุนที่ <del>ทำเป็นโครงการ</del>           | 5,076.851                   | 2,175.669                                                       | 3,290.504  | 151.2 | 64.8                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 29,314.948                  | 9,785.020                                                       | 8,671.323  | 88.6  | 29.6                                             |
| - รายปี                                       | 16,697.833                  | 6,434.546                                                       | 5,074.301  | 78.9  | 30.4                                             |
| - ระยะยาว                                     | 12,617.115                  | 3,350.474                                                       | 3,597.022  | 107.4 | 28.5                                             |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 281.152                     | 88.630                                                          | 87.492     | 98.7  | 31.1                                             |
| รวมทั้งสิ้น                                   | 34,672.951                  | 12,049.319                                                      | 12,049.319 | 100.0 | 34.8                                             |

## รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                   | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ปี 2569 | ม.ค.-มิ.ย. 2569 (เทียบกับเป้าหมาย สศช. (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)) |            |       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย<br>12 เดือน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                                                      |                             | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย                                            | จ่ายจริง   |       |                                       |
|                                                                                                                      |                             |                                                                 | วงเงิน     | %     |                                       |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                                                                                       |                             |                                                                 |            |       |                                       |
| 1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3                                                            | 70.000                      | 11.246                                                          | 3.102      | 27.6  | 4.4                                   |
| 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4                                                            | 191.070                     | 183.090                                                         | 13.736     | 7.5   | 7.2                                   |
| 3. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                   | 500.000                     | 130.000                                                         | 538.015    | 413.9 | 107.6                                 |
| 4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                | 53.090                      | 46.290                                                          | 109.392    | 236.3 | 206.1                                 |
| 5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)                                 | 157.000                     | 91.000                                                          | 30.509     | 33.5  | 19.4                                  |
| 6. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) | 190.002                     | -                                                               | -          | -     | -                                     |
| 7. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)                                           | 116.189                     | 116.189                                                         | -          | -     | -                                     |
| 8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)                                                                   | 3,500.000                   | 1,573.854                                                       | 2,542.157  | 161.5 | 72.6                                  |
| 9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (คพช.)                   | 25.500                      | -                                                               | 0.027      | -     | 0.1                                   |
| 10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)                                | 274.000                     | 24.000                                                          | 53.566     | -     | 19.5                                  |
| รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                           | 5,076.851                   | 2,175.669                                                       | 3,290.504  | 151.2 | 64.8                                  |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                                                                                  |                             |                                                                 |            |       |                                       |
| 1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                          | 16,697.833                  | 6,434.546                                                       | 5,074.301  | 78.9  | 30.4                                  |
| 2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                        | 12,617.115                  | 3,350.474                                                       | 3,597.022  | 107.4 | 28.5                                  |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                      | 29,314.948                  | 9,785.020                                                       | 8,671.323  | 88.6  | 29.6                                  |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b>                                                                 |                             |                                                                 |            |       |                                       |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก                                                                        | 281.152                     | 88.630                                                          | 87.492     | 98.7  | 31.1                                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                          | 34,672.951                  | 12,049.319                                                      | 12,049.319 | 100.0 | 34.8                                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                   | ระยะเวลาดำเนินการ      | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
|                                                  |                        | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |
| 1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 5,076.851                  | 3,290.504           | 64.8   |
| 2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 29,314.948                 | 8,671.323           | 29.6   |
| 2.1 งานรายปี                                     |                        | 16,697.833                 | 5,074.301           | 30.4   |
| 2.2 แผนงานระยะยาว                                |                        | 12,617.115                 | 3,597.022           | 28.5   |
| 3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 281.152                    | 87.492              | 31.1   |
| รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)                           |                        | 34,672.951                 | 12,049.319          | 34.8   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    |                        | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                         |                        |                            |                     |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3                                                          | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 70.000                     | 3.102               | 4.4    | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                              | งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.0                  |
| 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4                                                          | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 191.070                    | 13.736              | 7.2    | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง<br><br>2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง                                                                                                      | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา<br><br>2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการงานตามงวด<br>งานของสัญญา                                                                                                                                                                               | 47.9                  |
| 3. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                        | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 500.000                    | 538.015             | 107.6  | 1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ<br>สายส่ง 115/22 เควี จำนวน 2 แห่ง                                                          | 1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ.แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 1 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน<br>ของสัญญา และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                     | 80.0                  |
| 4. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)                                                                     | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 53.090                     | 109.392             | 206.1  | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง<br><br>3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิล<br>ใต้ดิน จำนวน 3 แห่ง | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามงวดงานของสัญญา<br><br>2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ตามงวดงานของสัญญา<br><br>3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน<br>อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง และ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง | 65.0                  |
| 5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)                                      | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 157.000                    | 30.509              | 19.4   | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง                                                                                              | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการ<br>จัดจ้าง<br><br>2. งานเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | 53.0                  |
| 6. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถใน<br>การจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 190.002                    | -                   | -      | งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                           | งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง<br>อยู่ระหว่างการจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75.0                  |
| 7. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)                                                | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 116.189                    | -                   | -      | ปิดโครงการ                                                                                                                                                                                 | ปี 2568 ดำเนินงานครบตามแผนงานแล้ว และจะอนุมัติปิดโครงการ<br>ในปี 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.0                 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)                                                | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 3,500.000                  | 2,542.157           | 72.6   | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 12 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 6 แห่ง<br><br>3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 1,675.839 วงจร-กม.<br><br>4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้<br>- งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 102.041 วงจร-กม.<br>- งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 310.201 วงจร-กม. | 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 10 แห่ง แล้วเสร็จ 2 แห่ง<br><br>2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 แห่ง และ อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 2 แห่ง<br><br>3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 594.920 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,080.373 วงจร-กม.<br><br>4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้<br>• งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ<br>• งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 226.826 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 83.375 วงจร-กม. | 51.5                  |
| 9. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 25.500                     | 0.027               | 0.1    | 1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ<br><br>2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา<br><br>2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.0                  |
| 10. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 274.000                    | 53.566              | 19.5   | ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 146,000 ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | อยู่ระหว่างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 10,448 ครัวเรือน แล้วเสร็จ จำนวน 890 ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.0                  |
| รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                                                                |                           | 5,076.851                  | 3,290.504           | 64.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ*                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ |                           |                            |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 2.1 งานรายปี                    | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 16,697.833                 | 5,074.301           | 30.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                           |                            |                     |        | หมวดสิ่งก่อสร้าง<br>1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ<br>- งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้<br>ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟ<br>ทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวน<br>ไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ.<br><br>2. ก่อสร้างเคเบิลไคดิน จำนวน 7 แห่ง คาดแล้วเสร็จปี 2569<br>จำนวน 1 แห่ง<br><br>หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์<br>1.งานจัดหาหม้อเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย<br>- จัดหาหม้อเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง<br><br>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยน<br>ตามวาระ<br>- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณี<br>หม้อแปลงชำรุด<br>- จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง<br>รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป<br>(หม้อแปลงเสื่อมสภาพ)<br><br>หมวดเครื่องมือใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก<br>- งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร<br>(Triple Transformation Capability Center : TCC)<br>เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>และประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ. | - จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2 งานการก่อสร้างเคเบิลไคดิน<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7 แห่ง<br><br><br><br><br><br>ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งของ<br><br><br><br>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ<br><br>- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา<br><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน<br><br><br>- ดำเนินการงานพัฒนา business solution เพิ่มประสิทธิภาพ ได้ครบ<br>ทั้ง 7 use case เรียบร้อยแล้ว<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนา solution และ<br>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 50.0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>35.0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>30.0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>30.0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>98.0 |
| รวมงานรายปี                     |                           | 16,697.833                 | 5,074.301           | 30.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                       |
| 2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                |                           |                            |                     |        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                       |
| 2.2 แผนงานระยะยาว                                                                                              |                           |                            |                     |        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                       |
| 1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3                                                                        | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 14.000                     | 0.405               | 2.9    | หมวดสิ่งก่อสร้าง<br>- คาดว่าจะดำเนินจัดทำสัญญางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>กฟต. 3 พร้อมทั้งเบิกจ่าย ADV ได้ภายในปี 2569                                                                                          | - อยู่ระหว่างประกวดราคา                                                                                                                                      | 20.0                  |
| 2. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝฟ.)                                                 | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 34.238                     | -                   | -      | การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า                                                                                                                                                                          | ยกเลิกเนื่องจากเทคโนโลยีล้ำสมัย                                                                                                                              | 0.0                   |
| 3. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4                                                                        | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 92.198                     | 58.909              | 63.9   | หมวดที่ดิน<br>จัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง (กฟจ.มุกดาหาร กฟย.ห้วยน้ำใหญ่)<br><br>หมวดสิ่งก่อสร้าง<br>- คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 จำนวน<br>7 แห่ง (โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 69 รวม 5 แห่ง) | ปัจจุบันได้แปลงเป้าหมายแล้ว<br><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา 6 แห่ง และอยู่ระหว่าง<br>ประกวดราคา 1 แห่ง                                           | 25.0<br><br>25.0      |
| 4. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566                                                                           | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 7.846                      | 3.891               | 49.6   | การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม<br>แผนปฏิบัติ                                                                                                                                               | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย<br>ตามสัญญาเช่า                                                                                  | 50.0                  |
| 5. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3                                                       | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 5.909                      | -                   | -      | 1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ<br>เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน<br><br>2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม)                                 | 1. มีการยกเลิกดำเนินการเนื่องจากปรับปรุงสเปค จำนวน 1 รายการ<br>และรอลงนามในสัญญา จำนวน 1 รายการ<br><br>2. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ | 30.0                  |
| 6. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ<br>ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | -                          | 0.109               | -      | แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้<br>โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน                                                                                                           | ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ 3 เส้นทางจาก 11 เส้นทาง<br>โดยลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว                                                                | 30.0                  |
| 7. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ<br>หลักของ กฟภ.                         | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 49.000                     | -                   | -      | สามารถจัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอฟไลน์) ได้<br>ภายในปี 2569                                                                                                                                            | อนุมัติซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา                                                                                                                        | 30.0                  |
| 8. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1                                                               | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 173.950                    | 22.862              | 13.1   | การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน<br>จำนวน 1 ระบบ                                                                                                                                          | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง                                                                                                                             | 25.0                  |
| 9. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน                                                                           | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 38.475                     | 9.850               | 25.6   | ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดราไวย์                                                                                                                                                                                | อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมทางหลวง เพื่อเริ่มดำเนินการด้านโยธา<br>(ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้)                                                                  | -                     |
| 10. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567                                                                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 0.097                      | 0.097               | 100.0  | การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม<br>แผนปฏิบัติ                                                                                                                                               | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย<br>ตามสัญญาเช่า                                                                                  | 100.0                 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 11. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570 | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 50.000                     | 7.299               | 14.6   | แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 2 ปี 2563-2566 (4 ปี)<br>- ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ 100% ของงานทั้งหมด<br><br>- ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ 100% ของงานทั้งหมด                                         | - งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,170 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 17,006 งาน คิดเป็น 99.05%<br><br>- งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,171 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 10,169 งาน คิดเป็น 99.98%                                                 | 99.0                  |
| 12. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม                                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 138.191                    | 21.880              | 15.8   | งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM)<br><br>งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM)                                                                                                  | - งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร EPM) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกัน บำรุงรักษา และคุ้มครองระบบตามสัญญา 2 ครั้ง / ปี อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายอีกครั้งในไตรมาส 3<br>- งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) ได้สัญญาพร้อมจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาในไตรมาส 3 ปี 2569 | 70.0                  |
| 13. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 137.943                    | 0.045               | 0.03   | - งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy)<br><br>- งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. ลาดหลุมแก้ว                               | - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.0                  |
| 14. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568                                                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 10.474                     | 10.474              | 100.0  | การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ                                                                                                                                                    | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.0                  |
| 15. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569                                                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 58.330                     | 48.459              | 83.1   | การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ                                                                                                                                                    | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.0                  |
| 16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564                                        | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 696.600                    | 27.360              | 3.9    | - เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี<br><br>- สามารถดำเนินการประกวดราคา งานเปลี่ยนทดแทนสวิตช์เกียร์ 22kV จำนวน 20 สถานีไฟฟ้า ได้ภายในปี 2569           | สวิตช์เกียร์ฯ GIS<br>- ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 2 สถานี<br>- ระหว่างดำเนินการปรับปรุงจำนวน 3 สถานี<br><br>- สวิตช์เกียร์ 22kV อยู่ระหว่างแก้ไข TOR                                                                                                                                                                                             | 39.0                  |
| 17. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 29.500                     | -                   | -      | จัดซื้อรถพ่วงฉีดน้ำ                                                                                                                                                                                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.0                  |
| 18. แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)                       | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 188.815                    | 0.031               | 0.0    | ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic<br>- เบิกจ่ายตามสัญญา คงเหลือ จำนวน 1 สัญญา<br>- คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมิเตอร์ Electronic (ส่วนของปี 2568) ได้ภายในปี 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแผนการจัดซื้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0                   |

\*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                           | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          |                        | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                       |
| 19. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)      | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 220.675                    | -                   | -      | จัดซื้อ Recloser และสวิตช์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | อยู่ระหว่างจัดทำสเปก                                                                                                            | 10.0                  |
| 20. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)                                                 | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 50.000                     | 101.487             | 203.0  | ปรับปรุงระบบจำหน่าย และงานรื้อถอน (ปัจจุบันคงเหลือ 18 จังหวัด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ขออนุมัติแบบประมาณการงานรื้อถอนแล้วจำนวน 17 จังหวัด (อยู่ระหว่าง กฟผ.เร่งดำเนินการ)                                             | 30.0                  |
| 21. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64) | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 168.336                    | 83.451              | 49.6   | งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา                                                                            | 10.0                  |
| 22. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)                                                                                        | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 572.586                    | 195.963             | 34.2   | หมวดสิ่งก่อสร้าง<br>- คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา 12 แห่ง แล้วเสร็จ 3 งาน                                                                    | 30.0                  |
|                                                                                                                                          |                        |                            |                     |        | หมวดที่ดิน<br>- จัดซื้อจำนวน 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ได้แปลงเป้าหมายแล้ว จำนวน 1 แห่ง และจัดซื้อแล้ว 1 แห่ง                                                                        | 50.0                  |
|                                                                                                                                          |                        |                            |                     |        | หมวดยานพาหนะ<br>- จัดทำสัญญาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ และรถรถชุดเจาะ 4x2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา                                                                                                | 15.0                  |
| 23. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)                                                                    | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 261.868                    | 0.224               | 0.1    | ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า<br>- ปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ<br>- ในส่วนของงานปี 2567 อยู่ระหว่างประกวดราคา | 16.0                  |
| 24. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)                                                                                                    | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 90.000                     | 5.420               | 6.0    | ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data                                                                                                                                                                                                                           | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน                                                                                                    | 10.0                  |
| 25. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)                                                                                              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 180.308                    | 89.462              | 49.6   | การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า                                                         | 50.0                  |
| 26. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. (มติ 65)               | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 1,244.971                  | 698.613             | 56.1   | แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้<br>1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟผ.<br>2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟผ. | 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน<br><br>2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน                                                          | 50.0                  |
| 27. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)                                                                                 | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 674.183                    | 235.725             | 35.0   | งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 6 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง<br>2) งานโยธา 4 แห่ง ส่งมอบพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ                                       | 40.0                  |

\*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |         | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                             |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 28. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และฝั่งบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่เพื่อ<br>ขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มิติ 66) | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 28.300                     | 27.638              | 97.7    | สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ และสามารถก่อสร้างได้ประมาณ<br>40% ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด ภายในปี 2569                                                                                                                              | ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.0                  |
| 29. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571 (มิติ 66)                                                                                | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 156.343                    | 77.272              | 49.4    | การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม<br>แผนปฏิบัติ                                                                                                                                                           | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย<br>ตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.0                  |
| 30. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2<br>(มิติ 66)                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 105.486                    | 10.312              | 9.8     | ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปี<br>ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 8 แห่ง                                                                                                        | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน 8 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.0                  |
| 31. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า<br>ชั่วคราว (มิติ 67)                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 172.158                    | -                   | -       | ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว                                                                                                                                                                      | อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.0                  |
| 32. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3<br>(มิติ 67)                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 455.664                    | -                   | -       | ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปี<br>ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง                                                                                                       | อยู่ระหว่างประกวดราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.0                  |
| 33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage<br>Management System : OMS) (มิติ 67)                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 95.220                     | 94.740              | 99.5    | จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน<br>1 ระบบ                                                                                                                                                                   | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.0                  |
| 34. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มิติ 67)                                                                             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 116.160                    | 63.001              | 54.2    | การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม<br>แผนปฏิบัติ                                                                                                                                                           | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย<br>ตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.0                  |
| 35. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 -<br>สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มิติ 67)                  | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 361.831                    | -                   | -       | งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1<br>- สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง                                                                                                                      | มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ขอความเห็นชอบแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0                  |
| 36. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง<br>ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มิติ 67)             | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 24.305                     | 584.882             | 2,406.4 | 1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า<br>- ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 75% ของงานทั้งหมด<br><br>2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่ม<br>ความมั่นคง<br>- ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 75% ของงานทั้งหมด | 1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า<br>- เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,379 งาน และปิดงานก่อสร้าง<br>พร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 7,224 งาน คิดเป็น 69.60%<br><br>2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่ม<br>ความมั่นคง<br>- เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,741 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อม<br>ขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 7,814 งาน คิดเป็น 89.39% | 50.0                  |
| 37. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6 (มิติ 68)                                                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 1,359.178                  | 169.218             | 12.5    | หมวดที่ดิน<br>- ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 17 แห่ง                                                                                                                                                                             | หมวดที่ดิน<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 14 แห่ง จัดซื้อแล้ว 3 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.0                  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                               |                        | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568 (มติ 68)  | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 91.296                     | 6.960               | 7.6    | - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1<br><br>- งานขยายโครงข่ายเคเบิลแก้วนำแสง : ตรวจรับรายเส้นทางและเบิกจ่ายเงินในไตรมาส 3 และ 4<br><br>- งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : ดำเนินการงานตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้<br><br>- งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (70%) (ส่งของ) ได้ในไตรมาส 4<br><br>- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล่องโทรศัพท์ศูนย์จรัญฯ : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%) ได้ในไตรมาส 4 | - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%<br><br>- งานขยายโครงข่ายเคเบิลแก้วนำแสง : อยู่ระหว่างทดสอบและส่งมอบงาน ตรวจรับรายเส้นทางจำนวน 40 เส้นทาง 12 เขต<br><br>- งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้<br><br>- งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : ได้ผู้รับจ้างแล้ว และรอจัดทำสัญญาในช่วงไตรมาสที่ 3<br><br>- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล่องโทรศัพท์ศูนย์จรัญฯ : เสร็จสิ้นการพิจารณาพิจารณาแล้ว และรอทำกระบวนการจัดซื้อต่อไป | 35.0                  |
| 39. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568 (มติ 68)           | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 32.400                     | 14.259              | 44.0   | - งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์<br><br>- ITSM Assessment and Implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว<br><br>- ดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70.0                  |
| 40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)                     | 1 ม.ค. 69 -            | 209.700                    | -                   | -      | จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | อยู่ระหว่างประกวดราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.0                  |
| 41. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)                              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 30.200                     | 3.690               | 12.2   | การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดหาและทำสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.0                  |
| 42. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน (มติ 68)              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 85.437                     | 8.565               | 10.0   | 1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ<br><br>2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 8 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ<br><br>2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.0                  |
| 43. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR (มติ 68) | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 272.000                    | -                   | -      | งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.0                  |
| 44. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement (มติ 68)              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 15.000                     | 0.026               | 0.2    | งานพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการบริการลูกค้า จำนวน 3 ระบบ และงานพัฒนา PEA LINE 1 ระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - มีการปรับขอบเขตงาน เพื่อให้เข้าเชื่อมกับระบบ CBS 3<br>- งานพัฒนา PEA LINE ดำเนินการหาผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.0                  |
| 45. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มติ 68)              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 112.440                    | 10.226              | 9.1    | งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 1 รายการ<br>- อยู่ระหว่างจัดพิจารณาพิจารณา 1 รายการ<br>- อยู่ระหว่างพิจารณาผล 1 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.0                  |

\*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ      | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละความสำเร็จ* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                        | แผนฯประจำปี                | ผลา<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 46. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573 (มติ 68)                                                                                                                                                                | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 132.925                    | 65.337              | 49.2   | การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.0              |
| 47. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3 (มติ 68)                                                                                                                                                   | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 404.302                    | 54.537              | 13.5   | งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง (น่าน, ปทุมธานี) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.0              |
| 48. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) (มติ 68) | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 410.671                    | 190.573             | 46.4   | แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.0              |
| 49. แผนงานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (งานเพิ่มเติม ปี 68)                                                                        | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 204.500                    | 0.656               | 0.3    | เช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - อยู่ระหว่างผู้ให้เช่าซื้อติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Fixed Radio, Mobile Radio), อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater และอุปกรณ์ตามสัญญา (ภาคเหนือ 70%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80%, ภาคใต้ 70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.0              |
| 50. แผนงานบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของซอฟต์แวร์สำหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM-Software) (งานเพิ่มเติม ปี 68)                                              | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | -                          | -                   | -      | งานบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของซอฟต์แวร์สำหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM-Software)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปรับปรุง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0              |
| 51. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568 (งานเพิ่มเติม ปี 68 )                                                                                       | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 500.000                    | 306.796             | 61.4   | แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 3 ปี 2568 (1 ปี)<br>- ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ > 25% ของงานทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 3,477 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 502 งาน คิดเป็น 14.44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.0              |
| 52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2569 (มติ 69)                                                                                                                                   | 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 318.508                    | 4.254               | 1.3    | - งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (40%)<br>- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : จัดซื้อได้คู่สัญญา, เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%), ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (55%)<br><br>- งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%)<br>- งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%)<br>- งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 (100%)<br>- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : จัดซื้อได้คู่สัญญา, ส่งของ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (60%) | - งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : กำลังดำเนินการตรวจรับ และส่งมอบงานงวดที่ 1 คาดเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 3<br><br>- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ได้สัญญาสำหรับ<br>1. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างติดตั้ง<br>2. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch สำหรับใช้งานร่วมกับโครงข่าย IP Access Network อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา<br>- งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา<br>- งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างประกวดราคา และพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน<br>- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา | 50.0              |

\*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 53. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2569 (มติ 69)                                                                            | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 308.325                    | 0.678               | 0.2    | - งาน Infrastructure & Hardware จำนวน 4 รายการ<br>- งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ<br>- SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ<br>- IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ            | - งาน Infrastructure & Hardware จำนวน 4 รายการ ได้ผู้รับจ้าง<br>แล้ว 1 รายการ และอยู่ระหว่างประกวดราคา หาผู้รับจ้าง จำนวน<br>3 รายการ<br>- งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ<br>อยู่ระหว่างประกวดราคา หาผู้รับจ้าง<br>- SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่าง<br>ประกวดราคา หาผู้รับจ้าง<br>- IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างประกวดราคา<br>หาผู้รับจ้าง | 20.0                  |
| 54. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2569<br>(มติ 69)                                                                    | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 335.492                    | 133.455             | 39.8   | งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม<br>10 รายการ                                                                                                                                       | - ดำเนินการจัดซื้อ และจ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 รายการ<br>- จัดทำสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ<br>- อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 3 รายการ<br>- ยกเลิก 1 รายการ                                                                                                                                                                                                                                 | 30.0                  |
| 55. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (มติ 69)                                                                                   | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 146.343                    | -                   | -      | - ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และ<br>โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า<br>- ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์<br>ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า | - จัดทำสัญญาแล้ว 2 สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.0                  |
| 56. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง<br>ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2569 (มติ 69)                                 | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 849.750                    | 147.931             | 17.4   | แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 4 ปี 2569-2570<br>(2 ปี)<br>- ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนว > 5% ของงานทั้งหมด                                                                                        | - งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 997 งาน และปิดงาน<br>ก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 0 งาน คิดเป็น<br>0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.0                  |
| 57. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรอง<br>สำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปี 2569 (มติ 69) | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 25.909                     | -                   | -      | จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง<br>รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน                                                                                                        | อยู่ระหว่างจัดทำสเปก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.0                   |
| 58. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2569 - 2574                                                                                                          | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 68.779                     | -                   | -      | การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม<br>แผนปฏิบัติการ                                                                                                                                    | อนุมัติหลักการ/สเปกเรียบร้อยแล้ว อนุมัติเข้าแล้ว บางประเภทได้<br>สัญญาแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.0                  |
| รวมแผนงานระยะยาว                                                                                                                               |                           | 12,617.115                 | 3,597.022           | 28.5   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                                                |                           | 29,314.948                 | 8,671.323           | 29.6   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |

\*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

| โครงการ/แผนงาน                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท) |                     |        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                              | ผลการดำเนินงานปี 2569<br>(ไตรมาส 1-2)                                         | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ* |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                  |                           | แผนฯ<br>ประจำปี            | ผลฯ<br>(ไตรมาส 1-2) | ร้อยละ |                                                                                                                              |                                                                               |                       |
| 3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 1 ม.ค. 69 -<br>31 ธ.ค. 69 | 281.152                    | 87.492              | 31.1   | 1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม | ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด<br>ในไตรมาส 1 | 50.0                  |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก    |                           |                            |                     |        | 2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)               | ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญา             | 50.0                  |
|                                                  |                           |                            |                     |        | 3. แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ                                                     | อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผล                                          | 25.0                  |
| รวม                                              |                           | 281.152                    | 87.492              | 31.1   |                                                                                                                              |                                                                               |                       |
| รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)                          |                           | 34,672.951                 | 12,049.319          | 34.8   |                                                                                                                              |                                                                               |                       |
