



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2569

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สถานะ 30 กันยายน 2569

ไตรมาส 1-3


(ม.ค. – ก.ย.)



เป้าเบิกจ่าย 22,616 ล้านบาท

จ่ายจริง 22,616 ล้านบาท (100.0%)

ทั้งปี

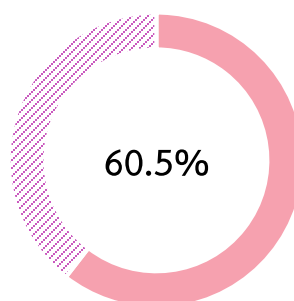


เป้าเบิกจ่าย 37,380 ล้านบาท

จ่ายจริง 22,616 ล้านบาท (60.5%)

คงเหลือ 14,764 ล้านบาท (39.5%)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 รายไตรมาส

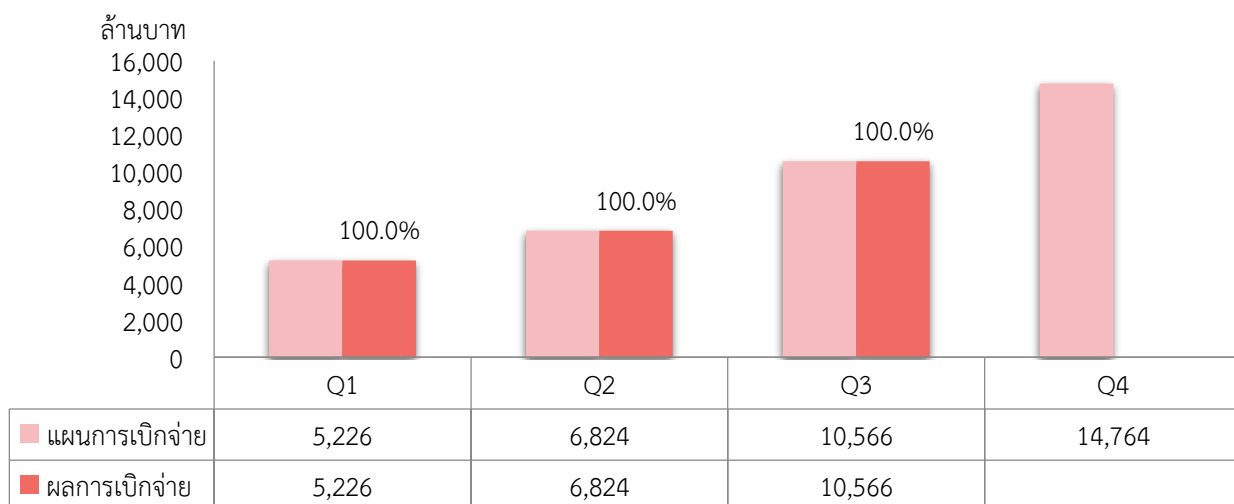

หมายเหตุ:

- มติ ครม. 14 ตุลาคม 2568 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2569 วงเงิน 105,324.420 ล้านบาท และ 34,398.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- ตามความเห็นชอบของ สศช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการโครงการ คพม.3 วงเงิน 1,400 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 274 ล้านบาท ทำให้วงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 106,724.420 ล้านบาท และ 34,672.951 ล้านบาท ตามลำดับ
- คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและความสามารถในการดำเนินงาน ทำให้วงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 115,361.020 ล้านบาท และ 38,005.150 ล้านบาท ตามลำดับ
- สศช. พิจารณาปรับลดงานขยายเขตรบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปรับลดวงเงินดำเนินการ 1,200 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 504.456 ล้านบาท, งานก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจ่ายไฟลูกค้ารายใหญ่พิเศษ ในพื้นที่ EEC ระยะที่ 1 ปรับลดวงเงินดำเนินการ 358.030 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 47.688 ล้านบาท และงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล ปรับลดวงเงินดำเนินการ 200 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่าย 72.670 ล้านบาท รวมปรับลดวงเงินดำเนินการ 1,758.030 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่าย 624.814 ล้านบาท
- สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่าย จาก 115,361.020 ล้านบาท และ 38,005.150 ล้านบาท เป็น 113,602.990 ล้านบาท และ 37,380.336 ล้านบาท ตามลำดับ

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2569

สถานะ 30 มิถุนายน 2569

สรุปภาพรวมผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-ก.ย. 2569			%จ่ายจริงเทียบกับ
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		กับเป้าหมาย
			วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	6,943.647	5,412.601	5,380.874	99.4	77.5
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	30,208.975	17,065.616	17,076.119	100.1	56.5
- รายปี	19,718.462	11,304.722	11,093.296	98.1	56.3
- ระยะยาว	10,490.513	5,760.894	5,982.823	103.9	57.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	227.714	137.602	158.826	115.4	69.7
รวมทั้งสิ้น	37,380.336	22,615.819	22,615.819	100.0	60.5

รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2569	ม.ค.-ก.ย. 2569			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	18.500	16.100	4.049	25.1	21.9
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	240.296	129.377	52.808	40.8	22.0
3. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	0.500	0.500	3.406	681.2	681.2
4. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	700.000	464.000	692.530	149.3	98.9
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	210.698	199.207	149.376	75.0	70.9
6. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	49.800	15.000	72.444	483.0	145.5
7. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	-	-	169.609	-	-
8. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ต่างๆ (เกาะป็นห้อย จ.พังงา) (คตป.)	17.553	17.553	17.495	99.7	99.7
9. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	-	-	-	-	-
10. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	4,300.000	3,879.264	3,968.577	102.3	92.3
11. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (คพช.)	206.300	154.600	0.993	0.6	0.5
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1,000.000	441.000	247.979	56.2	24.8
13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คชก.3)	200.000	96.000	1.608	1.7	0.8
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	6,943.647	5,412.601	5,380.874	99.4	77.5
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	19,718.462	11,304.722	11,093.296	98.1	56.3
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,490.513	5,760.894	5,982.823	103.9	57.0
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	30,208.975	17,065.616	17,076.119	100.1	56.5
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	98.816	67.943	74.360	109.4	75.3
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	100.412	69.659	84.466	121.3	84.1
แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	28.486	-	-	-	-
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	227.714	137.602	158.826	115.4	159.4
รวมทั้งสิ้น	37,380.336	22,615.819	22,615.819	100.0	60.5

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	6,943.647	5,380.874	77.5
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	30,208.975	17,076.119	56.5
2.1 งานรายปี		19,718.462	11,093.296	56.3
2.2 แผนงานระยะยาว		10,490.513	5,982.823	57.0
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	227.714	158.826	69.7
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		37,380.336	22,615.819	60.5

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
1. งบลงทุนที่ห้าเป็นโครงการ							
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	18.500	4.049	21.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	40.0
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	240.296	52.808	22.0	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการงานตามงวดงานของสัญญา	70.2
3. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.500	3.406	681.2	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงตํารองรับสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟฉ.2 จำนวน 10 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง	75.0
4. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	700.000	692.530	98.9	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี จำนวน 2 แห่ง	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ.แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควีดำเนินการแล้วเสร็จ	92.5
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	210.698	149.376	70.9	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 3 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 2. งานจ้างเหมาสายส่ง 115 เควี จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	85.0
6. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	49.800	72.444	145.5	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง 2. งานเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	53.0
7. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	169.609	-	งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	95.0
8. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	17.553	17.495	99.7	งานจ้างเหมาก่อสร้าง Concrete Matt เพื่อป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำไม่ให้ได้รับความเสียหายจากคลื่นน้ำ หรือท้องเรือที่จะมากระทบจำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการครบตามแผนงานแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ	100.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
9. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	-	-	-	ปิดโครงการ	ปี 2568 ดำเนินงานครบตามแผนงานแล้ว และ ผวก. อนุมัติปิดโครงการ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2569	100.0
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	4,300.000	3,968.577	92.3	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 12 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 6 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ระยะทาง 1,675.839 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 102.041 วงจร-กม. - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 310.201 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี อยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 7 แห่ง แล้วเสร็จ 5 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 แห่ง และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตามสัญญา 2 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,048.852 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 626.441 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	70.5
11. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	206.300	0.993	0.5	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างระบบไมโครกริด จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงานของสัญญา 2. งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ของสัญญา	55.0
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,000.000	247.979	24.8	ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 27,020 ครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6,080 ครัวเรือน อยู่ระหว่างก่อสร้างฯ จำนวน 10,448 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างทยอยขออนุมัติดำเนินการ ก่อสร้างฯ จำนวน 10,432 ครัวเรือน	22.5
13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คชก.3)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	200.000	1.608	0.8	ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน 10,000 ราย	อยู่ระหว่างทยอยขออนุมัติขยายเขต จำนวน 832 ราย	-
รวมงบลงทุนที่เป็นโครงการ		6,943.647	5,380.874	77.5			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.1 งานรายปี	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	19,718.462	11,093.296	56.3			
					หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า - งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟฟ้า ทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวน ไม่แน่นอนประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. 2. ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง คาดแล้วเสร็จปี 2569 จำนวน 1 แห่ง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 1.งานจัดหาหม้อเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย - จัดหาหม้อเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยน ตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณี หม้อแปลงชำรุด - จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ) หมวดเครื่องมือใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก - งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.	- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ตามแผน 2 งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7 แห่ง ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งของ 2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน อนุมัติปฏิบัติงานในปี 2569 เรียบร้อยแล้ว	50.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
2.2 แผนงานระยะยาว							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	21.420	0.405	1.9	หมวดสิ่งก่อสร้าง - คาดว่าจะดำเนินจัดทำสัญญางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กฟต. 3 พร้อมทั้งเบิกจ่าย ADV ได้ภายในปี 2569	- อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	60.0
2. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝฟ.)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5.853	-	-	การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า	ยกเลิกเนื่องจากเทคโนโลยีล้ำสมัย	-
3. แผนงานพัฒนากูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.467	0.467	100.0	พัฒนาเชื่อมโยง Map Service ของสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจากระบบ TAMS มาแสดงผลในระบบ GIS	เบิกจ่ายงวดงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว	100.0
4. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	139.256	70.843	50.9	หมวดที่ดิน จัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง (กฟจ.มุกดาหาร กฟย.ห้วยใหญ่) หมวดสิ่งก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 จำนวน 7 แห่ง (โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 69 รวม 5 แห่ง)	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อกับ ผวก. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา 6 แห่ง และอยู่ระหว่าง ประกวดราคา 1 แห่ง	60.0 30.0
5. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	7.846	5.861	74.7	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	75.0
6. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	13.204	0.341	2.6	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม)	1. มีการยกเลิกดำเนินการเนื่องจากปรับปรุงสเปค จำนวน 1 รายการ และรอลงนามในสัญญา จำนวน 1 รายการ 2. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่	40.0
7. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	62.323	3.060	4.9	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน	ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ 3 เส้นทางจาก 11 เส้นทาง โดยลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	35.0
8. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	96.518	24.432	25.3	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	35.0
9. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	45.000	13.674	30.4	ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดราไวย์	อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมทางหลวง เพื่อเริ่มดำเนินการด้านโยธา (ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้)	-
10. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.097	0.097	100.0	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
11. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	5.000	57.470	1,149.4	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 2 ปี 2563-2566 (4 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ 100% ของงานทั้งหมด - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ 100% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,092 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 16,968 งาน คิดเป็น 99.27% - งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 10,246 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 10,152 งาน คิดเป็น 99.08%	99.0
12. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	106.990	28.576	26.7	งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM)	- งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร EPM) ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารับประกัน บำรุงรักษา และคุ้มครองระบบตามสัญญา 2 ครั้ง / ปี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM) ได้สัญญาพร้อมจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาในไตรมาส 4 ปี 2569	85.0
13. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	4.995	0.045	0.90	- งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy) - งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. ลาดหลุมแก้ว	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 ปี 2569 - อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา และจะทำสัญญาช่วงไตรมาส 4 ปี 2569	40.0
14. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	10.474	10.474	100.0	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	100.0
15. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	58.330	56.090	96.2	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	95.0
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	69.302	43.614	62.9	- เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี - สามารถดำเนินการประกวดราคา งานเปลี่ยนทดแทนสวิตช์เกียร์ 22kV จำนวน 20 สถานีไฟฟ้า ได้ภายในปี 2569	สวิตช์เกียร์ฯ GIS - ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 2 สถานี - ระหว่างดำเนินการปรับปรุงจำนวน 3 สถานี - สวิตช์เกียร์ 22kV อยู่ระหว่างแก้ไข TOR	40.0
17. แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	232.810	0.031	0.0	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์ Electronic	คงเหลือ 1 สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย	25.0
18. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	186.909	110.538	59.1	ปรับปรุงระบบจำหน่าย และงานรื้อถอน (ปัจจุบันคงเหลือ 18 จังหวัด)	ขออนุมัติแบบประมาณการงานรื้อถอนแล้วจำนวน 17 จังหวัด (อยู่ระหว่าง กฟภ.เร่งดำเนินการ)	40.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนประจำปี	ผล (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
19. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	168.335	125.712	74.7	งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	30.0
20. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	297.426	358.850	120.7	หมวดสิ่งก่อสร้าง - คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปี 2569 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานสัญญา 25 แห่ง แล้วเสร็จ 6 งาน	40.0
					หมวดที่ดิน - จัดซื้อจำนวน 2 แห่ง	- จำนวน 1 แห่ง ผวก. อนุมัติแผนเมื่อ 24 ก.ค. 69 และจัดซื้อแล้ว 1 แห่ง	50.0
					หมวดยานพาหนะ - จัดทำสัญญาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ และรถชุดเจาะ 4x2	- ปัจจุบันทำสัญญาแล้วทั้ง 2 ประเภท	50.0
21. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	153.583	0.224	0.1	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า - ปิดงานปี 2566 แล้วเสร็จ - ในส่วนของงานปี 2567 อยู่ระหว่างประกวดราคา	16.0
22. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	54.195	32.517	60.0	ติดตั้งเครื่องมือ Master Data Management (MDM) และแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Platform) และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน	60.0
23. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	180.307	134.710	74.7	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0
24. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. (มติ 65)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,136.993	698.613	61.4	แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 1. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของ กฟผ. 2. งานจัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟผ.	1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน	61.4
25. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	527.532	313.743	59.5	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 6 แห่ง	1) งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง 2) งานโยธา 4 แห่ง ส่งมอบพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	59.0
26. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และฝั่งบริเวณ กฟผ. สำนักงานใหญ่เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	28.300	33.068	116.8	สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ และสามารถก่อสร้างได้ประมาณ 40% ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด ภายในปี 2569	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน	37.0
27. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	156.431	116.374	74.4	การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0
28. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	135.228	10.865	8.0	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 8 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน 8 แห่ง	48.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนฯประจำปี	ผลฯ(ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
29. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2567	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	0.982	0.066	6.7	งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมคำดำเนินการ	อยู่ระหว่างติดต่อกำเข้าเพื่อต่อท่อลดร้อยเสาได้วางรถไฟกับหน่วยงานภายนอก (รฟท.)	15.0
30. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	86.594	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	30.0
31. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	31.120	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อยู่การใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างประกวดราคา	20.0
32. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	94.740	94.740	100.0	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	29.0
33. แผนงานเขายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	118.428	94.348	79.7	การเขายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	75.0
34. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	105.577	0.915	0.9	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	อยู่ระหว่าง กฟภ. ดำเนินการในส่วนขออนุญาต และปักเสาพาดไฟ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแผนในส่วนขออนุญาตจ้างเหมา	15.0
35. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	493.878	830.370	168.1	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 75% ของงานทั้งหมด 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 75% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 11,116 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 8,263 งาน คิดเป็น 74.33% 2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 9,470 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 8,263 งาน คิดเป็น 87.25%	80.0
36. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,106.306	433.278	39.2	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 17 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 17 แห่ง หมวดยานพาหนะ - ดำเนินการจัดหายานพาหนะ 7 ประเภท หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	หมวดที่ดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 14 แห่ง จัดซื้อแล้ว 8 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 20 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 6 แห่ง หมวดยานพาหนะ - เป็นวงเงินสัญญาแล้ว 6 ประเภท คงเหลือ 7 รายการอยู่ระหว่างจัดซื้อ หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	40.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
37. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	52.305	19.417	37.1	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เเรงการเบิกจ่ายเงินในไตรมาส 4 - งานบำรุงรักษาและให้บริการโครงข่าย WAN : ดำเนินการงานตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เเรงการเบิกจ่ายเงิน (ส่งของพร้อมติดตั้ง) ในไตรมาส 4 - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ : จัดซื้อได้คู่สัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%) ได้ในไตรมาส 4	- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินแล้ว 100% - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง : อยู่ระหว่างทยอย และตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเส้นทางจำนวนรวม 40 เส้นทาง 12 เขต - งานบำรุงรักษาและให้บริการโครงข่าย WAN : เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. : อยู่ระหว่างทยอย และตรวจรับงาน - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ : เสร็จสิ้นการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว และรอทำกระบวนการร่างสัญญาจาก กนต.ต่อไป	55.0
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	47.416	45.165	95.3	คงเหลืองานระหว่างดำเนินการ - ITSM Assessment and Implementation	- ดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างส่งมอบงานระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องสำหรับศูนย์ PEA Service Desk ทดแทนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ระบบ	80.0
39. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	57.359	3.690	6.4	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดหาและทำสัญญา	20.0
40. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	56.501	8.985	15.9	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 8 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามสัญญา	34.0
41. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	40.000	-	-	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และทำสัญญา	25.0
42. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	4.800	0.031	0.6	งานพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการบริการลูกค้า จำนวน 3 ระบบ และงานพัฒนา PEA LINE 1 ระบบ	- มีการปรับขอบเขตงานพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้เข้าช้กับระบบ CBS 3 และดำเนินการเปลี่ยนแปลงปรับลดด้านงบประมาณ - งานพัฒนา PEA LINE ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	30.0
43. แผนงานการขยายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	194.846	104.589	53.7	- ระบบบริหารและจัดการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารสนเทศเพิ่มเติม SOAR-SIEM - งานสิทธิระบบ Network Segmentation and Isolation Aruba-SOWAN	- อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่ายงวดสุดท้าย - อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อเสนอแนะจากพิจารณา	50.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
44. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	98.883	97.549	98.7	การเข้ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	75.0
45. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3 (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	361.204	143.135	39.6	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 แห่ง	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 แห่ง (อ.ศรีราชา, น่าน, ปทุมธานี) และอยู่ ระหว่างก่อสร้าง 9 แห่ง	45.0
46. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก (รชช.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) (มติ 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	395.909	293.241	74.1	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	74.1
47. แผนงานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	60.060	0.825	1.4	เช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	อยู่ระหว่างผู้ให้เช่าซื้อติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Fixed Radio, Mobile Radio), อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater และอุปกรณ์ตามสัญญา (ภาคเหนือ 70%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80%, ภาคใต้ 70%)	30.0
48. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568 (งานเพิ่มเติม ปี 68)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	720.000	827.925	115.0	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 3 ปี 2568 (1 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ > 25% ของงานทั้งหมด	- งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 5,873 งาน และปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 700 งาน คิดเป็น 11.92%	60.0
49. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	244.714	25.078	10.2	- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ดำเนินการจัดทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : ดำเนินการ จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : จัดดำเนินการจัดทำ สัญญาเรียบร้อยแล้ว - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : ดำเนินการ จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network : กำลัง ดำเนินการตรวจรับ และส่งมอบงานงวดที่ 1 คาดเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 4 - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network : ได้สัญญาสำหรับ 1. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network อยู่ระหว่างติดตั้ง ส่งมอบงาน 2. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch สำหรับใช้งานร่วมกับ โครงข่าย IP Access Network อยู่ระหว่างติดตั้ง ส่งมอบงาน - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 700 กม. : อยู่ระหว่างติดตั้ง ส่งมอบงาน งวดที่ 1 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน - งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล : ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดเบิกจ่ายได้ 60% ในไตรมาส 4 - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN : อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามงวดงาน - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อใช้งานเป็นโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link) Gateway Node รองรับ Traffic ที่มาจากภาคอื่น : อยู่ระหว่างติดตั้ง ส่งมอบงาน งวดที่ 1	60.0

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละความสำเร็จ*
		แผนฯประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
50. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	308.325	9.482	3.1	- งาน Infrastructure & Hardware จำนวน 4 รายการ - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ - IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ	- งาน Infrastructure & Hardware ได้ผู้รับจ้างแล้ว 2 รายการ, อยู่ระหว่างประกวดราคา หาผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ และเบิกจ่าย ครบถ้วน จำนวน 1 รายการ - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน อยู่ระหว่างทำราคากลาง จำนวน 4 รายการ และรออนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ - SOC Improvement for IT OT จำนวน 1 รายการ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในปี 2570 - IaaS Implementation จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างต่อรองราคา และดำเนินการด้านเอกสารจากผู้ขาย	40.0
51. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	333.374	213.795	64.1	งานซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 10 รายการ	- ดำเนินการจัดซื้อ และจ่ายเงินแล้ว จำนวน 7 รายการ - จัดทำราคากลาง และหาผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ - ดำเนินการตามเป้าปี 2570 จำนวน 1 รายการ - ยกเลิก 1 รายการ	60.0
52. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	145.716	-	-	- ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า - ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า	- จัดทำสัญญาแล้ว 2 สัญญา	25.0
53. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	1,339.260	482.167	36.0	แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนฯ ระยะที่ 4 ปี 2569-2570 (2 ปี) - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนว > 5% ของงานทั้งหมด	- งานย้ายแนวฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 3,616 งาน และปิดงาน ก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 106 งาน คิดเป็น 2.93%	15.0
54. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปี 2569 (มติ 69)	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	18.218	3.338	-	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างจัดทำสเปก	10.0
55. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2569 - 2574	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	58.286	-	-	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อนุมัติหลักการ/สเปกเรียบร้อยแล้ว อนุมัติเข้าแล้ว บางประเภทได้ สัญญาแล้ว	60.0
56. แผนงานเช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้าตัดช่อง ปี 2569		10.588		-	- จะสามารถเช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้าได้ทั้งหมด และเบิกจ่ายค่าเช่าได้ ไตรมาส 4	- ปัจจุบันอนุมัติเข้าแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบรถ	50.0
รวมแผนงานระยะยาว		10,490.513	5,982.823	57.0			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		30,208.975	17,076.119	56.5			

*ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2569 (ไตรมาส 1-2)	ร้อยละ ความสำเร็จ*
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ไตรมาส 1-3)	ร้อยละ			
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69	227.714	158.826	69.7	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด ในไตรมาส 1	70.0
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญา	70.0
					3. แผนงานเช่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ทดแทนและ เพิ่มประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผล	25.0
รวม		227.714	158.826	69.7			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		37,380.336	22,615.819	60.5			
