



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	<u>15.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>39,018.870</u></u>	ลบ.

ผลการเบิกจ่าย  
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

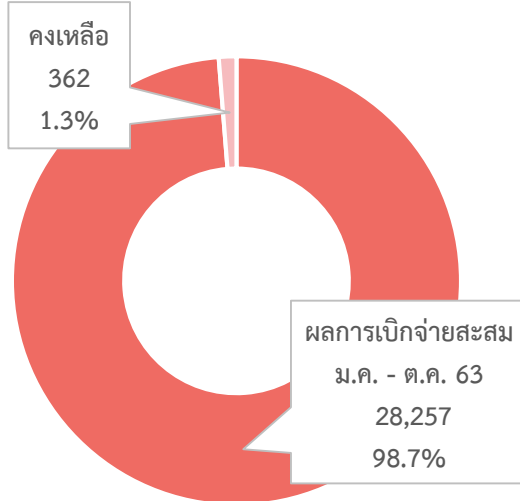


■ ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ต.ค. 63 ■ คงเหลือ

ผลการเบิกจ่าย  
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2563

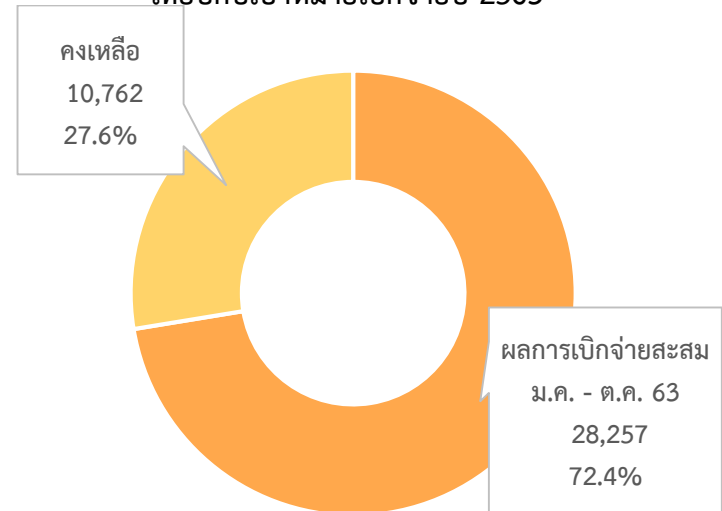

■ ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ต.ค. 63 ■ คงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563

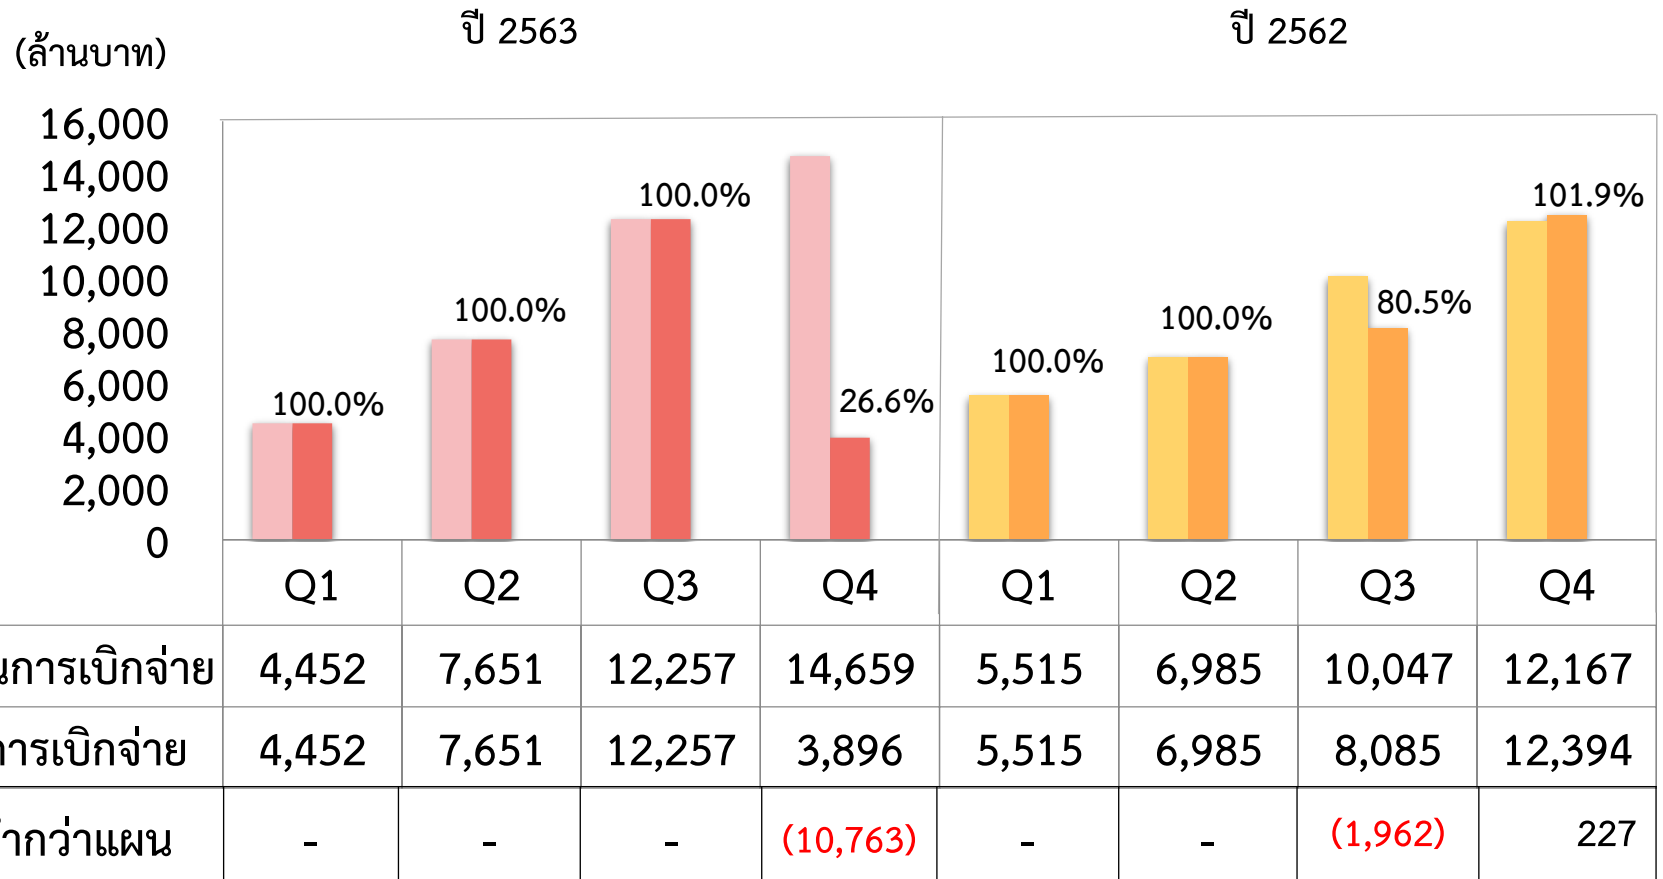

หน่วย : ล้านบาท  
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ตุลาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	14,970.233	13,813.356	92.3	66.6
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	13,648.717	14,443.317	105.8	79.0
- รายปี	7,772.755	5,870.590	6,565.073	111.8	84.5
- ระยะยาว	10,505.623	7,778.127	7,878.244	101.3	75.0
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	28,618.950	28,256.673	98.7	72.4

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ตุลาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	57.000	132.161	231.9	88.1
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	96.474	85.710	101.874	118.9	105.6
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	9.616	90.2	90.2
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	144.289	133.329	92.4	65.0
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	200.176	340.213	170.0	85.1
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	743.845	743.121	99.9	68.8
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	236.108	161.817	68.5	43.9
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	997.545	408.279	40.9	31.9
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	4.397	159.8	159.8
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	378.236	252.807	66.8	36.7
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	487.133	66.162	13.6	11.9
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	4.525	4.525	20.756	458.7	458.7
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	15.670	2.670	2.740	102.6	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	251.100	404.490	161.1	130.5
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	170.000	157.258	180.955	115.1	106.4

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - ตุลาคม 2563			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (ต่อ)</b>					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	9,024.000	8,131.758	90.1	64.2
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	40.212	53.7	53.7
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	937.222	1,202.714	128.3	110.4
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	182.783	383.945	210.1	153.6
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	783.033	989.941	126.4	90.0
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	205.551	187.928	23.820	12.7	11.6
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	-	4.250	-	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	19.020	0.304	1.6	1.4
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	2.400	73.695	3,070.6	491.3
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>	<b>20,740.492</b>	<b>14,970.233</b>	<b>13,813.356</b>	<b>92.3</b>	<b>66.6</b>
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	5,870.590	6,565.073	111.8	84.5
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	10,505.623	7,778.127	7,878.244	101.3	75.0
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>18,278.378</b>	<b>13,648.717</b>	<b>14,443.317</b>	<b>105.8</b>	<b>79.0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,018.870</b>	<b>28,618.950</b>	<b>28,256.673</b>	<b>98.7</b>	<b>72.4</b>

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563
