



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	39,003.870	ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลาคม 2562)
ปรับเพิ่ม	15.000	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2563)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u>39,018.870</u>	ลบ.

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

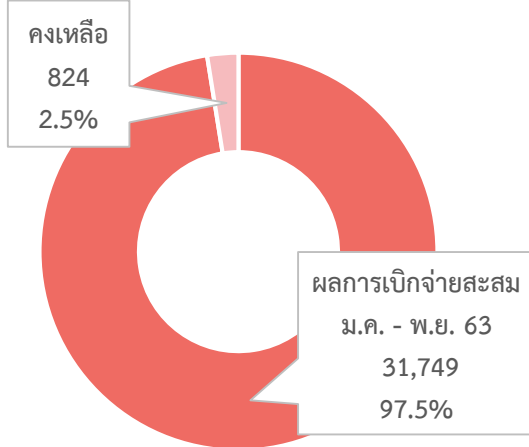

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - พ.ย. 63
- คงเหลือ


ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2563

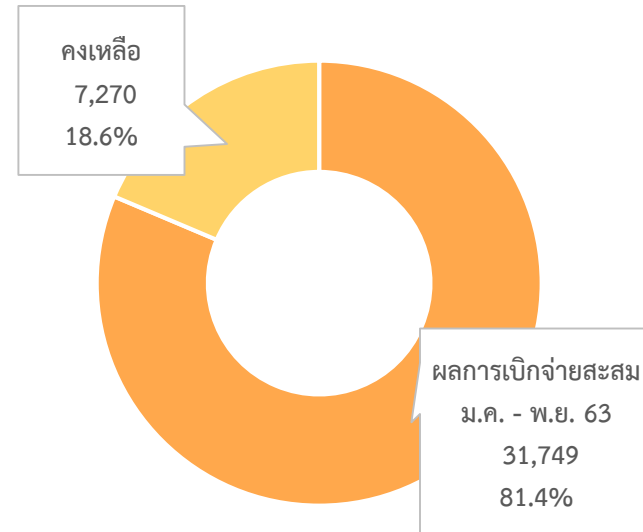

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - พ.ย. 63
- คงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

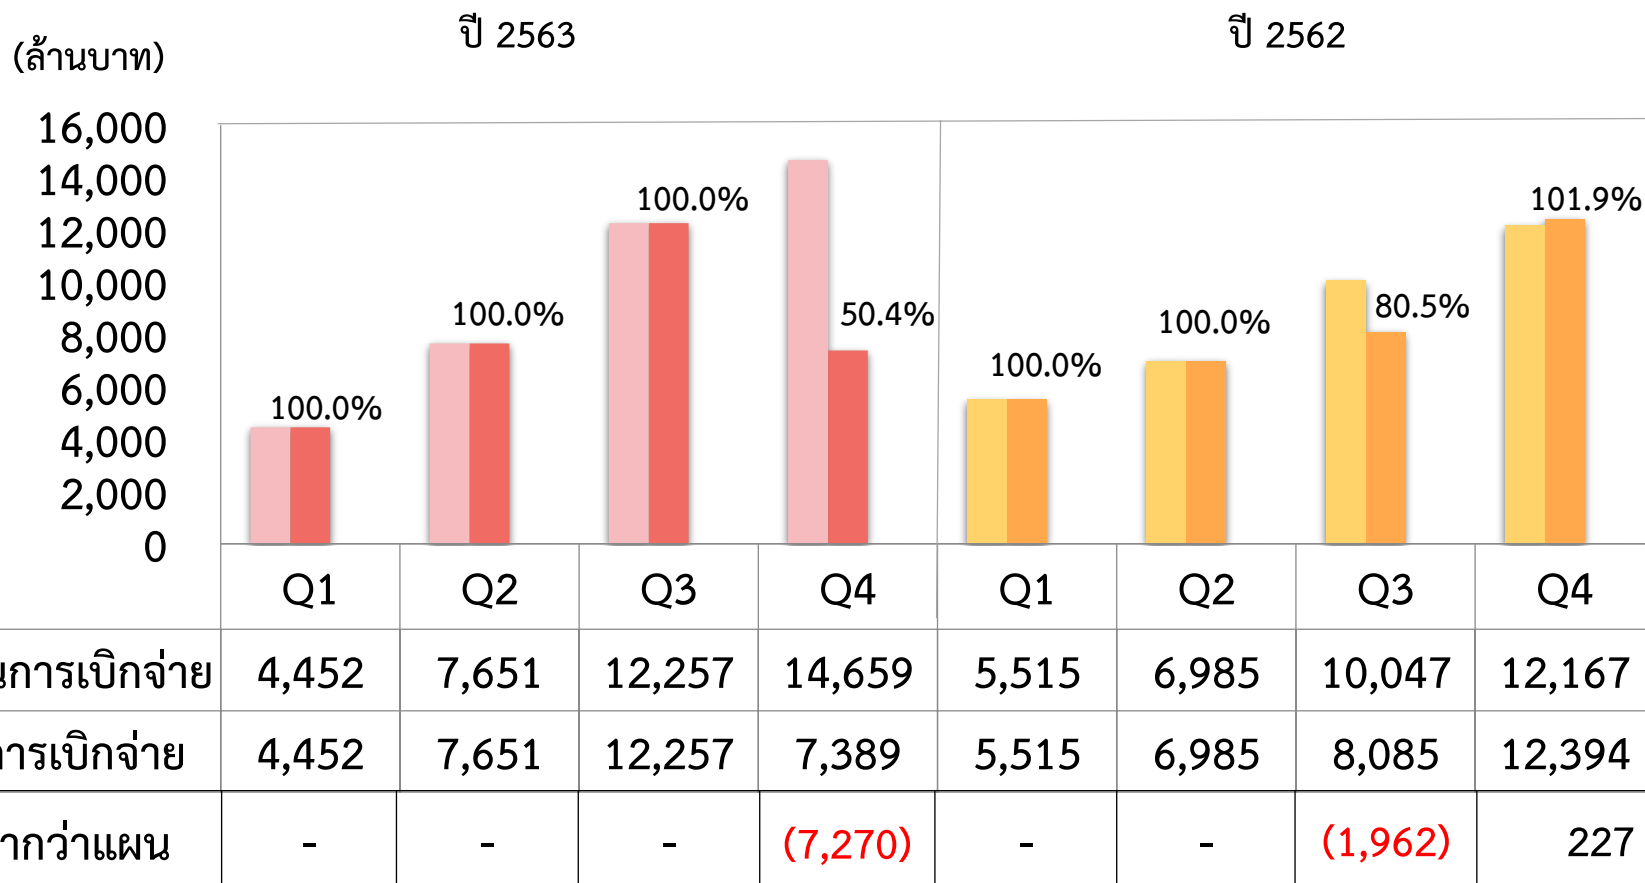

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - พฤศจิกายน 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2563		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	17,254.665	15,401.651	89.3	74.3
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	15,317.871	16,347.006	106.7	89.4
- รายปี	7,772.755	6,835.028	7,511.649	109.9	96.6
- ระยะยาว	10,505.623	8,482.843	8,835.357	104.2	84.1
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	32,572.536	31,748.657	97.5	81.4

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - พฤศจิกายน 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	150.000	81.200	151.099	186.1	100.7
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถั้ว 3) ไปยังเกาะสมุย	96.474	85.710	102.058	119.1	105.8
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	10.659	10.659	9.616	90.2	90.2
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	205.000	163.911	194.659	118.8	95.0
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	400.000	299.676	341.569	114.0	85.4
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,080.000	844.247	769.232	91.1	71.2
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	368.708	276.373	181.438	65.6	49.2
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	1,281.238	1,135.337	444.635	39.2	34.7
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	2.751	2.751	4.397	159.8	159.8
10. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	479.537	419.136	261.073	62.3	37.9
11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	555.737	488.716	85.177	17.4	15.3
12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	4.525	4.525	20.756	458.7	458.7
13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	15.670	2.670	2.740	102.6	17.5
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	310.000	282.100	436.219	154.6	140.7
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	170.000	169.558	187.074	110.3	110.0

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2563	มกราคม - พฤศจิกายน 2563			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (ต่อ)					
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,672.770	10,601.000	9,203.774	86.8	72.6
17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	74.842	74.842	40.297	53.8	53.8
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,089.630	1,041.971	1,279.402	122.8	117.4
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	250.000	188.013	434.265	231.0	173.7
20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,100.000	851.222	1,086.747	127.7	98.8
21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	205.551	202.928	23.820	11.7	11.6
22. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	181.000	-	4.250	-	-
23. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	21.400	20.020	0.336	1.7	1.6
24. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	15.000	8.100	137.018	1,691.6	913.5
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	20,740.492	17,254.665	15,401.651	89.3	74.3
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7,772.755	6,835.028	7,511.649	109.9	96.6
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,505.623	8,482.843	8,835.357	104.2	84.1
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	18,278.378	15,317.871	16,347.006	106.7	89.4
รวมทั้งสิ้น	39,018.870	32,572.536	31,748.657	97.5	81.4

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563
