


งบลงทุนประจำปี 2564


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	43,984.640	ลบ. (มติ ครม. 29 กันยายน 2563)
ปรับเพิ่ม	1,286.000	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 30 เมษายน 2564)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u>45,270.640</u>	ลบ.

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

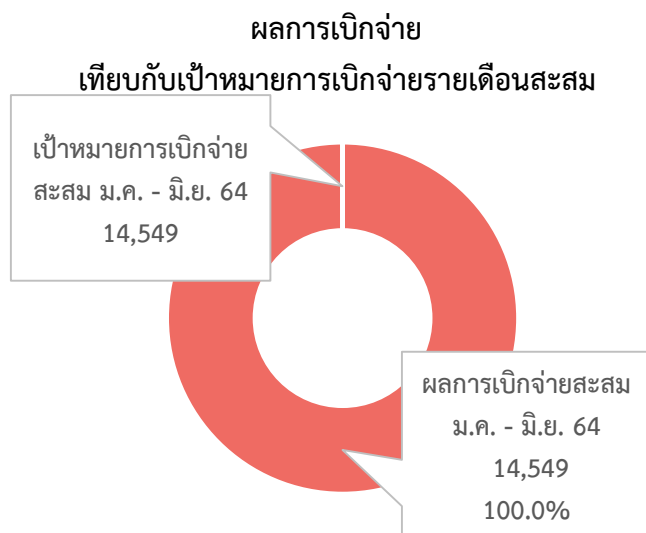

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 64
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 64

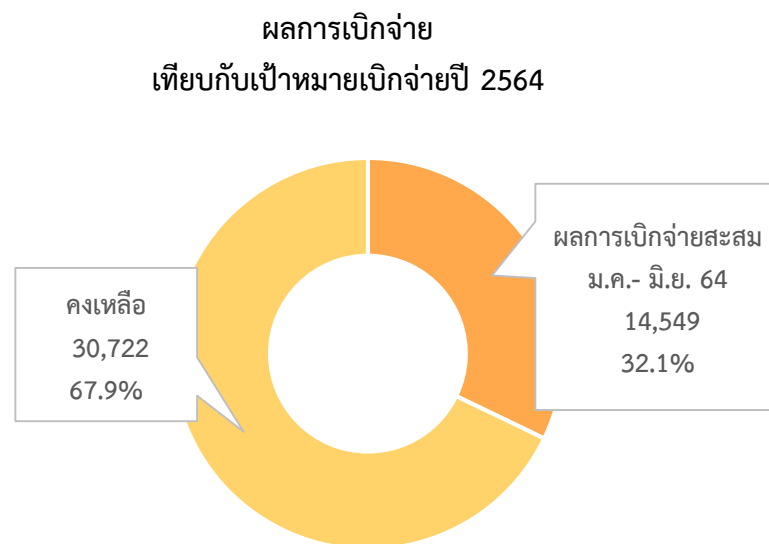

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 64
- คงเหลือ

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564


หน่วย : ล้านบาท

(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

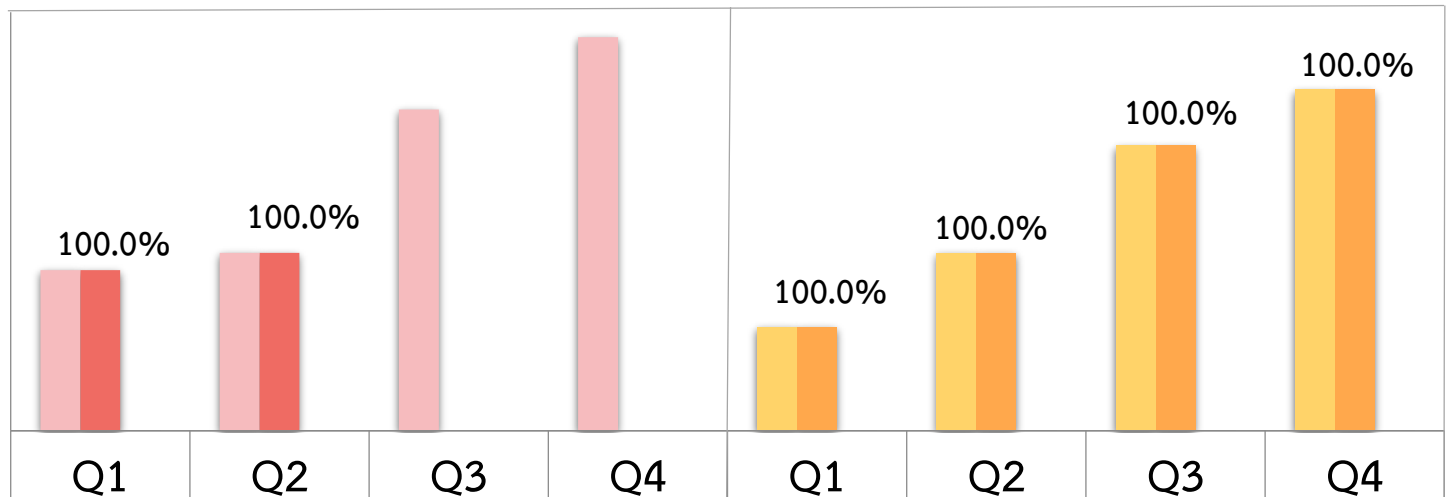

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
แผนการเบิกจ่าย	6,902	7,647	13,808	16,914	4,452	7,651	12,257	14,659
ผลการเบิกจ่าย	6,902	7,647	-	-	4,452	7,651	12,257	14,659
สูง/ต่ำกว่าแผน	-	-	-	-	-	-	-	-

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มิถุนายน 2564			%จ่ายจริง
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2564		เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	22,111.506	7,413.539	7,501.996	101.2	33.9
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,159.134	7,135.335	7,046.893	98.8	30.4
- รายปี	11,026.005	3,704.984	3,745.385	101.1	34.0
- ระยะยาว	12,030.539	3,386.842	3,239.259	95.6	26.9
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	43.509	62.249	143.1	60.7
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	14,548.874	14,548.889	100.0	32.1

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มิถุนายน 2564			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	200.000	19.338	12.329	63.8	6.2
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	4.000	4.000	6.749	168.7	168.7
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	500.000	148.170	131.411	88.7	26.3
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	300.000	95.478	73.922	77.4	24.6
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,000.000	647.722	671.381	103.7	67.1
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	422.034	122.018	28.740	23.6	6.8
7. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	500.000	145.524	187.171	128.6	37.4
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	553.702	231.967	157.637	68.0	28.5
9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	252.150	175.329	31.173	17.8	12.4
10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	-	-	-	-	-
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	224.782	78.514	98.920	126.0	44.0
12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	58.000	37.871	67.927	179.4	117.1
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	10,000.000	3,770.454	3,474.329	92.1	34.7
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	19.700	16.907	12.900	76.3	65.5
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,620.000	836.785	799.170	95.5	49.3

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มิถุนายน 2564			%จ่ายจริง เทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)	350.000	220.511	312.287	141.6	89.2
17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	750.000	489.163	600.553	122.8	80.1
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	-	-
19. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	180.575	-	-	-	-
20. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	199.503	17.033	0.276	1.6	0.1
21. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	4,800.000	356.755	835.121	234.1	17.4
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	160.060	-	-	-	-
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คคพ.)	17.000	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	22,111.506	7,413.539	7,501.996	101.2	33.9
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,026.005	3,704.984	3,745.385	101.1	34.0
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	12,030.539	3,386.842	3,239.259	95.6	26.9
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	43.509	62.249	143.1	60.7
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,159.134	7,135.335	7,046.893	98.8	30.4
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	14,548.874	14,548.889	100.0	32.1
