

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2567

กองประเมินผลงบประมาณ

งบลงทุนประจำปี 2567




ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 41,925.619 ลบ. *

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม
ม.ค.-มิ.ย.

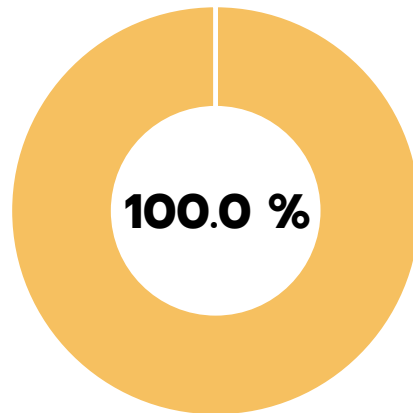

เป้า	14,539	ล้านบาท
จ่าย	14,539	ล้านบาท
คิดเป็น	100.0	%

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567

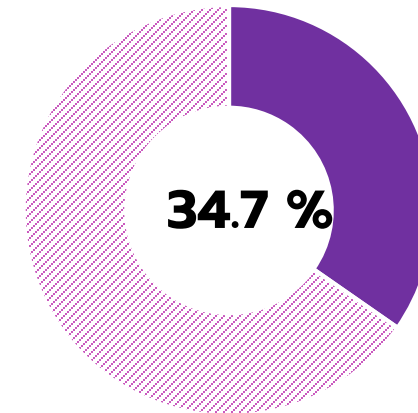


เป้า	41,926	ล้านบาท
จ่าย	14,539	ล้านบาท คิดเป็น 34.7 %
คงเหลือ	27,387	ล้านบาท หรือเท่ากับ 65.3 %

*หมายเหตุ

- มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ
- สศช. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ทำให้เป้าหมายเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 41,925.619 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2567 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

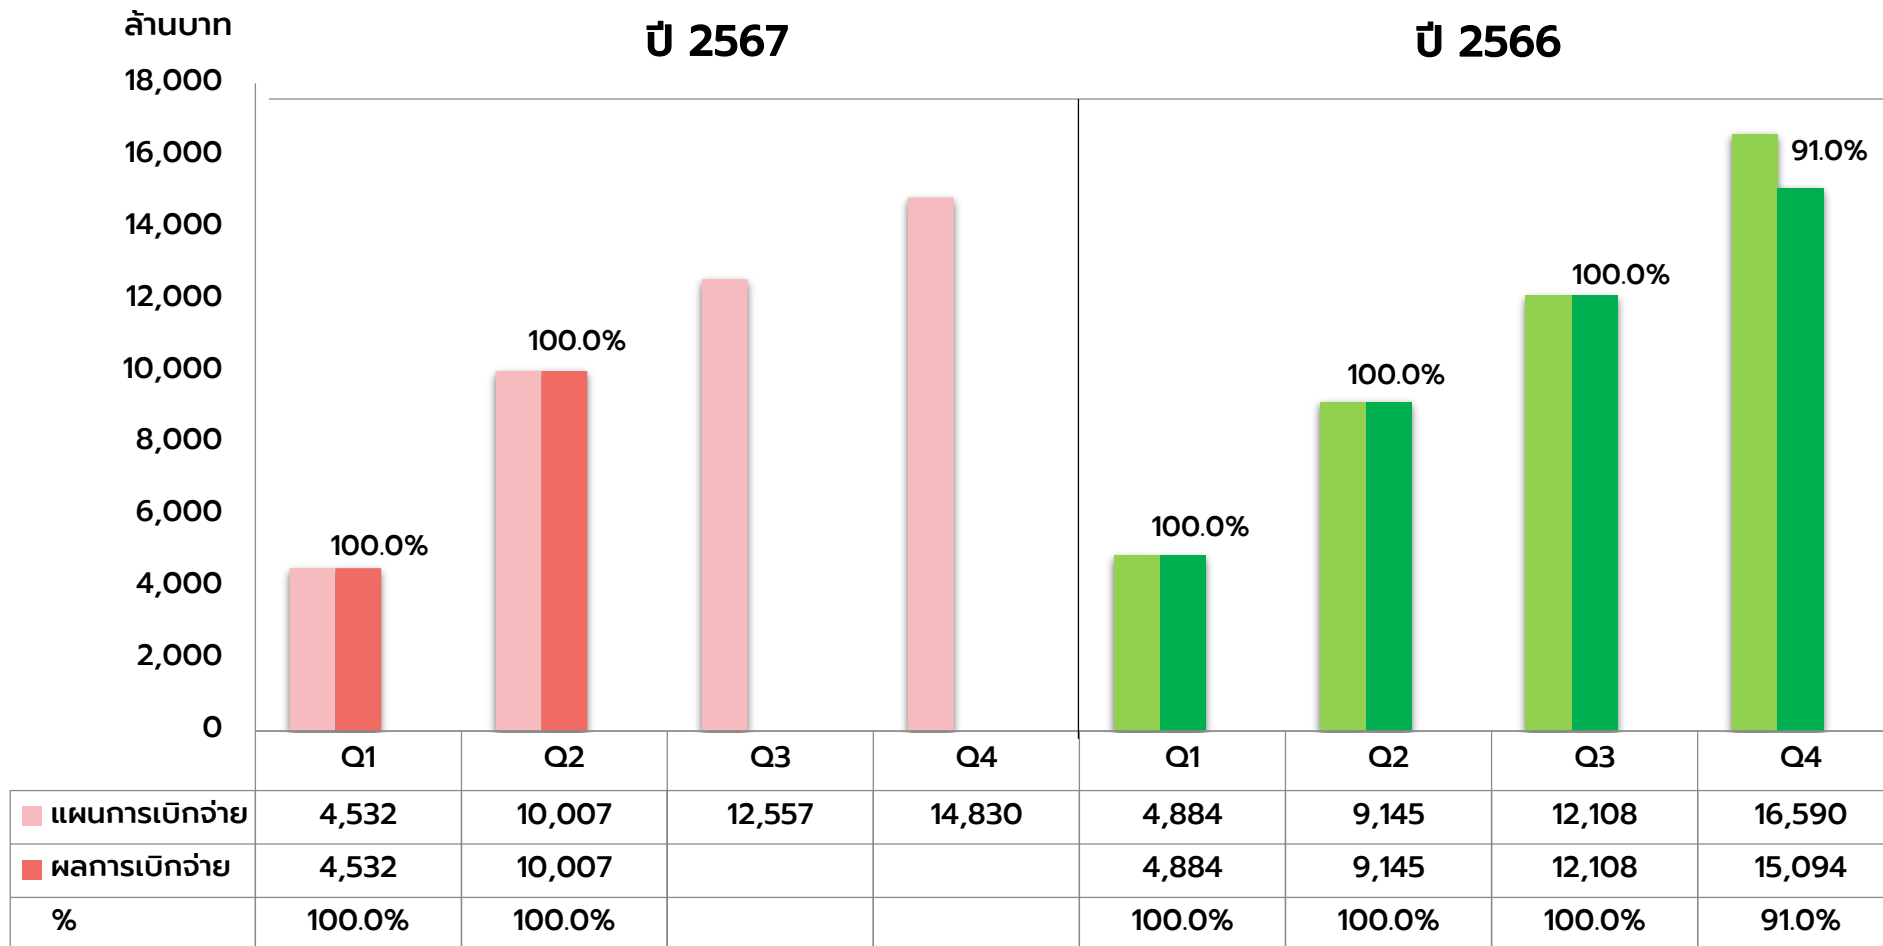

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มิถุนายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	14,301.721	5,782.144	5,831.425	100.9	40.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	8,716.343	8,640.342	99.1	31.4
- รายปี	15,601.619	3,730.273	4,656.663	124.8	29.8
- ระยะยาว	11,911.478	4,986.070	3,983.679	79.9	33.4
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	40.890	67.610	165.3	61.0
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	14,539.377	14,539.377	100.0	34.7

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567



ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มิถุนายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	25.465	25.465	23.546	92.5	92.5
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	136.193	53.205	19.690	37.0	14.5
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	150.000	26.412	24.025	91.0	16.0
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	155.871	7.079	1.908	27.0	1.2
5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	0.174	0.174	2.043	1,174.1	1,174.1
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	46.310	29.546	6.728	22.8	14.5
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	4.000	2.049	3.121	152.3	78.0
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,000.000	373.102	507.874	136.1	50.8
9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	5.548	5.548	5.555	100.1	100.1
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	935.000	229.529	328.714	143.2	35.2
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	165.310	68.085	63.235	92.9	38.3
12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	203.202	46.999	101.455	215.9	49.9
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	191.668	171.166	-	-	-

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567



ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - มิถุนายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ					
14. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	418.160	140.450	139.455	99.3	33.3
15. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	26.000	-	-	-	-
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,700.000	4,500.000	4,533.134	100.7	42.4
17. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	131.252	95.767	69.763	72.8	53.2
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คคพ.)	7.568	7.568	1.179	15.6	15.6
รวมงบลงทุนที่เป็นโครงการ	14,301.721	5,782.144	5,831.425	100.9	40.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	15,601.619	3,730.273	4,656.663	124.8	29.8
2. งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	11,911.478	4,986.070	3,983.679	79.9	33.4
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	8,716.343	8,640.342	99.1	31.4
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	70.593	32.927	53.502	162.5	75.8
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	40.208	7.963	14.108	177.2	35.1
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	40.890	67.610	165.3	61.0
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	14,539.377	14,539.377	100.0	34.7
