

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2567

กองประเมินผลงบประมาณ

งบลงทุนประจำปี 2567




ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท


เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 41,925.619 ลบ. *

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม
ม.ค.-ก.ย.

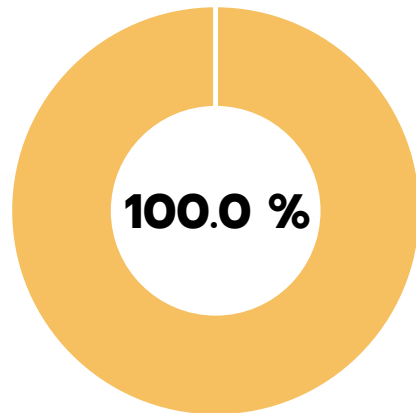

เป้า 27,096 ล้านบาท
จ่าย 27,096 ล้านบาท
คิดเป็น 100.0 %

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567

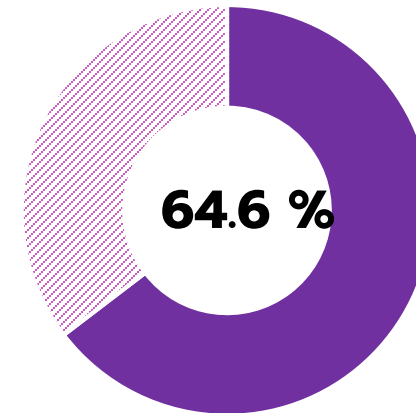


เป้า 41,926 ล้านบาท
จ่าย 27,096 ล้านบาท คิดเป็น 64.6 %
คงเหลือ 14,830 ล้านบาท หรือเท่ากับ 35.4 %

*หมายเหตุ

- มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ
- สศช. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ทำให้เป้าหมายเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 41,925.619 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และ 2567 รายไตรมาส

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

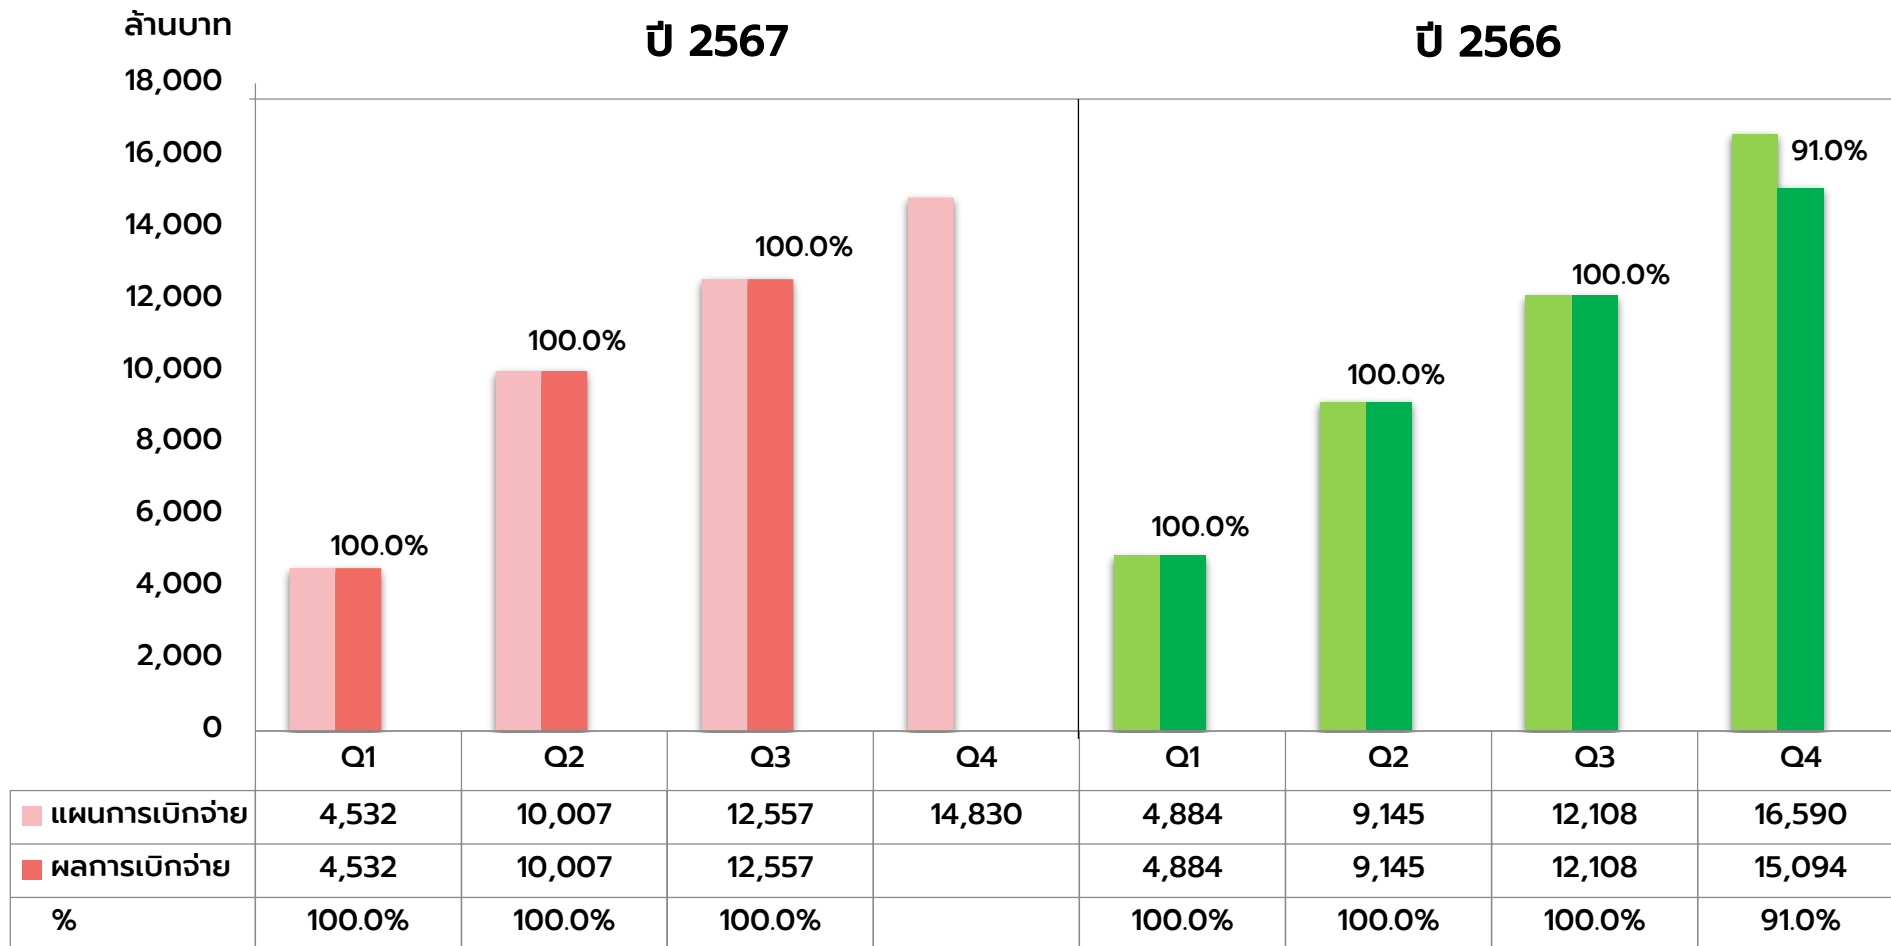

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - กันยายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	14,301.721	10,038.493	10,559.655	105.2	73.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	16,989.669	16,441.806	96.8	59.8
- รายปี	15,601.619	8,502.010	10,167.158	119.6	65.2
- ระยะยาว	11,911.478	8,487.659	6,274.648	73.9	52.7
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	67.904	94.607	139.3	85.4
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	27,096.066	27,096.068	100.0	64.6

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2567

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - กันยายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	25.465	25.465	25.192	98.9	98.9
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	136.193	79.810	21.387	26.8	15.7
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	150.000	125.613	24.206	19.3	16.1
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	155.871	24.749	2.326	9.4	1.5
5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	0.174	0.174	2.043	1,174.1	1,174.1
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	46.310	46.310	35.739	77.2	77.2
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	4.000	2.781	5.030	180.9	125.8
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,000.000	623.102	886.532	142.3	88.7
9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	5.548	5.548	5.463	98.5	98.5
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	935.000	503.288	675.991	134.3	72.3
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	165.310	123.085	91.312	74.2	55.2
12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	203.202	170.660	121.936	71.4	60.0
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	191.668	188.665	-	-	-

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2567

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2567	มกราคม - กันยายน 2567			%จ่ายจริงเทียบกับ เป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ					
14. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมณ.)	418.160	279.280	281.079	100.6	67.2
15. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	26.000	26.000	-	-	-
16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	10,700.000	7,700.000	8,309.336	107.9	77.7
17. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	131.252	106.395	70.486	66.2	53.7
18. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	7.568	7.568	1.597	21.1	21.1
รวมงบลงทุนที่เป็นโครงการ	14,301.721	10,038.493	10,559.655	105.2	73.8
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	15,601.619	8,502.010	10,167.158	119.6	65.2
2. งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	11,911.478	8,487.659	6,274.648	73.9	52.7
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	27,513.097	16,989.669	16,441.806	96.8	59.8
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก					
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	70.593	51.257	71.760	140.0	101.7
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	40.208	16.647	22.847	137.2	56.8
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	110.801	67.904	94.607	139.3	85.4
รวมทั้งสิ้น	41,925.619	27,096.066	27,096.068	100.0	64.6
