



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2568




สถานะ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งปี

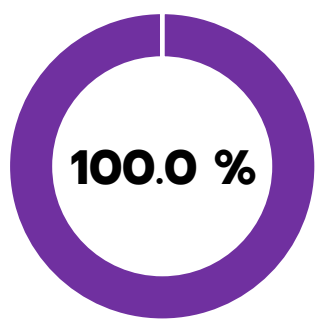

เป้าเบิกจ่าย 38,379 ล้านบาท
จ่ายจริง 38,379 ล้านบาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส

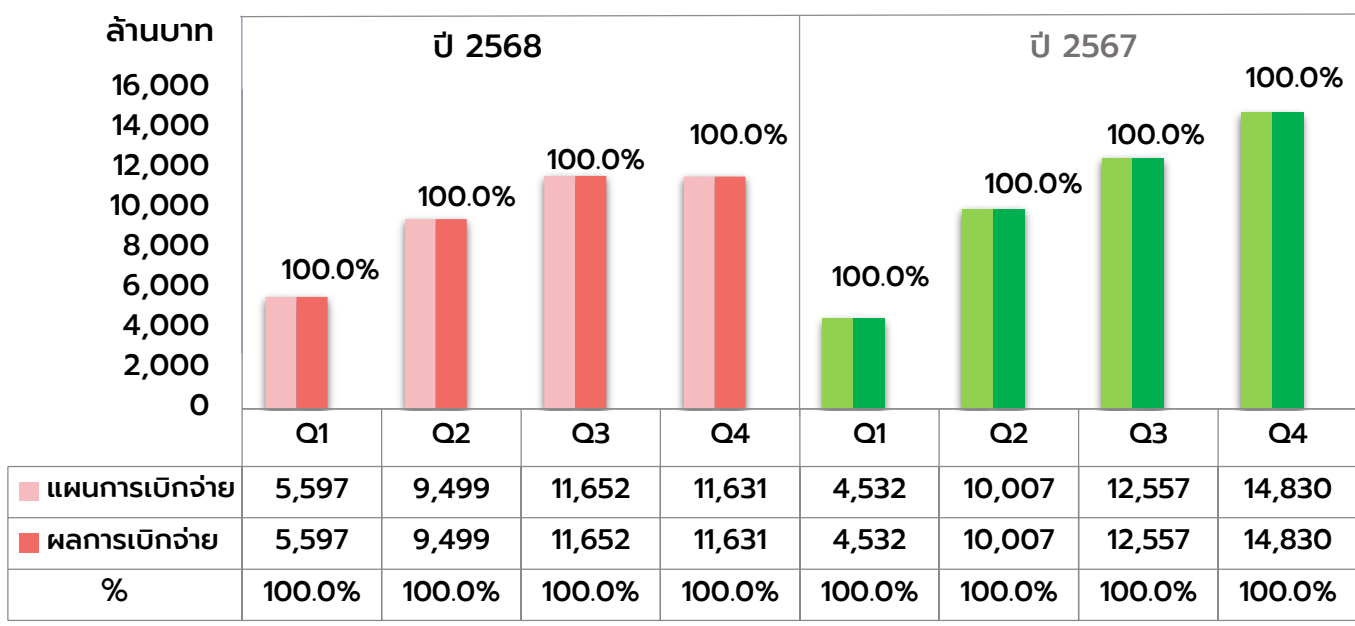

- หมายเหตุ
- 1) มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ
 - 2) คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่าย วงเงิน 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท ตามลำดับ
 - 3) สศช. พิจารณาให้ปรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายประจำปี 2568 ลดวงเงินงบประมาณ 800.410 ล้านบาท และลดเป้าเบิกจ่าย 77.945 ล้านบาท
 - 4) สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายจาก 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท เป็น 120,789.900 ล้านบาท และ 38,379.127 ล้านบาท
 - 5) มติ ครม. 1 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไม่โครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วงเงินเต็มโครงการ 255 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่ายในปี 2568 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 120,789.900 ล้านบาท เป็น 121,044.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
 - 6) มติ ครม. 2 กันยายน 2568 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3) วงเงินเต็มโครงการ 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2568 มีวงเงินลงทุน 700 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 121,044.900 ล้านบาท เป็น 121,744.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
 - 7) มติ ครม. 2 ธันวาคม 2568 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คชก.3) วงเงินเต็มโครงการ 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2568 มีวงเงินลงทุน 500 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 121,744.900 ล้านบาท เป็น 122,244.900 ล้านบาท

สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่าย

สถานะ: 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2568	ม.ค. - ธ.ค. 2568		%จ่ายจริงเทียบ
		จ่ายจริง		กับเป้าหมาย
		วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่ ^{ทำ} เป็นโครงการ	9,727.692	11,817.605	121.5	121.5
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	26,354.986	92.5	92.5
- รายปี	17,534.775	15,910.674	90.7	90.7
- ระยะยาว	10,971.264	10,444.312	95.2	95.2
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	206.536	142.1	142.1
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	38,379.127	100.0	100.0

รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2568	ม.ค. - ธ.ค. 2568		% จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย
		จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	12 เดือน
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ				
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	0.500	0.987	197.4	197.4
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	122.154	128.177	104.9	104.9
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	118.851	111.671	94.0	94.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.267	119.380	70.9	70.9
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	0.100	0.130	130.0	130.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	2.000	15.924	796.2	796.2
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,300.000	1,973.504	151.8	151.8
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	731.688	838.799	114.6	114.6
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	96.256	208.014	216.1	216.1
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	0.500	0.753	150.6	150.6
11. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	-	
12. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	496.101	612.330	123.4	123.4
13. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะป็นหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.000	2.045	8.2	8.2
14. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,500.000	6,645.160	120.8	120.8
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,166.275	1,160.162	99.5	99.5
16. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	-	-	-	
17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	-	0.569	-	
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คขก.3)				
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	9,727.692	11,817.605	121.5	121.5
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ				
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,534.775	15,910.674	90.7	90.7
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,971.264	10,444.312	95.2	95.2
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	26,354.986	92.5	92.5
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก				
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	82.397	116.364	141.2	141.2
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	62.999	90.172	143.1	143.1
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	206.536	142.1	142.1

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี
